全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

91 过软考教育学院参考用书

2027 年最新版 V24.0 版

微信公众号　　抖音号　　微信视频号　　扫码购课

辅导班内部重点资料

历年真题、模拟题、计算题专题等

（内部资料、版权所有，侵权必究）

无答案无解析版

作者：马军老师

QQ：858301448

2026 年 11 月 1 日

马军老师，购课网址91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

目录

第四章 英语词汇及历年真题 4
第六章 常见计算题考点汇总 12
1、决策树和期望货币价值（决策树、表）---风险管理 12
2、合同计算 17
3、进度、网络计算题---必考 17
4、挣值分析、预测技术---进度、成本管理 50
5、2025 年计算题 99
6、2026 年计算题 101
第七章 信息化发展 105
第八章 信息技术发展 118
第九章 信息系统治理 132
第十章 信息系统管理 140
第十一章 信息系统工程 149
第十二章 项目管理概论 165
第十三章 项目立项管理 176
第十四章 项目整合管理 182
第十五章 项目范围管理 193
第十六章 项目进度管理 205
第十七章 项目成本管理 216
第十八章 项目质量管理 227
第十九章 项目资源管理 238
第二十章 项目沟通管理 251
第二十一章 项目风险管理 260
第二十二章 项目采购管理 273
第二十三章 项目干系人管理 285
第二十四章 项目绩效域 297
第二十五章 配置与变更管理 310
第二十六章 高级项目管理 324
第二十七章 项目管理科学基础 333
第二十八章 组织通用治理 349
第二十九章 组织通用管理 355
第三十章 法律法规与标准规范 360
第三十一章 案例分析真题解析（非计算题、以读为主） 373
2017 年 5 月试题及答案解析 373
2017 年 11 月试题及答案解析 375
2018 年 5 月试题及答案解析 376

91 过软考老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2018 年 11 月试题及答案解析 378
2019 年 5 月试题及答案解析 379
2019 年 11 月试题及答案解析 381
2020 年 11 月试题及答案解析 384
2021 年 5 月试题及答案解析 385
2021 年 11 月试题及答案解析 389
2022 年 5 月试题及答案解析 391
2022 年 11 月试题及答案解析 393
2023 年 5 月试题及答案解析 395
2023 年 11 月考试第 1 批 396
2023 年 11 月考试第 2 批 397
2023 年 11 月考试第 3 批 398
2023 年 11 月考试第 4 批 399
2024 年考试第 1 批 400
2024 年考试第 2 批 402
2025 年考试第 1 批 404
2025 年考试第 2 批 406
2026 年考试第 1 批 408
2026 年考试第 2 批 411
马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第四章 英语词汇及历年真题

本章历年考题：

2020 年 11 月第 71 题

The patterns of(71) show the next probable behavior of a peerson or market without a lodical explanation as to why.

A、Internet of Things　　B、Cloud Computing　　C、Artificial Intelligence　　D、Big Data

2020 年 11 月第 72 题

(72)Can be scripted as a new science and technology, which is used to simulate human intelligence. Namely, computers simulate the way of human’s thinking and intelligent behavior. Such as learning,Reasoning,Thinking,Planning,and so on.

A、Internet of Things　　B、Cloud Computing　　C、Artificial Intelligence　　D、Big Data

2020 年 11 月第 73 题

(73) is preservation of confidentiality, integrity and availity of information, other properties such as authenticity,cccountability,non-repudiation and reliability can also be involved.

A、Equaipment security　　B、Network security

C、Information security　　D、Content security

2020 年 11 月第 74 题

（74）Involves choosing part of a population of interest for inspection.

A、Check list　　B、check sheet　　C、Statistical sampling　　D、Questionnaire

2020 年 11 月第 75 题

（75）Is the process of formalizing acceptance of the completed project deliverables. The key benefit of this process is that it brings objectivity to the accepttance process and increase the probability of final product,service,or result acceptance by validating each deliverable.

A、Validate scope　　B、Define scope　　C、Control scop　　D、Collect requirement

2021 年 5 月第 72 题

(72) is the underlying architecture of Bitcoin, and it is used forother cryptocurrencies, because it provides a verifiable list of ownership, itis also used for contracts, fundraising and the recording of legal documents. Theincentive is undeniable proof of digital authenticity.

A、Internet of things　　B、Big data

C、Blockchain　　D、Artificial intelligence.

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2021 年 5 月第 73 题

(73) includes the processes and activities to identify, define, combine ,unify, and coordinate the various process and project management activitieswithin the Project Management Process Groups.

A、Quality management　　B、Cost management

C、Human Resource management　　D、Integration management

2021 年 5 月第 74 题

Project Risk Management processesconsist of the following elements,except:(74) 。

A、hide the risks　　B、identify the risks

C、assessthe risks　　D、determine the risks

2021 年 5 月第 75 题

The key benefit of the Project（75）is that it determines whether towell as how and when to acquire goods and services from outside the project ,if so ,what to acquire as well as how and when to acquire as well as how and when to acquire it.

A、Schedule management　　B、Change management

C、Knowledge management　　D、Procurement Management

2021 年 11 月第 71 题

71.(71)puts computer resources on the web, and must meet the requirements of super capacity, super concurrency. super speed and super security.

A、Cloud computing　B、Big date　C、Block chain　D、Internet of things

2021 年 11 月第 72 题

72.(72) is a decentralized database, ensure that the data will not betampered with and forged.

A、Artificial intelligence　B、Blockchain　C、Sensing technology　D、Big data

2021 年 11 月第 74 题

74.(74):The process of determining documenting. and managing stakeholder needs and requirements to meet project objectives.

A、Plan Scope Management　　B、Collection Requirements

C、Validate Scope　　D、Control Scope

2021 年 11 月第 75 题

75.(75) is that it provides guidance and direction on how quality will be managed and verified throughout the project.

A、Plan Quality Management　　B、Manage Quality

C、Control Quality　　D、Project Charter

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2022 年 5 月第 71 题

71、Xinhua News Agency reported in January 2022，Chian will further promote the developmet of a digital economy during the 14th Five-Year Plan eriod（2021-2025）. The plan also emphasized industrial （71）transformation.

A、digital　　B、networking　　C、intelligentize　　D、informatization

2022 年 5 月第 72 题

72、（72）is a grid that shows the project resources assigned to each work package.

A、Stakeholder engagement assessment matrix

B、Requirements traceability matrix

C、Probability and impact matrix

D、Responsibility assignment matrix

2022 年 5 月第 73 题

73、At the project establishment stage , the feasibility study mainly includes techinical feasibility analysis , （73）, operation environment feasibility analysis and other aspects of feasibility analysis.

A、detail feasibility analysis　　B、opportunity analysis

C、economic feasibility analysis　　D、risk analysis

2022 年 5 月第 74 题

74、In project human resource management , （74）is not a source of power for the project manager.

A、referent power　　B、expert power　　C、reward power　　D、audit power

2022 年 5 月第 75 题

75、Advancements in（75）have contributed to the growth of the automotive industry through the creation and evolution of self-driving vehicles.

A、Artificial Intelligence　　B、Cloud Computing

C、Internet of Things　　D、Big Data

2022 年 11 月第 71 题

71、（71）is/are legally owned or controlled data resources that can be measured and bring economic and social value to the organization.

A、Data collection　　B、Data warehouse　　C、Data preservation　　D、Data assets

2022 年 11 月第 72 题

72、（72）can be described by the following characteristics: volume, variety,velocity，veracity and

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

value.

A、Artificial intelligence　B、Integrated circuit　C、Parallel computing　D、Big data

2022 年 11 月第 75 题

75、Project（75）management includes the processes required to identify the people, groups or organizations that could impact or be impacted by the project， to analyze their expectations and impact on the project，and to develop the appropriate management strategies for effectively engaging them in project decisions and execution.

A、supplier　B、customer　C、resource　D、stakeholder

2023 年 5 月第 71 题

71、When performing projec activity duration estimates,(71)is not included in the estimation techniques.

A、Three-point Estimating　B、Analogous Estimating

C、Parametric Estimating　D、Checklist Estimating

2023 年 5 月第 72 题

72、Self-driving technologies are important for the research and development in the field of(72)。

A、Cloud Computing　B、Digital Finance

C、Artificial Intelligence　D、Intelligent Manufacturing

2023 年 5 月第 73 题

73、To build a modern logistics system，we should work on the() of its infrastructure, including railways and ports, and promote the integration of sources in the sector.

A、digital transformation

B、new generation of communication technology

C、block-chain technology

D、VR and AR

2023 年 5 月第 74 题

74、Information security emphasizes the security attributes of information(data) itself.() is not included in the security attributes.

A、Confidentiality　B、Consistency　C、Interity　D、Availability

2023 年 5 月第 75 题

75、(75)is enforced in 2021。

A、The Civil Code of the People's Republic of China

B、The Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、Government Procurement Law of the People's Republic of China.

D、The Personal Information Protection Law of the People's Republic of China

2023年11月第4批

（）is about stakeholders,It is based on three variables:power to inference,legitimacy of the stakeholders relationships with the project,and the urgency of the stakeholders claim on the project for stakeholder engagement、

A、The SPACE Matrix　　B、The PEST Model

C、The SWOT Analysis　　D、The Salience Model

2023年11月第4批

（）is the hierarchical breakdown of the entire scope of work by the project team to accomplish the project objectives and create the required deliverables,It provides detailed deliverable,activity,and scheduling information about each component in the work breakdown structure、

A、OLA　　B、SLA　　C、SOP　　D、WBS

2024年5月第1批

( ) uses the data and results from the ( ) process toreflect the overall quality status of the project to the stakeholders.

A、Control Quality plan quality management

B、Plan Quality Management manage quality

C、Manage Quality control quality

D、Control Quality manage quality

2024年5月第1批

How frequently the risks are being reviewed, this shouldrecorded in ( ).

A、Risk Management Plan　　B、lssue Log　　C、Risk Register　　D、Risk Report

2024年5月第1批

Proiect Communications Management consists of two parts.The first part is developing a strategy to ensurecommunication is effective for stakeholders.The second part is carrying out the activities necessary to implement the（ ）

A、communication tools　　B、communication technology

C、communication cost　　D、communication strategy

2024年5月第1批

( )is the process of specifying the approach and identifying potential sellers

A、Plan Procurement Management　　B、Close Procurement Management

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、Control Procurement　　D、Conduct Procurement

2024 年 5 月第 1 批

The project manager should use（）tool for the purpose to report on the work remaining for projects.

A、cumulative flow diagram　　B、burndown chart

C、forecast estimation　　D、earned value

2024 年 5 月第 2 批

（）is based on chatgpt-4

A、Large Language Model　　B、缺　　C、缺　　D、缺

2024 年 5 月第 2 批

( )is the correct full name for the “OPM”

A、0rganizational Project Management

B、perational Performance Management

C、0ptimized Portfolio Management

D、0utcome Performance Management

2024 年 5 月第 2 批

A project is a ( ) endeavor undertaken to create a unique product , service , or result .

A、static　　B、permanent　　C、temporary　　D、renting

2024 年 5 月第 2 批

（）is the basis of information.

A、Data　　B、wisdom　　C、concepts　　D、knowledge

2024 年 5 月第 2 批

Security vulnerability are considered a type of （）

A、technical risk　　B、management risk　　C、organizational risk　　D、commercial risk

2025 年 5 月第 1 批

The key technologies of （）, mainly involve machine learning,natural, language processing, expert systems and other technologies.

A、Virtual reality　　B、big data　　C、artificial intelligence　　D、cloud computing

2025 年 5 月第 1 批

（）is a method used to create and evolve the product，service， or result during the project life

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

such as a predictive，iterative，incremental，adaptive，or hybrid method

A、Project Analysis Approach　　B、Project Phase

C、Project Deliverable　　D、Development Approach

2025 年 5 月第 1 批

（）are the framework, functions, and processes that guide project management activities in order to create a unique product,service, or result to meet organizational, strategic,and operational goals.

A、Portfolio　　B、Project Management

C、Project Governance　　D、Project Operation

2025 年 5 月第 2 批

（） is the process of identifying and documenting relationships among the project activities.

A、 Sequence activitie　　B、Estimate activity durations

C、Develop schedule　　D、Define activities

2025 年 5 月第 2 批

（） is the process of developing options, selecting strategies, and agreeing on actions to address overall project risk exposure, as well as to treat individual project risks.

A、Plan risk responses　　B、Plan risk management

C、Implement risk responses　　D、Perform quantitative risk analysis

2025 年 5 月第 2 批

When using earned value analysis, the（）is compared to actual results to determine if a change, corrective action, or preventive action is necessary.

A、cost baseline　　B、performance measurement baseline

C、schedule baseline　　D、scope baseline

2026 年 5 月第 1 批

In CMMI 2.0, In the domain of Doing, which one is relevant?

A、risk and opportunity　　B、supplier agreement

C、Supporting Implementation　　D、Sustaining Habit and Persistence

2026 年 5 月第 2 批

( ) is an uncertain event or condition that,if it occurs,has a positive or negative effect on one or more project objectives.

A、Problem　　B、Change　　C、Risk　　D、Issue

2026 年 5 月第 2 批

马老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

(　)is set aside to address known uncertainties and implement risk response plans。

A、 Project Fund　　B、Management Reserve

C、Contingency Reserve　　D、Operational Expense

2026 年 5 月第 2 批

(　)measures the degree to which a stakeholder（usually the customer）is willing to recommend a product or service to others,and serves as an indicator of customer loyalty。

A、Net Promoter Score (NPS)　　B、Return on Investment (ROI)

C、Cost Performance Indicator(CPI)　　D、Key Performance Indicator(KPI)

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第六章 常见计算题考点汇总

1、决策树和期望货币价值（决策树、表）---风险管理

很简单的题目，如下题目我们不再讲解。相信大家听了基础课都会做，如果不会做，建议再听下基础课。

1、中级 11 上 70

决策树分析是风险分析过程中的一项常用技术。某企业在项目风险分析过程中，采用了决策树分析方法，并计算出了 EMV（期望货币值）。以下说法中，正确的是(70)。

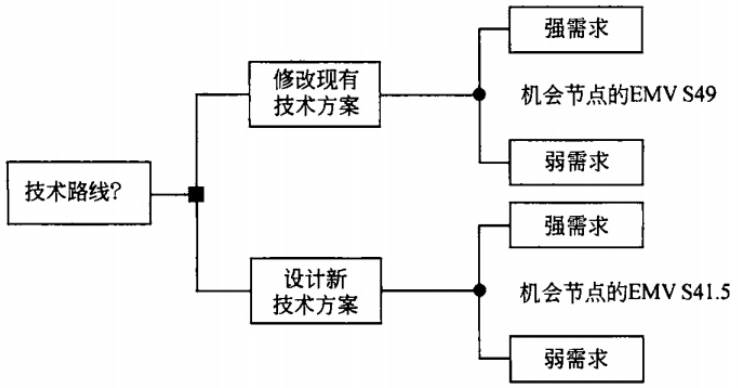

A、以上进行的是定量风险分析，根据分析结果应选择修改现有技术方案的路线
B、以上进行的是定量风险分析，根据分析结果应选择设计新技术方案的路线
C、以上进行的是定性风险分析，根据分析结果应选择修改现有技术方案的路线
D、以上进行的是定性风险分析，根据分析结果应选择设计新技术方案的路线

2、中级 15 上 48

某公司正在准备竞标一系统集成项目，为了估算项目的收益，技术总监带领风险管理团队，对项目可选的两种集成实施方案进行了决策树分析，分析图如下所示。以下说法中，正确的是（48）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

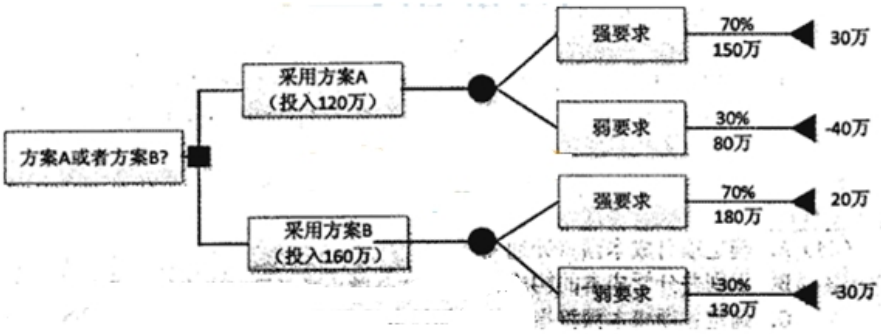

A、以上进行的是风险定性分析，根据分析，该公司应采用方案 B

B、以上进行的是风险定量分析，根据分析，该公司应采用方案 B

C、以上进行的是风险定性分析，根据分析，该公司应采用方案 A

D、以上进行的是风险定量分析，根据分析，该公司应采用方案 A

3、中级 17 上 69

某项目承包者设计该项目有 0.5 的概率获利 200000 美元。0.3 的概率亏损 50000 美元，还有 0.2 的概率维持平衡。该项目的期望值货币的价值为（69）美元。

A、20000　　B、85000　　C、50000　　D、180000

4、高级 08 下 53

项目经理向客户推荐了四种供应商选择方案。每个方案损益值已标在下面的决策树上。根据预期收益值，应选择设备供应商（53）。

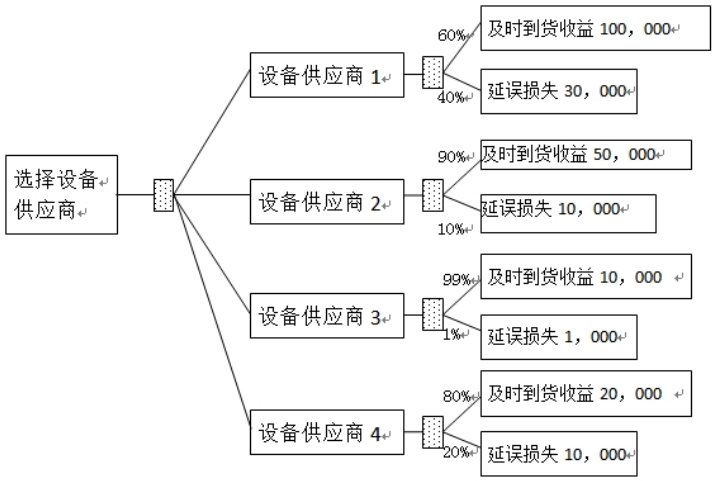

（53）A、1　　B、2　　C、3　　D、4

5、高级 09 下 69

某厂需要购买生产设备生产某种产品，可以选择购买四种生产能力不同的设备，市场对该

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

产品的需求状况有三种（需求量较大、需求量中等、需求量较小）。厂方估计四种设备在各种需求状况下的收益由下表给出，根据收益期望值最大的原则，应该购买（68）。

（单位：万元）

收益 设备 / 需求状况概率	设备 1	设备 2	设备 3	设备 4
需求量较大概率为 0.3	50	30	25	10
需求量中等概率为 0.4	20	25	30	10
需求量较小概率为 0.3	-20	-10	-5	10

（68）A、设备 1　　B、设备 2　　C、设备 3　　D、设备 4

6、高级 11 下 69

决策树分析法通常用决策树图表进行分析，根据下表的决策树分析法计算，图中机会节点的预期收益 EMV 分别是 90 和（69）（单位:万元）

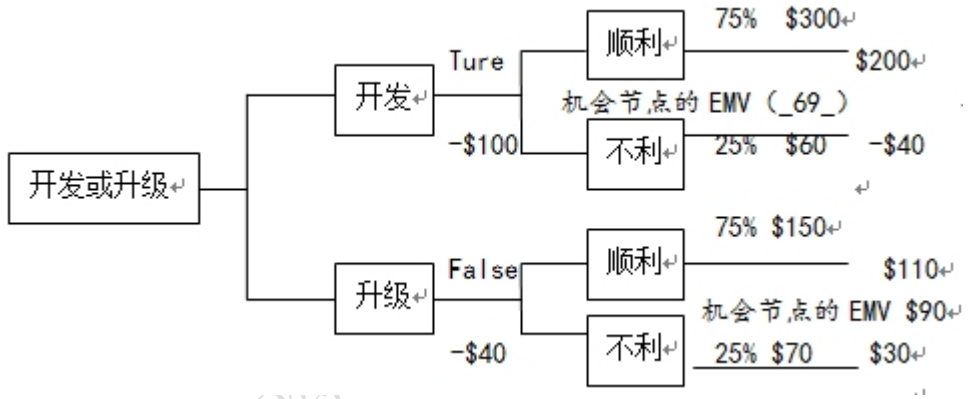

A、160　　B、150　　C、140　　D、100

7、高级 16 上 34

下图是一个选择出行路线的“决策树图”，统计路线 1 和路线 2 堵车和不堵车的用时和其发生的概率（P），计算出路线 1 和路线 2 的加权平均用时，按照计算结果选择出行路线，以下结论中，正确的是（34）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

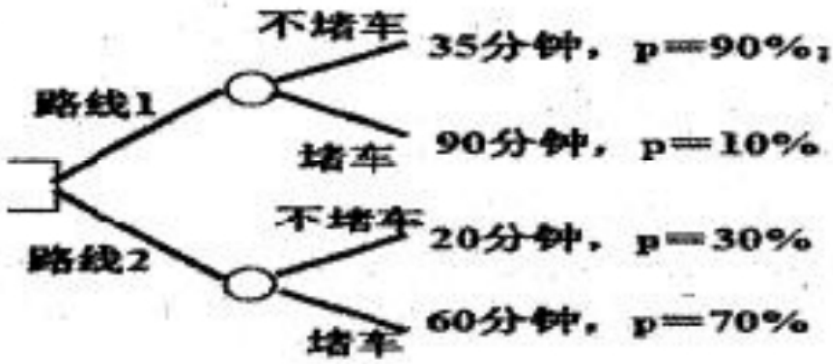

A、路线 1 的加权平均用时为 40.5 分钟，路线 2 的加权平均用时为 48 分钟，因此选择路线 1

B、路线 1 的加权平均用时为 62.5 分析，路线 2 的加权平均用时为 40 分钟，因此选择路线 2

C、路线 1 的加权平均用时为 40.5 分钟，路线 2 的加权平均用时为 44 分钟，因此选择路线 1

D、由于路线 2 堵车和不堵车时间都比路线 1 短，因此选择路线 2

8、高级 17 下 47

某项目有 40%的概率获利 10 万元，30%的概率会亏损 8 万元，30%的概率既不获利也不亏损，该项目的预期货币价值分析（EMV）是（47）。

A、0 元　　B、1.6 万元　　C、2 万元　　D、6.4 万元

9、高级 20 下 66

某公司主营产品有甲、乙、丙、丁四种。按照历史数据预测，下半年的市场需求总量可以有 10 万件、15 万件和 20 万件三种情况，对应的概率分别为 50%，30%，20%，不同情况下各产品带来的市场收益（单位：万元）如表所示，为了追求利润最大化，该公司应该生产（66）。

产品	需求量为 10 万件	需求量为 15 万件	需求量为 20 万件
甲	-25	35	70
乙	-20	30	65
丙	-10	25	55
丁	10	15	40

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、丁

10、高级 21 下 47

某厂房建造或者升级的两种方案的决策树分析如下图所示，由图可知。组织宜选择（47）的方案，因为该方案的 EMV 为（47）万元。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

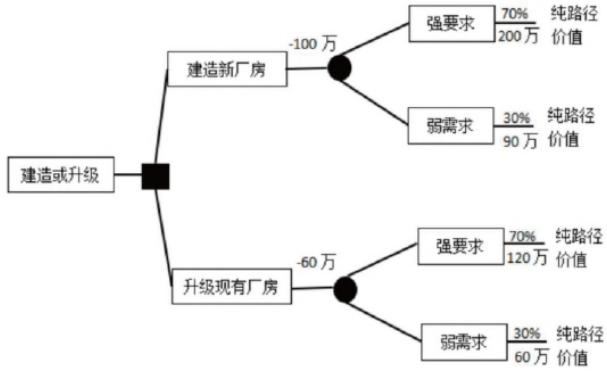

A、升级现有厂房　42　　B、建造新厂房　67

C、升级现有厂房　60　　D、建造新厂房　100

11、高级 23 上 48

一件商品卖出去将盈利 50 元，卖不出去将亏损 60 元，卖出去的概率是 80%,卖不出去概率是 20%，该商品的预期货币价值(EMV)是(48)元。

A、6　　B、8　　C、66　　D、28

有点难度的题目，请大家先做，如果有疑问，可以听课。

1、中级 15 上 63

某工厂生产雷达，成品无效的历史数据是 4%.在工厂测试每个雷达的成本为 10000 元:工厂测试后重新组装每个测试合格雷达的成本是 2000 元:工厂测试后修理并重新组装每个不合格雷达的成本是 23000 元.而修理安装每个现场的不合格雷达的成本是 350000 元。利用决策树分析.若决定对 500 个雷达进行 100%测试，预期支出需要（63）万元。

A、550　　B、596　　C、642　　D、700

2、高级 17 上 66

某机构拟进行办公自动化系统的建设，有四种方式可以选择：①企业自行从头开发；②复用已有的构件；③外购现成的软件产品；④承包给专业公司开发。针对这几种方式，项目经理提供了如下表所示的决策树。其中在复用的情况下，如果变化大则存在两种可能，简单构造的概率为 0.2，成本约 31 万元；复杂构造的概率为 0.8，成本约 49 万元。据此表，管理者选择建设方式的最佳决策是（）。

项目名称	办公自动化系统							
选择方案	自行开发		复用		外购		承包	
决策节点	难度小	难度大	变化少	变化大	变化少	变化大	没变化	有变化
概率分布	0.3	0.7	0.4	0.6	0.7	0.3	0.6	0.4
预期成本	38 万元	45 万元	27.5 万元	见说明	21 万元	30 万元	35 万元	50 万元

A、企业自行从头开发　　B、复用已有的构件

C、外购现成的软件产品　　D、承包给专业公司开发

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、合同计算

历年考题题目举例

很简单的题目，如下题目我们不再讲解。相信大家听了基础课都会做，如果不会做，建议再听下基础课。

1、高级2025年5月第1批

签订成本加激励费用合同时，若目标成本为90万元，目标费用2万元，相对目标成本节余或超支部分的分摊按比例为60/40（即如结余，买方分享60%，卖方分享40%；如超支，买方承担60%，卖方承担40%）。项目执行后实际成本为100万元，则买方最终需支付的金额是（）。

A、108万元　　B、96万元　　C、98万元　　D、102万元

2、高级2019年11月第55题

在CPIF合同下，A公司是卖方，B公司是买方，合同的实际成本大于目标成本，A公司得到的付款总数是（55）。

A、目标成本+目标费用-B公司应担负的成本超支

B、目标成本+目标费用+A公司应担负的成本超支

C、目标成本+目标费用-A公司应担负的成本超支

D、目标成本+目标费用+B公司应担负的成本超支

3、高级2021年5月第55题

成本加激励费用合同下，实际成本大于目标成本，卖方可得的付款总数为（55）。

A、目标成本+目标费用-买方应负担的成本超支

B、目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支

C、目标成本+目标费用+卖方应负担的成本超支

D、目标成本+目标费用-卖方应负担的成本超支

3、进度、网络计算题---必考

历年考题题目举例（上午）

很简单的题目，如下题目我们不再讲解。相信大家听了基础课都会做，如果不会做，建议再听下基础课。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

1、中级 09 上 27

某项目完成估计需要 12 个月。在进一步分析后认为最少将花 8 个月，最糟糕的情况下将花 28 个月。那么，这个估计的 PERT 值是（27）个月。

A、9　　B、11　　C、13　　D、14

2、中 10 下 35-36

某工程建设项目中各工序历时如下表所示，则本项目最快完成时间为（35）周。同时，通过（36）可以缩短项目工期。

工序名称	紧前工序	持续时间（周）
A	—	1
B	A	2
C	A	3
D	B	2
E	B	2
F	C、D	4
G	E	4
H	B	5
I	G、H	4
J	F	3

（35）A．7　　B．9　　C．12　　D．13

①压缩 B 工序时间　②压缩 H 工序时间　③同时开展 H 工序与 A 工序

④压缩 F 工序时间　⑤压缩 G 工序时间

（36）A、①⑤　　B、①③　　C、②⑤　　D、③④

3、中级 10 下 38

某项目经理在对项目历时进行估算时，认为正常情况下完成项目需要 42 天，同时也分析了影响项目工期的因素，认为最快可以在 35 天内完成工作，而在最不利的条件下则需要 55 天完成任务。采用三点估算得到的工期是（38）天。

A、42　　B、43　　C、44　　D、55

4、中级 11 上 34

依据下面的项目活动网络图中，该项目历时为(34)天。

闫军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

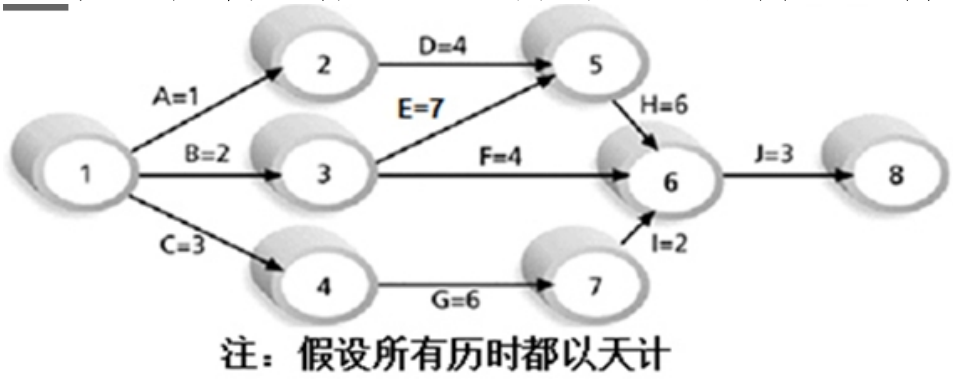

A、10　　B、11　　C、13　　D、18

5、中级12上36

过去几年小李完成了大量网卡驱动模块的开发，最快6天完成，最慢36天完成，平均21天完成，如今小李新开发一个网卡驱动模块，在21天到26天内完成的概率是（36）

A、68.3%　　B、34.1%　　C、58.2%　　D、28.1%

6、中级14上41

已知网络计划中工作M有两项紧后工作,这两项紧后工作的最早开始时间分别为第12天和第15天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第8天，如果工作M的持续时间为4天，则工作M总时差为（）天

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

7、中级15上38

项目经理小李对某活动工期进行估算时，发现人员的熟练程度和设备供应是否及时对工期至关重要。如果形成最有利组合时，预计17天可以完成;如果形成最不利组合时，预计33天可以完成，按照公司的正常情况，一般22天可以完成该项目的工期可以估算为（38）天.

A、22　　B、23　　C、24　　D、25

8、中级16上55

项目经理小李对某活动工期进行估算时，发现人员的熟练程度和设备供应是否及时对工期至关重要。如果形成最有利组合时，预计9天可以完成；如果形成最不利组合时，预计23天可以完成；按照公司的正常情况，一般13天可以完成。该项目的工期可估算为（55）天。

A、12　　B、13　　C、14　　D、15

9、中级17上46

下面的箭线图中（活动的时间单位：周），活动G最多可以推延（46）周而不会影响项目的完工日期。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

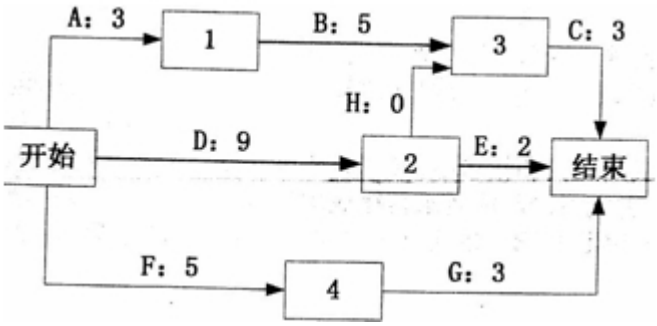

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

10、中级 18 上 47 题

某项目的双代号网络图如下所示，该项目的工期为（47）。

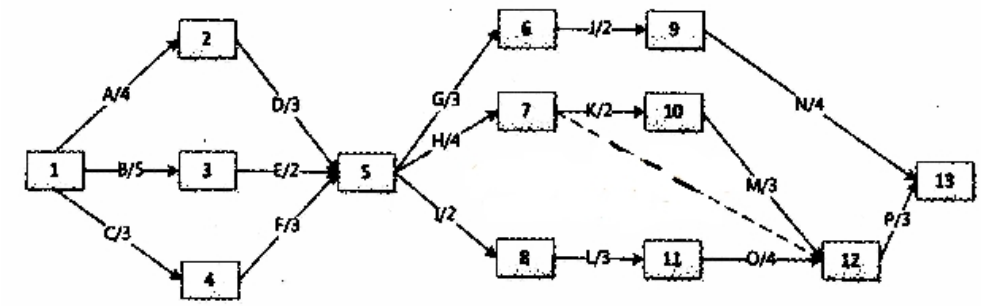

A、17　　B、18　　C、19　　D、20

11、中级 18 上 51 题

A 公司的某项目即将开始，项目经理估计该项目需 12 人天完成，如果出现问题耽搁则 20 人天完成，最快 10 人天完成。根据项目成本估计中的三点结算法。该项目预计花费（51）人天。

A、14　　B、13　　C、12　　D、11

12、中级 18 下 47 题

下图某工程单代号网络图中，活动 B 的总浮动时间为（47）天。

马军老师，购课店铺 obao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

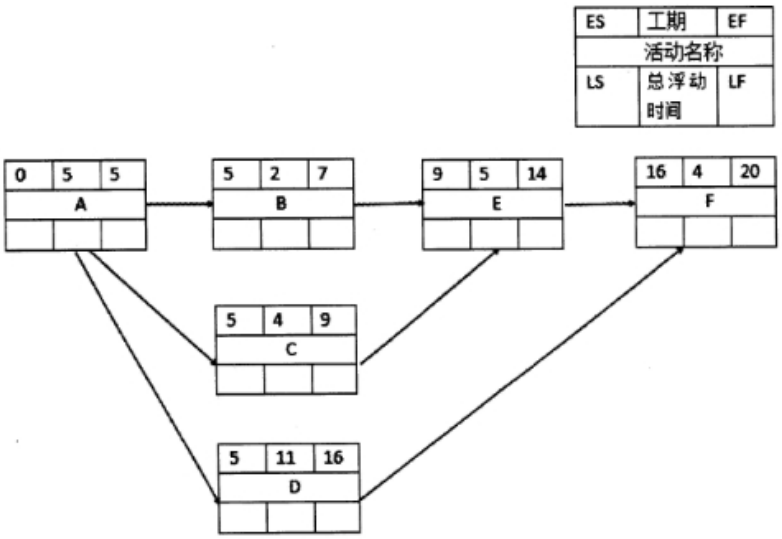

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

13、中级 18 下 47 题

某工程由 8 个活动组成，其各活动情况如下表所示，该工程关键路径为（48）。

活动	紧前活动	所需天数	活动	紧前活动	所需天数
A	–	3	F	C	6
B	A	2	G	E	2
C	B	5	H	F,G	5
D	B	7	I	H,D	2
E	C	4			

A、ABCEGI　　B、ABCFHI　　C、ABDHI　　D、ABDI

14、中级 19 上 45 题

某项目的网络图如下,活动 D 的自由浮动时间为（45）天

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

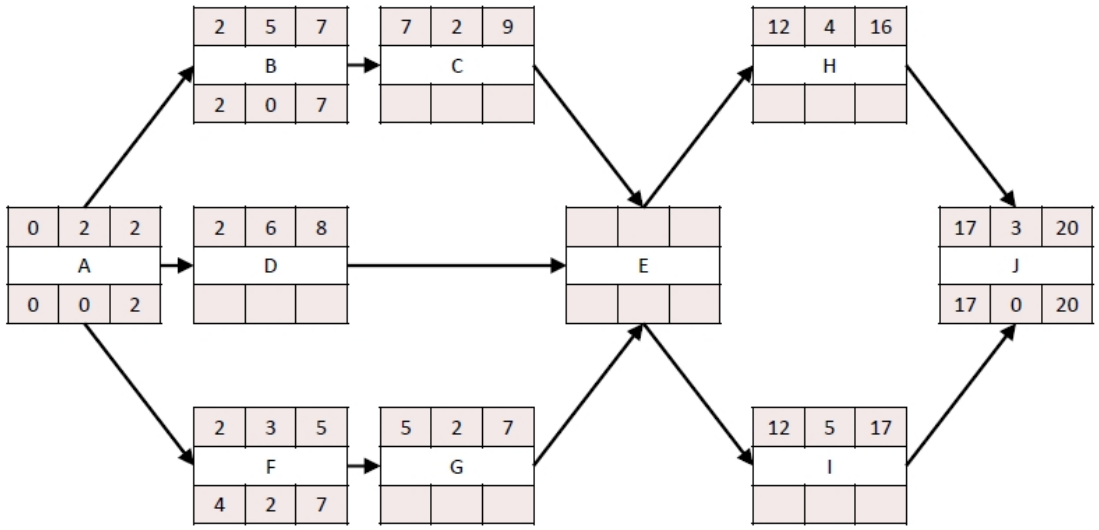

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

15、中级 20 下 44、45 题

下图（单位：周）为某项目实施的单代号网络图，活动 E 的总浮动时间与自由浮动时间为（44），该项目的最短工期为（45）。

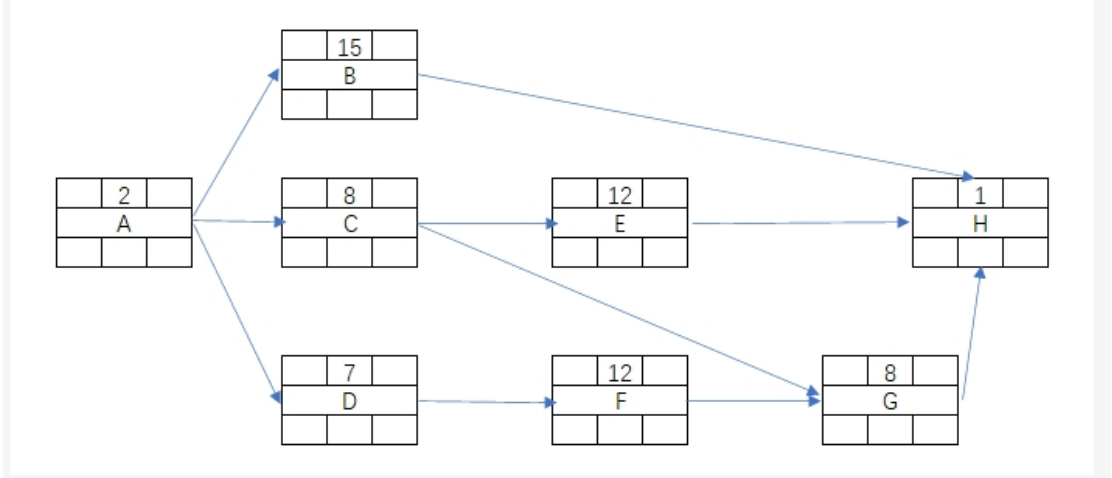

（44）A、5.0　　B、7.5　　C、7.7　　D、7.0

（45）A、31　　B、30　　C、20　　D、19

16、中级 21 上 44、45 题

某项目的网络图如下，活动 B 的自由浮动时间为（44）天，该项目的关键路径有（45）条。

（44）A、0　　B、1　　C、2　　D、3

（45）A、4　　B、3　　C、2　　D、1

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

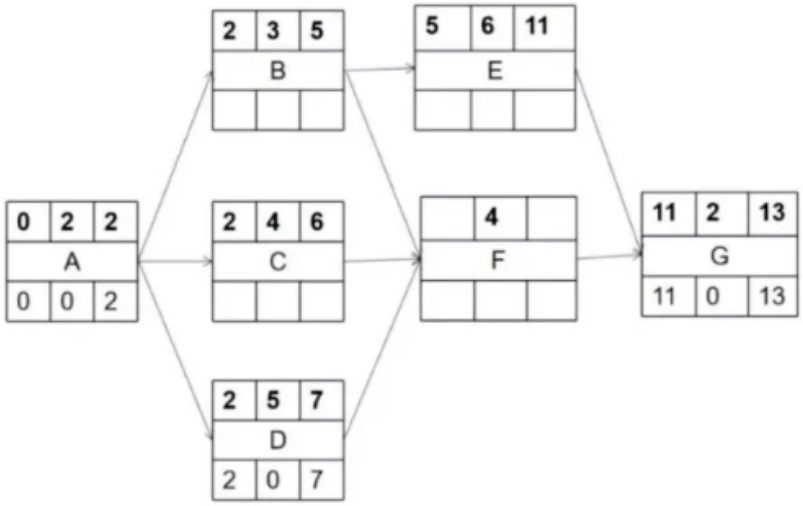

17、中级 21 下 45、46 题

某项目包含 ABCDEFGHIJ 共 10 个活动，各活动历时与逻辑关系如下表所示，施工过程中，活动 B 延期 2 天，活动 B 的自由浮动时间与总浮动时间分别为（45）天，工期是（46）

活动名称	历时天数	前序活动
A	2	-
B	2	A
C	3	A
D	4	A
E	3	B
F	4	C、D
G	4	E、F
H	3	G
I	2	G
J	1	H、I

A、0、1　　B、1、2　　C、2、2　　D、1、1

A、17　　B、18　　C、19　　D、20

18、中级 22 上 45 题

下图中活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间分别为（45）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

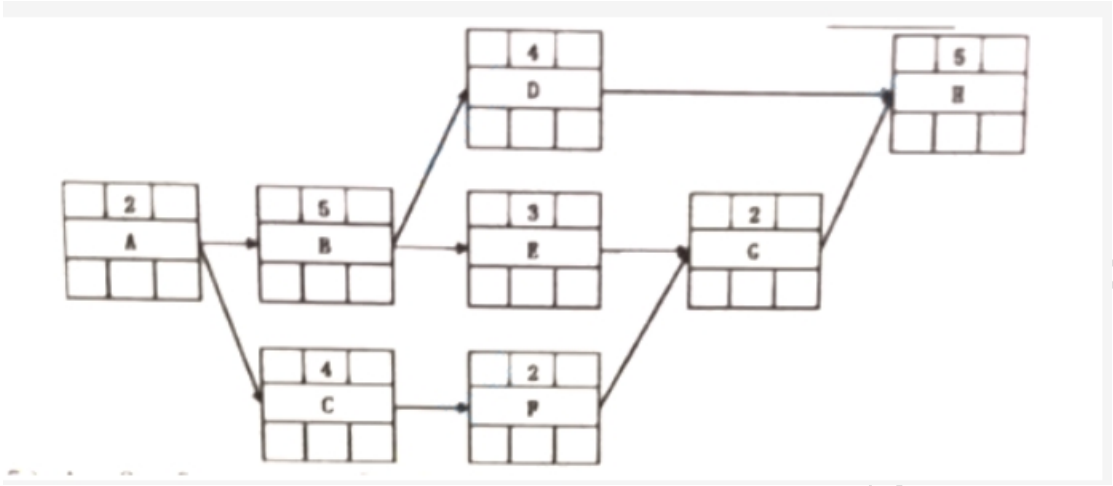

A、2 0　　B、2 1　　C、0 2　　D、1 1

19、中级 22 上 44、45 题（广东卷）

下图（单位：周）为某项目的进度网络图，项目各项工作顺序及工作时长如图所示，活动 D 的总浮动时间和自由浮动时间分别为（44），该项目工期为（45）。

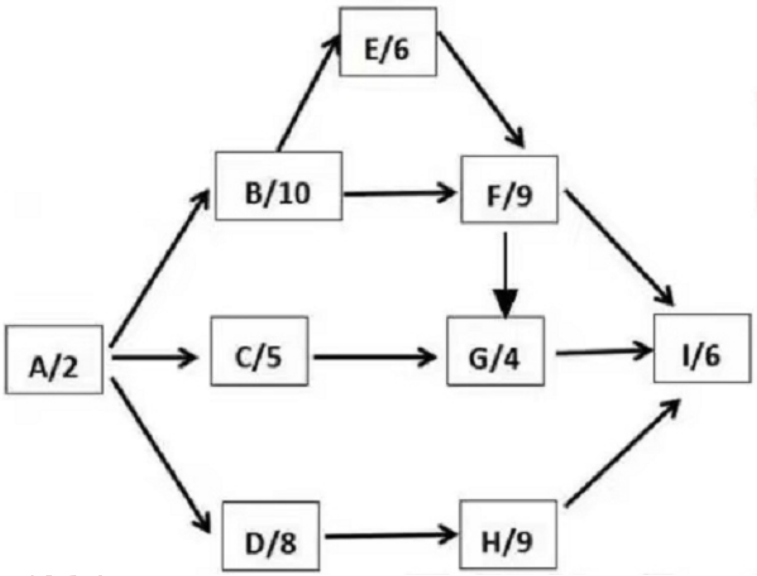

（44）A、5,0　　B、12,0　　C、18,0　　D、20,20

（45）A、17　　B、26　　C、37　　D、31

20、中级 22 下 44

某活动的最乐观时间为 6 天，最可能时间为 9 天，最悲观时间为 12 天，则该活动持续时间的 PERT 估算值和估算的标准差分别为（44）。

A、9 天，1 天　　B、9 天，2 天　　C、10，1 天　　D、10 天，2 天

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

21、中级 22 下 45（广东卷）

某项目的网络图如下，活动 C 的自由浮动时间为（45）天。

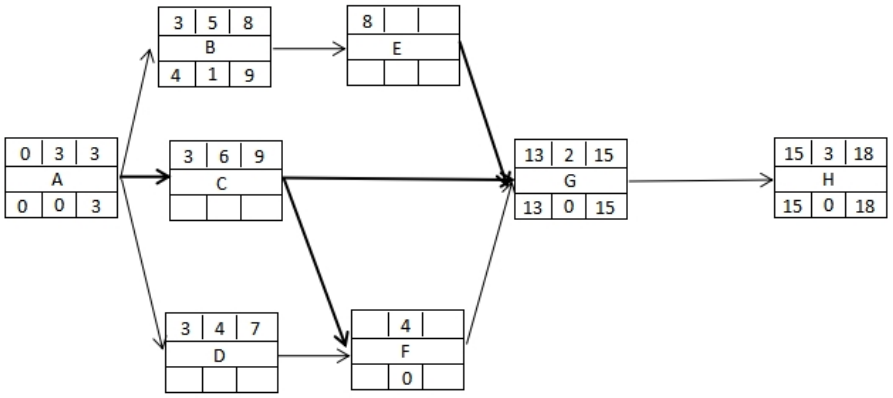

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

22、中级 23 上 42

某项目工期乐观估算需 20 天完成，最可能 23 天完成，最差情况下需 32 天完成，则该项目的期望完成时间和标准差分别是（42）。

A、23　1　　B、23　2　　C、24　2　　D、25　1

23、高级 08 上 36

下图中活动“G”可以拖延（36）周而不会延长项目的最终结束日期。(图中时间单位为周)

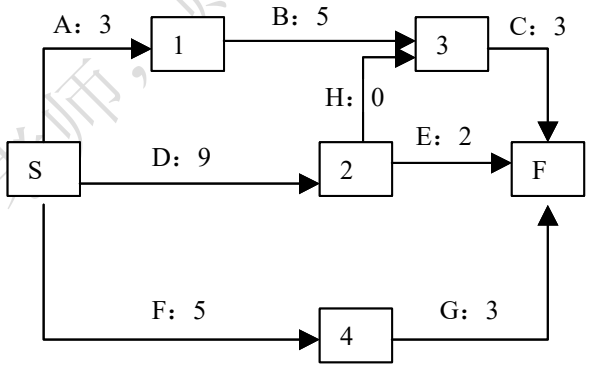

A、0　　B、1　　C、3　　D、4

24、高级 14 上 35

某项目各项工作的先后顺序及工作时间如下表所示，该项目的总工期为（35）天。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

序号	活动名称	紧前活动	活动持续时间（天）
1	A	--	5
2	B	A	7
3	C	A	5
4	D	A	6
5	E	B	9
6	F	C、D	13
7	G	E、F	6
8	H	F	5
9	I	G、H	2

A、31　　B、32　　C、33　　D、34

25、高级 17 下 37、38

下图中（单位：周）显示的项目历时总时长是（37）周，在项目实施过程中，活动 d→i 比计划延期了 2 周，活动 a→c 实际工期是 6 周，活动 f→h 比计划提前了 1 周，此时该项目的历时总时长为（38）周。

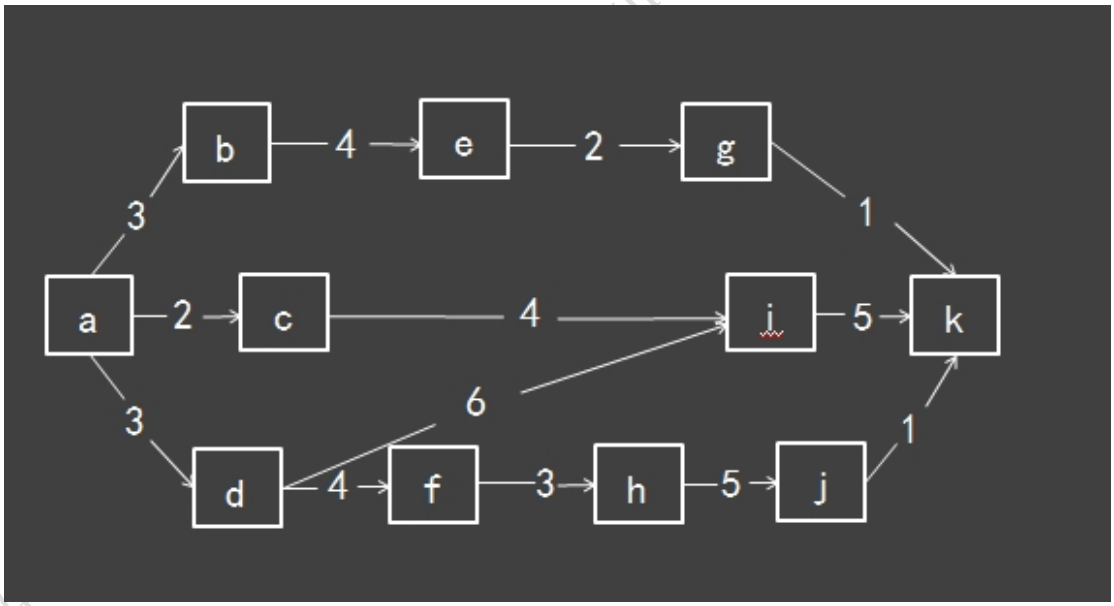

（37）A、14　　B、18　　C、16　　D、13

（38）A、14　　B、18　　C、16　　D、17

26、高级 18 上 37、38

某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示，活动 C 的总浮动时间是（37），该项目工期是（38）天。

活动名称	活动历时（天）	紧前活动

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A	2	–
B	4	A
C	5	A
D	6	A
E	4	B
F	4	C、D
G	3	E、F

（37）A、0　　B、1　　C、2　　D、3

（38）A、13　　B、14　　C、15　　D、16

27、高级 18 下 38、39

项目经理为某政府网站改造项目制作了如下双代号网络图（单位：天），该项目的总工期为（38）天。在项目实施的过程中，活动 2-7 比计划提前了 2 天，活动 8-10 实际工期是 3 天，活动 6-7 的工期增加了 3 天，判断对项目总工期的影响：（39）。

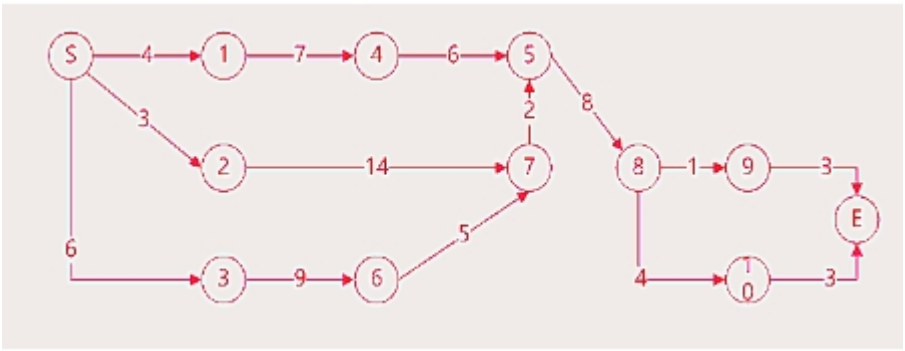

（38）A、40　　B、37　　C、34　　D、32

（39）A、没有影响　　B、增加了 2 天　　C、增加了 3 天　　D、增加了 4 天

28、高级 19 上 37、38

某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动，各活动的历时估算和逻辑关系如下表所示，则活动 C 的总浮动时间是（37）天，项目工期是（38）天。

活动名称	紧前活动	活动历时（天）
A	—	2
B	A	4
C	A	5
D	A	6
E	B，C	4
F	D	6
G	E，F	3

（37）A、0　　B、1　　C、2　　D、3

（38）A、14　　B、15　　C、16　　D、17

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

29、高级 19 下 33、34

某项目包含 A、B、C、D、E、F、G 七个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	-
B	4	A
C	5	A
D	3	A
E	3	B
F	4	B C D
G	3	E F

依据上表内容，活动 D 的总浮动时间是（33）天，该项目工期为（34）天

（33）A、0　　B、1　　C、2　　D、3

（34）A、12　　B、13　　C、14　　D、15

30、高级 20 下 32、33

某项目包含 ABCDEFGHIJ 一共 10 个活动，各活动历时估算与逻辑关系如下表所示，则该项目工期为（32），活动 C 的总浮动时间是（33）

活动名称	活动历时（天）	前置活动
A	2	-
B	4	A
C	2	A
D	3	A
E	3	B
F	4	D
G	2	ECF
H	4	G
I	2	G
J	3	HI

A、17　　B、18　　C、19　　D、20

A、2　　B、3　　C、4　　D、5

31、高级 20 下 33、34

某项目各活动先后顺序及持续时间如下表所示，该项目的关键路径为（33）执行过程中一名工程师因病缺席，导致活动 D 延期 2 天，为了确保项目按时完成，（34）

活动	持续时间	前序活动

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A	4	C
B	3	C
C	4	–
D	1	AB
E	7	C
F	5	B
G	2	DEF

(33)A、CBDG　　B、CEFG　　C、CADG　　D、CBFG

(34)A、应为活动 D 增加更多资源　　B、不需要采取任何措施

C、需要为关键路径上的任务赶工　　D、应改进项目所需技术

32、高级 21 下 34

下图是某项目的进度网络图，则在保障不会影响项目总工期的情况下，活动 E 最多能拖延（34）天。

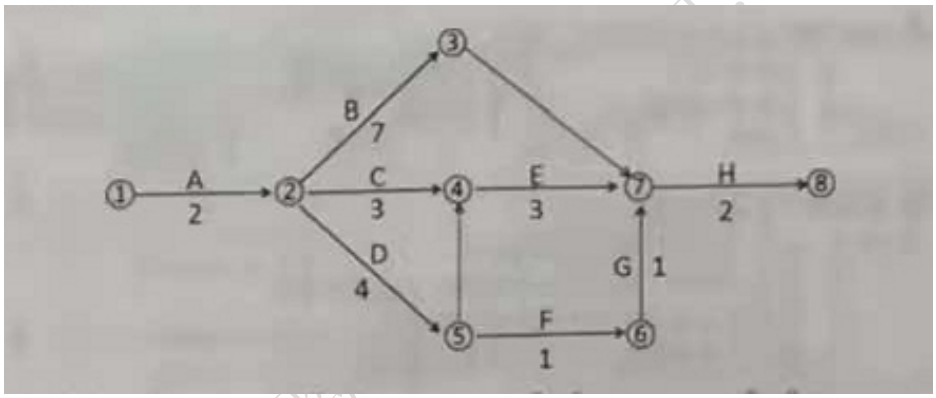

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

33、高级 22 上 33

某学校开发图书管理系统，软件研发专家组给出了如下时间估计：

活动	乐观工期	最可能工期	悲观工期
图书管理系统的代码编写	5 人天	14 人天	17 人天

假设三个估值服从 β 分布，则该图书管理系统软件在 11-15 天之间完成的可能性约为(33)。

A、34%　　B、68%　　C、95%　　D、99%

34、高级 22 下 29-31

某视频监控系统，项目活动如下表所示，则该项目中（29）活动不需要在监控模块上传功能（M）活动前必须完成。项目总工期是（30）天。由于负责设备权限功能（H）研发的小王临时出差，导致该功能工期延长了 9 天，则项目总工期延期（31）天。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

活动			工期（天）	活动编号	紧前活动
需求分析	需求调研		16	A	
	需求确认		3	B	A
系统设计	概要设计		8	C	B
	详细设计		17	D	C
系统实现	数据库模块	数据库构建	10	E	D
	用户模块	信息维护功能	21	F	E
		身份认证功能	12	G	F
		设备权限功能	6	H	G
	设备模块	注册功能	5	I	E
		状态查询功能	8	J	I.H
	监控模块	监控功能	23	K	I.G
		轮询功能	12	L	J.K
		上传功能	9	M	K
系统测试	功能测试		15	N	K.L.M
	集成测试		10	O	N
系统支付	系统部署		3	P	O
	用户手册		5	Q	O
	用户培训		2	R	P.Q

（29）A、信息维护功能（F）　　B、设备权限功能（H）
　　C、身份认证功能（G）　　D、监控功能（K）

（30）A、148　　B、150　　C、154　　D、160

（31）A、0　　B、3　　C、5　　D、9

35、高级 23 上 31

某项目的网络图如下，活动 C 的自由浮动时间为(31)天。

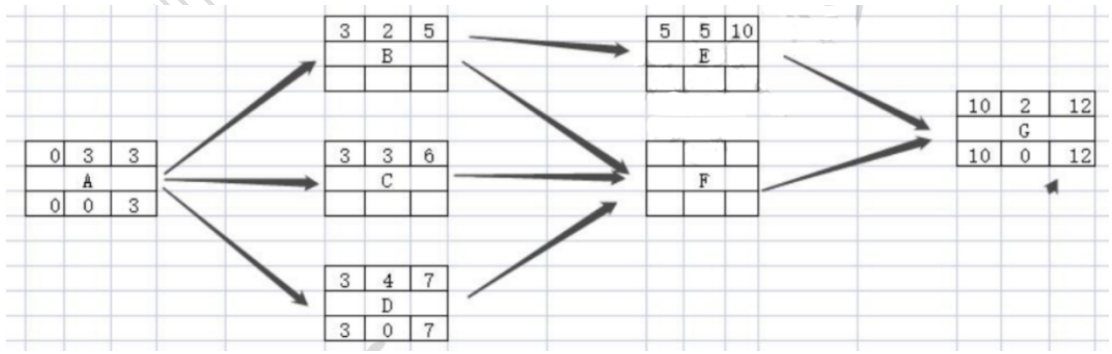

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

36、中级 23 下第 1 批

某项目的工期为 15 天，标准差为 5 天，则 20 天内完成该项目的概率为（）

A、68%　　B、97%　　C、84%　　D、93%

37、中级 23 下第 4 批

估算“编写用户登录功能”任务的工期时，乐观时间为 3 天，最可能时间为 5 天，悲观时间为 7 天，估算法计算该任务的工期为（）天，标准差为（）天。

A、5，0.33　　B、5，0.67　　C、4，0.33　　D、4，0.67

38、中级 23 下第 5 批

某项目各活动的先后顺序及工作时间如下表所示,活动B和E的三个数值为三点估算值则该项目的总工期为（）月。

活动	紧前活动	工期（月）
A	/	2
B	A	3,4,5
C	B	3
D	C	4
E	D	2,8,14
F	E	3

A、23　　B、24　　C、22　　D、21

有点难度的题目，请大家先做，如果有疑问，可以听课。

1、中级 09 上 24

在项目某阶段的实施过程中，A 活动需要 2 天 2 人完成，B 活动需要 2 天 2 人完成，C 活动需要 5 天 4 人完成，D 活动需要 3 天 2 人完成，E 活动需要 1 天 1 人完成，该阶段的时标网络图如下。该项目组共有 8 人，且负责 A、E 活动的人因另有安排，无法帮助其他人完成相应工作，且项目整个工期刻不容缓。以下（24）安排是恰当的，能够使实施任务顺利完成。

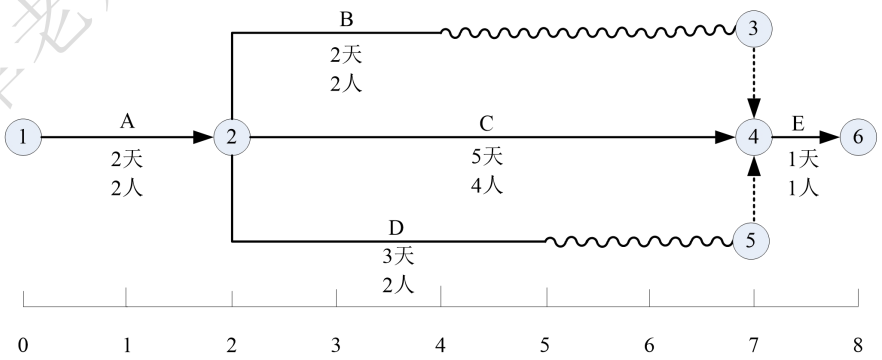

A、B 活动提前两天开始　　B、B 活动推迟两天开始

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、D 活动提前两天开始　　D、D 活动推迟两天开始

2、中级 10 上 37

在工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间为第 16 天，其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第 25 天、第 27 天和第 30 天，最迟开始时间分别为第 28 天、第 29 天和第 30 天。则工作 M 的总时差为（37）天。

A、5　　B、6　　C、7　　D、9

3、中级 13 下 40

某项活动的最早开始日期为本月 11 日，最晚开始日期为本月 19 日，该活动的持续时间为 4 天。如果不涉及非工作日，从上述信息可以判断，（40）是正确的

A、活动总时差为 9 天　　B、活动的最早完成时间为本月 14 日

C、活动最晚完成时间为本月 23 日　　D、如果资源分配翻倍，则活动可以在 2 天完成

4、中级 19 上 47、48

下图为某项目规划的进度网络图(单位:周)，在实际实施过程中，活动 B--E 比计划延迟了 2 周，活动 J-K 比计划提前了 3 周，则该项目的关键路径是（47），总工期是（48）周。

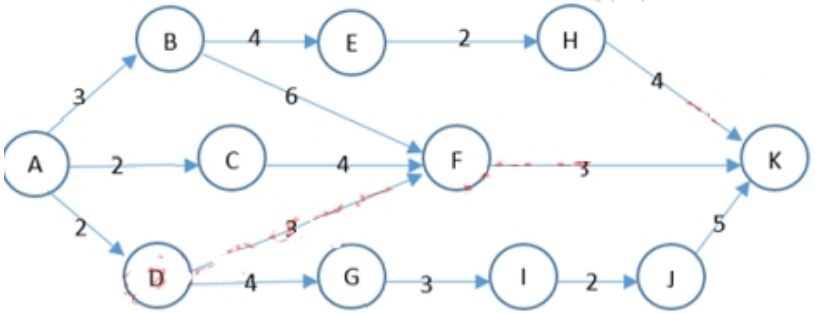

（47）A、A-D-G-I-J-K　　B、A-B-F-K　　C、A-B-E-H-K　　D、A-D-F-K

（48）A、15　　B、14　　C、13　　D、12

5、高级 09 上 14

某项目的时标网络图如下（时间单位：周），在项目实施过程中，因负责实施的工程师误操作发生了质量事故，需整顿返工，造成工作 4-6 拖后 3 周，受此影响，工程的总工期会拖延（14）周。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

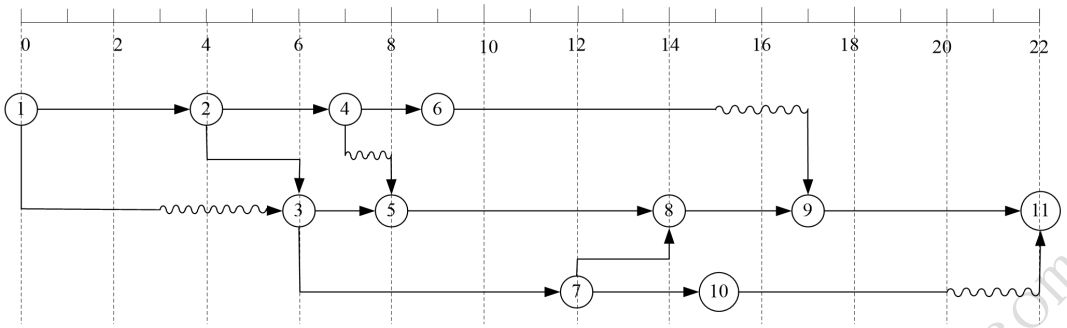

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

6、高级 09 上 57、58

某工程包括 A、B、C、D、E、F、G、H 八个作业，各个作业的紧前作业、所需时间和所需人数如下表所示（假设每个人均能承担各个作业）：

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	—	—	A	B	C	C	D,E	G
所需时间（周）	2	1	1	1	2	1	2	1
所需人数	8	4	5	4	4	3	7	8

该工程的工期应为（57）周。按此工期，整个工程至少需要（58）人。

（57）A、8　　B、9　　C、10　　D、11

（58）A、8　　B、9　　C、10　　D、11

7、高级 10 上 35、36

某工程包括 A、B、C、D、E、F、G 七项工作，各工作的紧前工作、所需时间以及所需人数如下表所示（假设每个人均能承担各项工作）

工作	A	B	C	D	E	F	G
紧前工作	—	A	A	B	C、D	—	E、F
所需时间（天）	5	4	5	3	2	5	1
所需人数	7	4	3	2	1	2	4

该工程的工期应为（35）天。按此工期，整个工程最少需要（36）人。

（35）A、13　　B、14　　C、15　　D、16

（36）A、7　　B、8　　C、9　　D、10

8、高级 10 下 37

以下是某工程进度网络图，如果因为天气原因，活动③→⑦的工期延后 2 天，那么总工期将延后（37）天。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

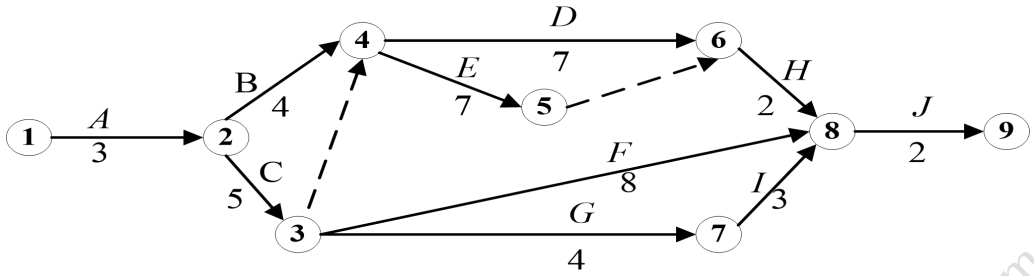

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

9、高级 11 上 55

根据以下某项目的网络图，在最佳的人力资源利用情况下，限定在最短时间内完成项目，则项目的人力资源要求至少为(55)人。

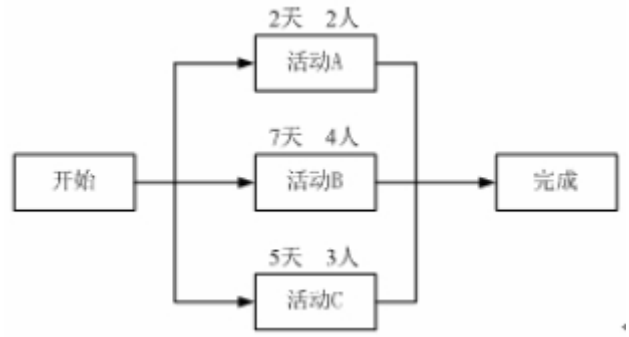

A、9　　B、8　　C、7　　D、6

10、高级 12 下 27

某项目预计最快 12 天完成，最慢 36 天完成，21 天完成的可能性最大。公司下达的计划是 18 天完成，要使计划完成的概率达到 50%，在计划中需要增加（27）天应急时间。

A、4　　B、6　　C、8　　D、22

11、高级 13 上 32、33

在下面的项目网络图中（时间单位为天），活动 B 的自由时差和总时差分别为（32）。如果活动 A 的实际开始时间是 5 月 1 日早 8 时，在不延误工期的情况下，活动 B 最晚应在（33）前结束。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

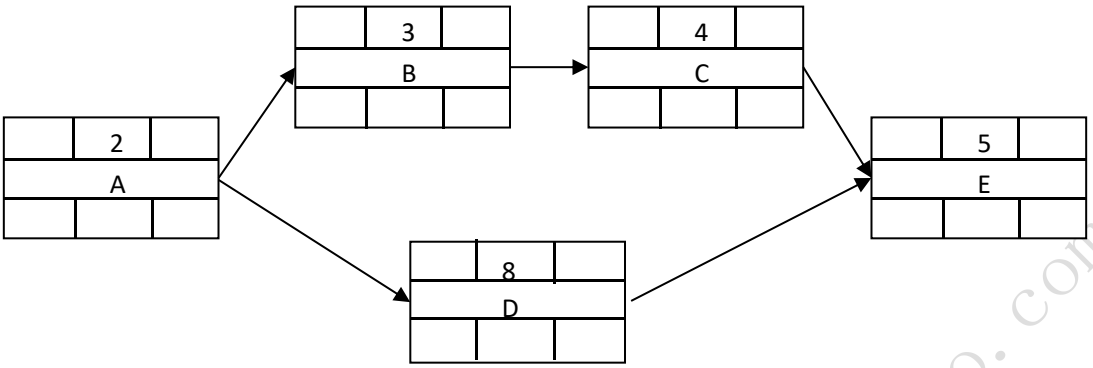

最早开始时间	持续时间	最早完成时间
任务名称		
最迟开始时间		最迟完成时间

（32）A、0、0　　B、0、1　　C、1、0　　D、1、1

（33）A、5 月 5 日早 8 时　　B、5 月 6 日早 8 时

C、5 月 7 日早 8 时　　D、5 月 8 日早 8 时

12、高级 15 上 66

某信息系统集成项目包括 7 个作业（A~G），各作业所需的时间、人数以及各作业之间的衔接关系如图所示（其中虚线表示不消耗资源的虚作业）。



如果各作业都按最早时间开始，那么正确描述该工程每一天所需人数的图为（）

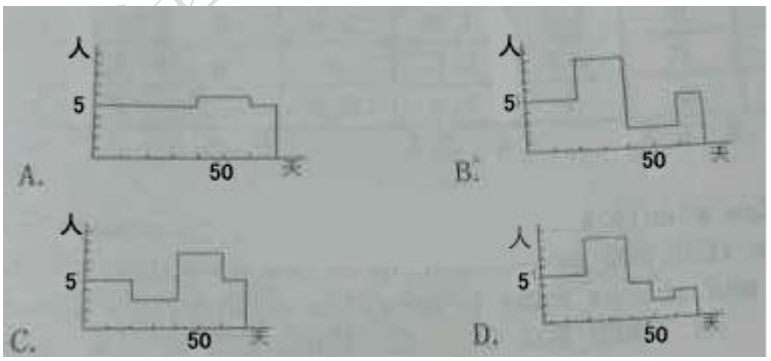

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、高级16下37

某项目包括的活动情况如下表所示：

活动	持续时间	活动	持续时间	活动	持续时间
A	4	B	3	C	4
D	2	E	3	F	4

活动D和活动F只能在活动C结束后开始，活动A和活动B可以在活动C开始后的任何时间内开始，但是必须在项目结束前完成，活动E只能在活动D完成后开始,活动B是在活动C开始1天后才开始的，在活动B的过程中，发生了一件意外时间，导致活动B延期2天，为了确保项目按时完成（37）

A、应为活动B添加更多资源　　B、可不需要采取任何措施

C、需为关键路径上的任务重新分配资源　　D、应为活动D添加更多的资源

14、高级18上66、67

某项工程的活动明细如下表(时间:周:费用，万元)：

活动	紧前	正常进度		赶工	
		所需时间	直接费用	所需时间	直接费用
A	-	3	10	2	15
B	A	8	15	6	17
C	A	4	12	3	13
D	C	5	8	3	11
项目间接费用每周需要1万元					

项目总预算由原先的60万元增加到63万元，根据上表，在预算约束下该工程最快能完成时间为(66)周，所需项目总费用为（67）万元。

(66)A、9　　B、8　　C、14　　D、12

(67)A、60　　B、64　　C、56　　D、45

15、高级18上68、69

某项目由并行的3个活动甲、乙和丙组成，为活动甲分配3人5天可以完成活动乙分配6人7天可以完成，活动丙分配4人2天可以完成，活动完成后人员可再调配。在此情况下，项目最短工期为（68）天，此时人员最少配置为（69）人。

(68)A、6　　B、7　　C、8　　D、9

(69)A、6　　B、9　　C、10　　D、13

16、高级21下33

下图表示某项目各个活动关系及乐观、最可能、悲观完成时间，假设各活动的三种完成时间服从β分布，按照三点估算法该项目标准差为3.2天，则项目在（33）完成的概率为95%。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

活动	紧前活动	乐观时间(天)	最可能时间（天）	悲观时间（天）
A		8	12	16
B	A	15	18	27
C	-	5	7	9
D	C	11	13	14
E	B、D	4	5	12
F	E	5	13	15

A、42.6天到55.4天　　B、45.8天到52.2天

C、61.4天到74.6天　　D、64.7天到71.3天

17、高级22上31、32

一个软件研发项目使用迭代开发，共计进行3次迭代，每次迭代的工作分解均为：需求分析-设计编码-测试验证。该项目的活动关系表如下：

活动描述	活动	持续时间（天）	紧前活动
项目整体设计和迭代计划	A	3	
迭代1-需求分析	B	5	A
迭代1-代码编写	C	15	B
迭代1-测试验证	D	5	C
迭代2-需求分析	E	3	B
迭代2-代码编写	F	12	C、E
迭代2-测试验证	G	7	D、F
迭代3-需求分析	H	3	E
迭代3-代码编写	I	5	F、H
迭代3-测试验证	J	7	G、I
系统验证和发布	K	7	J

则该项目的工期为（31），在迭代3需求分析时，用户提出需求变更，导致迭代3的代码编写的持续时间增加了5天，其他活动持续时间不变，则项目整体持续时间将增加（32）天。

（31）A、52　　B、54　　C、56　　D、58

（32）A、0　　B、1　　C、3　　D、5

历年考题题目举例（下午案例分析）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

很简单的题目，如下题目我们不再讲解。相信大家听了基础课都会做，如果不会做，建议再听下基础课。

1、中级 2009 上半年试题 2

【说明】

下图为某项目主要工作的单代号网络图。工期以工作日为单位。

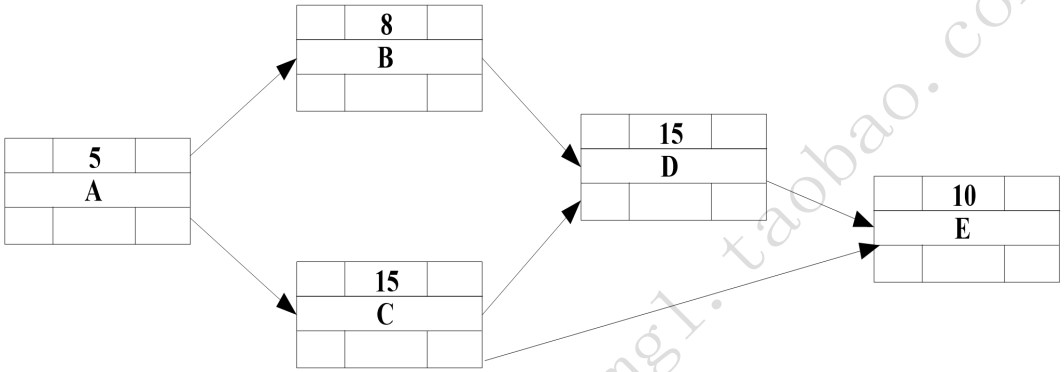

工作节点图例如下：

ES	工期	EF
工作编号		
LS	总时差	LF

【问题 1】（5 分）

请在图中填写各活动的最早开始时间（ES）、最早结束时间（EF）、最晚开始时间（LS）、最晚结束时间（LF），从第 0 天开始计算。

【问题 2】（6 分）

请找出该网络图的关键路径，分别计算工作 B、工作 C 的总时差和自由时差，说明此网络工程的关键部分能否在 40 个工作日内完成，并说明具体原因。

【问题 3】（4 分）

请说明通常情况下，若想缩短工期可采取哪些措施。

2、中级 2011 下半年试题 2

【说明】

某系统集成项目的建设方要求必须按合同规定的期限交付系统，承建方项目经理李某决定严格执行项目管理，以保证项目按期完成。他决定使用关键路径方法来编制项目进度网络图。在对工作分解结构进行认真分析后，李某得到一张包含了活动先后关系和每项活动初步历时估计的工作列表，如下所示：

活动代号	前序活动	活动历时（天）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A	-	5
B	A	3
C	A	6
D	A	4
E	B、C	8
F	C、D	5
G	D	6
H	E、F、G	9

【问题 1】（5 分）

请计算活动 B、C、F 的自由浮动时间。

请计算活动 D、G 的最迟开始时间。

【问题 2】（4 分）

如果活动 B 拖延了 4 天，则该项目的工期会拖延几天？请说明理由。

【问题 3】（6 分）

按照题干所述，李某实际完成了项目进度管理的什么过程？如果要进行有效的项目进度管理，还要完成哪些过程？

3、中级 2017 年上半年试题 2

【说明】

某项目细分为 A、B、C、D、E、F、G、H 共八个模块，而且各个模块之间的依赖关系和持续时间如下表所示：

活动代码	紧前活动	活动持续时间（天）
A	-	5
B	A	3
C	A	6
D	A	4
E	B、C	8
F	C、D	5
G	D	6
H	E、F、G	9

【问题 1】（4 分）

计算该活动的关键路径和项目的总工期

【问题 2】（8 分）

（1）计算活动 B、C、D 的总体时差

（2）计算活动 B、C、D 的自由时差

（3）计算活动 D、G 的最迟开始时间

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 3】（5 分）

如果活动 G 尽早开始，但工期拖延了 5 天，则该项目的工期会拖延多少天？请说明理由。

【问题 4】（5 分）

请简要说明什么是接驳缓冲和项目缓冲。如果采取关键链法对该项目进行进度管理，则接驳缓冲应该设置在哪里？

4、中级 2017 年下半年试题 2

【说明】

某信息系统项目包含如下 A、B、C、D、E，F，G、H 八个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示（其中活动 E 的历时空缺）：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	-
B	4	A
C	5	A
D	3	A
E		B
F	4	C、D
G	3	E、F
H	3	G

【问题 1】（3 分）

假设活动 E 的最乐观时间为 1 天，最可能时间为 4 天，最悲观时间为 7 天，请用三点估算法计算活动 E 的持续时间。

【问题 2】（6 分）

下图给出了该项目网络图的一部分（该图仅为方便考生答题，空缺部分不需要在试卷或者答题纸上回答）。

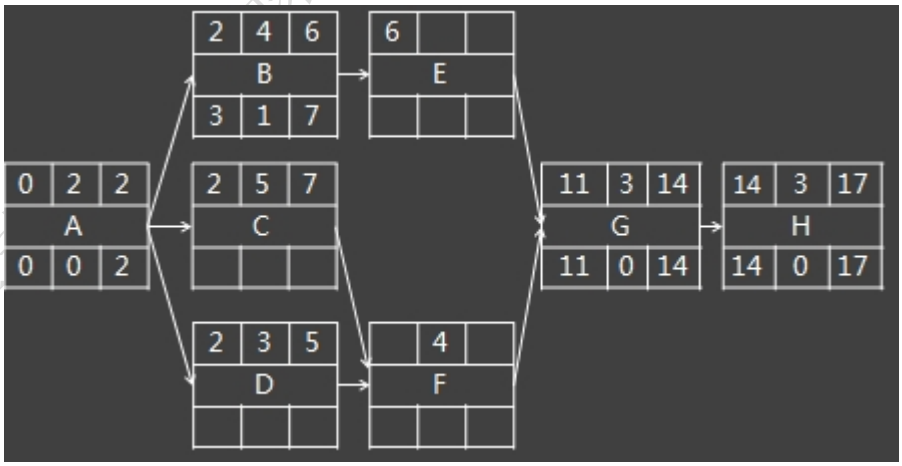

根据上图并结合基于问题 1 的计算结果，请计算活动 C、D、E 的总浮动时间和自由浮动时间。

【问题 3】（4 分）

基于问题 2 的计算结果，请计算：该项目的关键路径，该项目的总工期。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 4】（5 分）

请指出缩短项目工期的方法。

5、高级 2011 年下半年试题 1

【说明】

张某是 M 公司的项目经理，有着丰富的项目管理经验，最近负责某电子商务系统开发的项目管理工作，该项目经过工作分解后，范围已经明确。为了更好地对项目的开发过程进行监控，保证项目顺利完成，张某拟采用网络计划技术对项目进行进度管理。经过分析，张某得到了一张工作计划表，如表所示。

工作代号	紧前工作	计划工作历时（天）	最短工作历时（天）	每缩短一天所需要增加的费用（万元）
A	-	5	4	5
B	A	2	2	
C	A	8	7	3
D	B、C	10	9	2
E	C	5	4	1
F	D	10	8	2
G	D、E	11	8	5
H	F、G	10	9	8
每天的间接费用为 1 万元				

事件 1：为了标明各活动之间的逻辑关系，计算工期，张某将任务及有关属性用以下样图表示，然后根据工作计划表，绘制单代号网络图。

ES	DU	EF
ID		
LS		LF

其中，ES 表示最早开始时间，EF 表示最早结束时间；LS 表示最迟开始时间，LF 表示最迟结束时间；DU 表示工作历时，ID 表示工作代号。

事件 2:张某的工作计划得到了公司的认可，但是项目建设方（甲方）提出，因该项目涉及融资，希望项目工期能够提前 2 天，并可额外支付 8 万元的项目款。

事件 3：张某将新的项目计划上报给了公司，公司请财务部估算项目的利润。

【问题 1】（13 分）

（1）请按照事件 1 的要求，帮助张某完成此项目的单代号网络图。

（2）指出项目的关键路径和工期。

【问题 2】（6 分）

在事件 2 中，请简要分析张某应如何调整工作计划，才能满足建设方的工期要求，又尽量节省费用。

【问题 3】（6 分）

请指出事件 3 中，财务部估算的项目利润因工期提前变化了多少，为什么？

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

6、高级 2024 年第 1 批

某项目各活动信息如下所示：

活动	工期	紧前
A	3	-
B	5	A
C	7	A
D	6	B
E	3	B
F	8	CE
G	4	D
H	3	GF

【问题 1】

关键路径是什么？总工期是？

【问题 2】

如果在 DG 活动中，增加活动 N（工期是 3 周），求新的关键路径和总工期

【问题 3】

按新计划完成如下表格（活动交给两个团队完成，每个团队可以完成任何 1 个活动，但是在活动开始直到结束才能去做另 1 个活动，请问还能按新计划完成吗？完成如下表格）

时间	团队	活动
1-3 周	甲	A
4-8 周	甲	B
4-10 周	乙	C
		D
		E
		F
		N
		G
		H

有点难度的题目，请大家先做，如果有疑问，可以听课。

1、中级 2015 年上半年试题 1

【说明】

项目经理小杨把编号为 1401 的工作包分配给张工负责实施，要求他必须在 25 天内完成。任务开始时间是 3 月 1 日早 8 点，每天工作时间为 8 小时。张工对该工作包进行了活动分解和活动历时估算，并绘制了如下的活动网络图。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

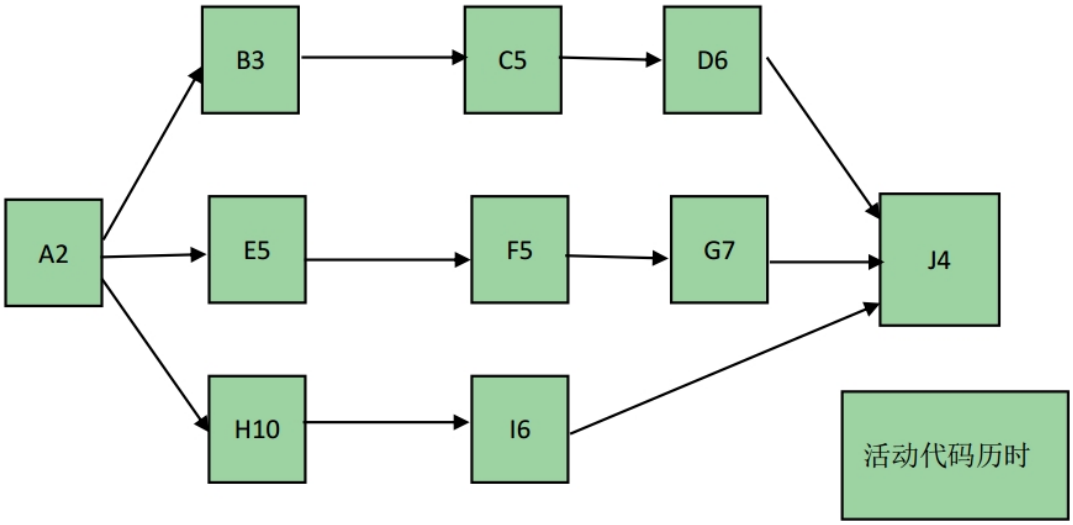

1401 工作包的直接成本由人力成本（每人每天的成本是 1000 元）构成，每个活动需要 2 人完成。

【问题 1】（9 分）

请将下面（1）—（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

张工按照《1401 工作包活动网络图》制订了工作计划，预计总工期为（1）天。按此计划，预留时间储备是（2）天。该网络图的关键路径是（3）。按照《1401 工作包活动网络图》所示，计算活动 C 的总时差是（4）天，自由时差是（5）天。正常情况下，张工下达给活动 C 的开工时间是 3 月（6）日。

【问题 2】（6 分）

假如活动 C 和活动 G 都需要张工主持施工（张工不能同时对 C 和 G 进行施工），请进行如下分析:

（1）由于各种原因，活动 C 在 3 月 9 日才开工，按照张工下达的进度计划，该工作包的进度是否会延迟?并说明理由。

（2）基于（1）所述的情况，在不影响整体项目工期的前提下，请分析张工宜采取哪些措施？

【问题 3】（10 分）

张工按照《1401 工作包活动网络图》编制了进度计划和工作包预算，经批准后发布。在第 12 天的工作结束后，活动 C,F,H 都刚刚完成，实际花费为 7 万元。请做如下计算和分析:

（1）当前时点的 SPI 和 CPI。

（2）在此情况下，张工制订的进度计划是否会受到影响，并说明理由。

2、中级 2016 年上半年试题 1

【说明】

已知某信息工程项目由 A 到 I 共 9 个活动组成，项目组根据项目目标，特别是工期要求，经过分析、定义及评审，给出了该项目的活动历时。活动所需资源及活动逻辑关系列表，如下

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

表所示：

活动	历时（天）	资源（人）	紧前活动
A	10	2	-
B	20	8	A
C	10	4	A
D	10	5	B
E	10	4	C
F	20	4	D
G	10	3	D
H	20	7	E、F
I	15	8	G、H

【问题 1】（2 分）

请指出该项目的关键路径和工期

【问题 2】（6 分）

请给出活动 C、E、G 的总时差和自由时差

【问题 3】（6 分）

项目经理以工期紧、项目难度高为由，向高层领导汇报申请组建 12 人的项目团队，但领导没有批准。

（1）领导为什么没有同意该项目经理的要求？若不考虑人员能力差异，该项目所需人数最少是多少个人？

（2）由于资源有限，利用总时差、自由时差，调整项目人员安排而不改变项目关键路径和工期的技术是什么？

（3）活动 C、E、G 各自最迟从第几天开始执行才能满足（1）中项目所需人数最少值？

【问题 4】（6 分）

在（1）~（6）中填写内容

为了配合甲方公司成立庆典，甲方要求该项目提前 10 天完工，并同意支付额外费用。承建单位经过论证，同意了甲方要求并按规范执行了审批流程。为了保质保量按期完工，在进度控制及人力资源管理方面可以采取的措施包括：① 向（1）要时间，向（2）要资源 ② 压缩（3）上的工期 ③ 加强项目人员的质量意识，及时（4），避免后期返工④ 采取压缩工期的方法：尽量（5）安排项目活动，组织大家加班加点进行（6）

（1）~（6）供选择的答案：A、评审 B、激励 C、关键路径 D、非关键路径 E、赶工 F、并行 G、关键任务 H、串行

3、中级 2018 年上半年试题 2

【说明】

某项目由 P1、P2、P3、P4、P5 五个活动组成，五个活动全部完成之后项目才能够完成，每个活动都需要用到 R1、R2、R3 三种互斥资源，三种资源都必须达到活动的资源需求量，活动才能开始。已分配资源只有在完成本活动后才能被其他活动所用。目前项目经理能够调配的资源

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

有限，R1、R2、R3 的可用资源数分别为 9、8、5 活动对资源的需求量、已分配资源数和各活动历时如下表所示(假设各活动之间没有依赖关系)：

资源 / 活动	资源需求量			已分配资源数			历时（周）
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	
P1	6	4	1	1	2	1	1
P2	2	3	1	2	1	1	3
P3	8	0	1	2	0	0	3
P4	3	2	0	1	2	0	2
P5	1	4	4	1	1	3	4

【问题 1】(6 分)

基于以上案例，简要叙述最优的活动步骤安排。

【问题 2】(7 分)

基于以上案例，请计算项目的完工时间(详细写出每个活动开始时间、占用资源和完成时间以及项目经理分配资源的过程)。

【问题 3】(4 分)

在制订项目计划的过程中，往往受到资源条件的限制，经常采用资源平衡和资源平滑方法，请简要描述二者的区别。

4、高级 2016 年上半年试题 1

【说明】

下图给出了一个信息系统项目的进度网络图。

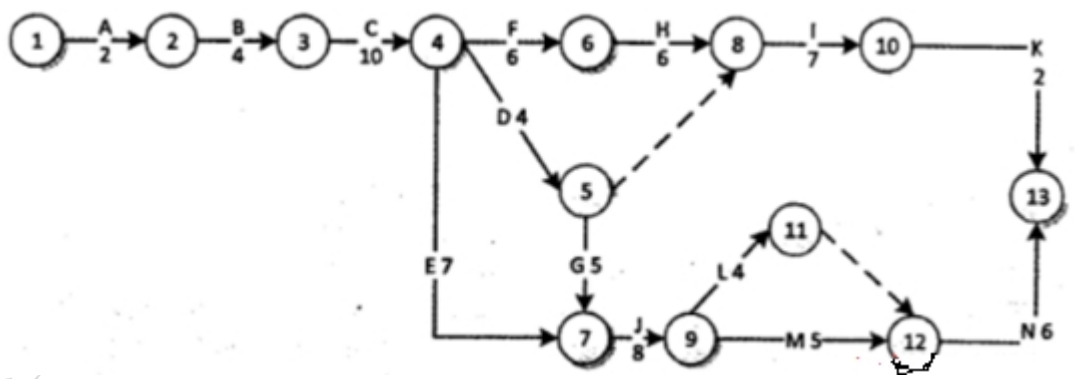

下表给出了该项目各项作业正常工作与赶工工作的时间和费用。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

活动	正常工作		赶工工作	
	时间 / 天	费用 / 元	时间 / 天	费用 / 元
A	2	1200	1	1500
B	4	2500	3	2700
C	10	5500	7	6400
D	4	3400	2	4100
E	7	1400	5	1600
F	6	1900	4	2200
G	5	1100	3	1400
H	6	9300	4	9900
I	7	1300	5	1700
J	8	4600	6	4800
K	2	300	1	400
L	4	900	3	1000
M	5	1800	3	2100
N	6	2600	3	2960

【问题 1】（3 分）

请给出项目关键路径。

【问题 2】（3 分）

请计算项目总工期。

【问题 3】（19 分）

（1）请计算关键路径上各活动的可缩短时间、每缩短 1 天增加的费用和增加的总费用，将关键路径上各活动的名称以及对应的计算结果填入答题纸相应的表格中。

（2）项目工期要求缩短到 38 天，请给出具体的工期压缩方案并计算需要增加的最少费用。

5、高级 2018 年上半年试题 2

【说明】

某软件项目包含 8 项活动，活动之间的依赖关系，以及各活动的工作量和所需的资源如下

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

表所示。假设不同类型的工作人员之间不能互换，但是同一类型的人员都可以从事与其相关的所有工作。所有参与该项目的工作人员，从项目一开始就进入项目团队，并直到项目结束时才能离开，在项目过程中不能承担其他活动。（所有的工作都按照整天计算）

活动	工作量	依赖	资源类型
A	4		SA
B	3	A	SD
C	2	A	SD
D	4	A	SD
E	3	B	SC
F	3	C	SC
G	8	C、D	SC
H	2	E、F、G	SA

SA：系统分析人员　　SD：系统设计人员　　SC:软件编码人员

【问题 1】（14 分）

假设该项目团队有 SA 人员 1 人，SD 人员 2 人，SC 人员 3 人，请将下面（1）~（11）处的答案填写在答案纸的对应栏内。

- A 结束后，先投入（1）个 SD 完成 C，需要（2）天。
- C 结束后，再投入（3）个 SD 完成 D，需要（4）天。
- C 结束后，投入（5）个 SC 完成（6），需要（7）天。
- D 结束后，投入 SD 完成 B。
- C、D 结束后，投入（8）个 SC 完成 G，需要（9）天。
- G 结束后，投入（10）个 SC 完成 E，需要 1 天。
- E、F、G 完成后，投入 1 个 SA 完成 H，需要 2 天。
- 项目总工期为（11）天。

【问题 2】（7 分）

假设现在市场上一名 SA 每天的成本为 500 元，一名 SD 每天的成本为 500 元，一名 SC 每天的成本为 600 元，项目要压缩至 10 天完成。

（1）则应增加什么类型的资源？增加多少？

（2）项目成本增加还是减少？增加或减少多少？（请给出简要计算步骤）

【问题 3】（6 分）

请判断以下描述是否正确（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，不正确的选项填写“×”）：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）活动资源估算过程同费用估算过程紧密相关，外地施工团队聘用熟悉本地相关法规的咨询人员的成本不属于活动资源估算的范畴，只属于项目的成本部分。（）

（2）制定综合资源日历属于活动资源估算过程的一部分，一般只包括资源的有无，而不包括人力资源的能力和技能。（）

（3）项目变更造成项目延期，应在变更确认时发布，而非在交付前发布。（）

6、高级 2021 年上半年试题 2

【说明】

某项目的网络图如下

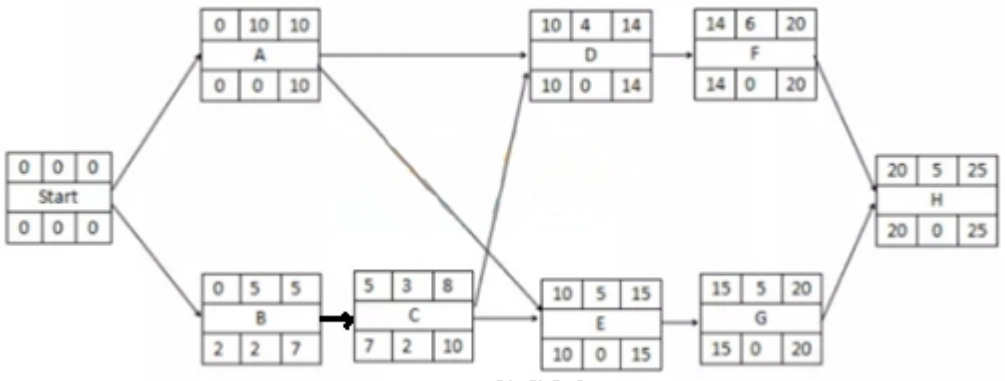

其中，各活动正常完工时间、正常完工直接成本、最短完工时间、赶工增加直接成本（如下表所示）。另外，项目的间接成本为 500 元/天

活动	正常完工时间（天）	正常完工直接成本（百元）	最短完工时间（天）	赶工增加直接成本（百元.天）
A	10	30	7	4
B	5	10	4	2
C	3	15	2	2
D	4	20	3	3
E	5	25	3	3
F	6	32	3	5
G	5	8	2	1
H	5	9	4	4
合计		149		

【问题 1】（4 分）

请确定项目的关键路径

【问题 2】（3 分）

根据网络图确定项目正常完工的工期是多少天？所需的成本是多少？

【问题 3】（3 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

讨论下列事件对计划项目进度有何影响？

（1）活动 D 拖期 2 天

（2）活动 B 拖期 2 天

（3）活动 F 和 G 在规定进度之前 1 天完成

【问题 4】（7 分）

项目想提前一天完工，基于成本最优原则，可以针对哪些活动赶工？赶工后的项目成本是多少？

【问题 5】（8 分）

（1）基于项目整体成本最优原则，请列出需要赶工的活动及其工期

（2）基于以上结果，确定赶工后的项目工期及所需成本？

7、高级 2022 年下半年试题 2

某项目基本信息如表所示：

活动	紧 前 活动	计划		采取措施后	
		计划工期（天）	直接成本（元/天）	最快完工时间（天）	直接成本（元/天）
A	/	60	100	60	100
B	A	45	45	30	63
C	A	10	28	5	43
D	A	20	70	10	110
E	A	40	100	35	125
F	C	18	36	10	54.4
G	D	30	90	20	125
H	D E	15	37.5	10	57.5
I	G	25	62.5	15	91.5
J	BIFH	35	120	35	120

【问题 1】（8 分）

（1）绘制项目计划的双代号网络图。

（2）请给出项目计划工期及关键路径。

（3）请按照计划分别计算活动 A 和 B 的总时差。

【问题 2】（8 分）

项目要求 150 天完工，请写出关键路径上可压缩的活动成本变化情况。

请绘出成本最优的压缩工期的方案和总成本的变化情况。

【问题 3】（4 分）

请写出压缩工期为 150 天后的项目关键路径。

【问题 4】（5 分）

若项目不进行压缩，还按原计划进行，实施到第 80 天时，项目经理发现 ACD 活动已经完工，B 活动完成了一半。各活动的实际支出为 A 活动 6500 元，B 活动 1000 元，C 活动 280 元，D 活动 1400 元。假设项目每个活动的预算按照活动工期平均分配。请计算到第 80 天时，活动

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B 的绩效情况，并写出判断依据。

4、挣值分析、预测技术---进度、成本管理

历年考题题目举例（上午）

很简单的题目，如下题目我们不再讲解。相信大家听了基础课都会做，如果不会做，建议再听下基础课。

1、中级 09 上 51

在项目实施中间的某次周例会上，项目经理小王用下表向大家通报了目前的进度。根据这个表格，目前项目的进度（51）。

活动	计划值	完成百分比	实际成本
基础设计	20，000 元	90%	10，000 元
详细设计	50，000 元	90%	60，000 元
测试	30，000 元	100%	40，000 元

A、提前于计划 7%　　B、落后于计划 18%

C、落后于计划 7%　　D、落后于计划 7.5%

2、中级 10 下 46

下图是一项布线工程计划和实际完成的示意图，2009 年 3 月 23 日的 PV、EV、AC 分别是（46）。

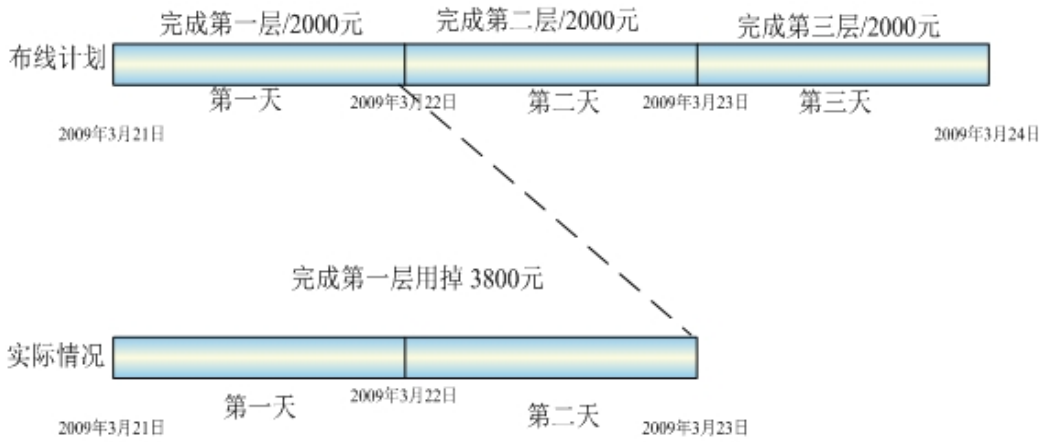

A、PV=4000 元、EV=2000 元、AC=3800 元

B、PV=4000 元、EV=3800 元、AC=2000 元

C、PV=3800 元、EV=4000 元、AC=2000 元

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、PV=3800 元、EV=3800 元、AC=2000 元

3、中级 10 下 39

甲公司生产急需 5000 个零件，承包给乙工厂进行加工，每个零件的加工费预算为 20 元，计划 2 周（每周工作 5 天）完成。甲公司负责人在开工后第 9 天早上到乙工厂检查进度，发现已完成加工 3600 个零件，支付款项 81000 元。经计算，(39)。

A、该项目的费用偏差为-18000 元　　B、该项目的进度偏差为-18000 元

C、该项目的 CPI 为 0.80　　D、该项目的 SPI 为 0.90

4、中级 10 下 46

根据以下布线计划及完成进度表，在 2010 年 6 月 2 日完工后对工程进度和费用进行预测，按此进度，完成尚需估算（ETC）为 (46)。

	计划开始时间	计划结束时间	计划费用	实际开始时间	实际结束时间	实际完成费用
1 号区域	2010 年 6 月 1 日	2010 年 6 月 1 日	10000 元	2010 年 6 月 1 日	2010 年 6 月 2 日	18000 元
2 号区域	2010 年 6 月 2 日	2010 年 6 月 2 日	10000 元			
3 号区域	2010 年 6 月 3 日	2010 年 6 月 3 日	10000 元			

A、18000 元　　B、36000 元　　C、20000 元　　D、54000 元

5、中级 11 上 43

挣值管理是一种综合了范围、时间、成本绩效测量的方法，通过与计划完成的工作量、实际挣得的收益、实际的成本进行比较，可以确定成本进度是否按计划执行。下图中标号所标示的区间依次应填写(43)。

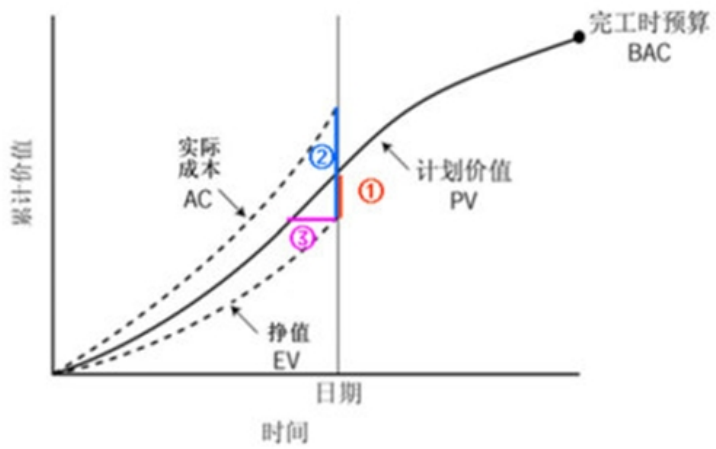

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、①进度落后②成本差CV③进度差SV

B、①成本差CV②进度差SV③进度落后时间

C、①进度差SV②成本差CV③进度落后时间

D、①进度落后②进度差SV③成本差CV

6、中级12上46

某ERP软件开发项目共有12个模块，项目经理对软件进行了成本预算，预算每个模块的开发成本有5万元，按照项目管理计划，每月开发一个模块，12月完成。在项目进行到第3个月底的时候，项目经理对照计划，发现刚完成了2个模块的开发计划，经统计，实际花费的成本为15万元，若按目前的绩效情况，到所有模块开发完成时预计花费的总成本为（46）

A、90万　　B、75万　　C、70万　　D、66.7万

7、中级12下57

如果挣值EV是300万元，实际成本AC是350万元，计划值PV是375万元。进度执行指数显示（57）。

A、仅以原始计划速率的86%进行项目

B、正在以原始计划速率的93%进行项目

C、正在以原始计划速率的107%进行项目

D、仅以原始计划速率的80%进行项目

8、中级13上36、37

在某一时刻，项目CPI为1.05，这表示（39）

A、项目100元的成本创造了105元的价值

B、项目100元的成本创造了100元的价值

C、项目进度提前了5%

D、项目进度落后了5%

9、中级13下46

某信息化建设项目的状态数据为：实际成本（AC）=44150元，计划值（PV）=40800,挣值（EV）=36610元，则成本执行（绩效）指数是（46）

A、-7540　　B、-4190　　C、0.83　　D、0.93

10、中级14上46

某项目计划安排为：2014年4月30日完成1000万元的投资任务。在当期进行项目绩效时评估结果为：完成计划投资额的90%，而CPI为50%，这时的项目实际花费为（ ）万元。

A、450　　B、900　　C、1800　　D、2000

11、中级14下48-49

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

某项目计划成本为400万元，计划工期为4年，项目进行到两年时，监理发现预算成本为200万元，实际成本为100万元，挣值为50万元，则项目成本偏差为（48）万元，项目进度偏差为（49）万元。

(48)A、150　　B、-50　　C、-150　　D、50

(49)A、150　　B、50　　C、-150　　D、-50

12、中级14下68

在项目实施期间的某次周例会上，项目经理向大家通报了项目目前的进度。根据以下表格特，目前的进度（68）。

活动	计划值	完成百分比	实际成本
基础设计	20，000	90%	10，000
详细设计	50，000	90%	60，000
测试	30，000	100%	40，000

A、提前计划7%　　B、落后计划15%　　C、落后计划7%　　D、提前计划15%

13、中级15上47

某土方工程总挖方量为4000立方米。预算单价为45元/立方米。计划用10天完成，每天400立方米。开工后第7天早晨刚上班时业主项目管理人员前去测量取得了两个数据:已完成挖方2000立方米,支付给承包单位的工程进度款累计已支付120000元。那么此时项目CPI和SPI分别为(47)

A、CPI=0.75;SPI=0.75　　B、CPI=0.83；SPI=0.83

C、CPI=0.75;SPI=0.83　　D、CPI=0.83；SPI=0.75

14、中级15下47

某项目经理2015年6月1日为止的成本执行(绩效)数据为:PV(计划值)=20000元,EV(挣值）=21000元。AC(实际成本）=22000元。则SV(进度偏差）是（47）元。

A、1000　　B、-1000　　C、2000　　D、-2000

15、中级17下52

下表给出信息化建设项目到2017年9月1日为止的成本执行（绩效）数据，基于该数据，项目经理对完工估算(EAC)进行预测,假设当前发生偏差被看作可代表未来偏差的典型偏差时,EAC为（52）元。

91过软考老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）	实际成本（AC）/元	挣值（EV）/元
1	A	100	1000.00	1000.00	1000.00
2	B	100	2000.00	2200.00	2000.00
3	C	100	5000.00	5100.00	5000.00
4	D	80	3000.00	3200.00	2400.00
5	E	60	4000.00	4500.00	2400.00
合计			15000.00	16000.00	12800.00
项目总预算（BAC）：50000.00					
报告日期：2017年9月1日					

A、45000.00　　B、50000.00　　C、53200.00　　D、62500.00

16、中级18上52

某信息化项目到2017年12月31日的成本执行(绩效)数据如下表。根据表不正确的是(52)。

活动编码	活动	PV/元	AC/元	EV/元
1	召开项目会议	2000	2000	2000
2	制定项目计划	900	1000	900
3	客户需求分析	5000	5500	5000
4	系统总体设计	10500	11500	7350
5	系统编码	20500	22500	19000
6	界面设计	5200	5250	4160
合计		44100	47750	38410
项目总预算（BAC）：167500				

A、非典型偏差时，完工估算(EAC)为176840元

B、该项目成本偏差为-9340元

C、该项目进度绩效指数为0.80

D、此项目目前成本超支，进度落后

17、中级18下52

某工程项目，完工预算为2000万元。到目前为止，由于某些特殊原因，实际支出800万元，成本绩效指数为0.8，假设后续不再发生成本偏差，则完工预算(EAC)为（52）万元。

A、2500　　B、2160　　C、2000　　D、2800

18、中级19下50

下表给出了某信息化建设项目到2019年8月1日为止的成本执行(绩效数据,如果当前的成本偏差是非典型的,则完工估算EAC为（50）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

活动编号	活动	预计完成百分比%	实际完成百分比%	活动计划值PV（元）	实际成本AC（元）
1	A	100	100	2000.00	2000.00
2	B	100	100	1600.00	1800.00
3	C	100	100	2500.00	2800.00
4	D	100	80	1500.00	1600.00
5	E	100	75	2000.00	1800.00
6	F	100	60	2500.00	2200.00
合计：				12100.00	12200.00
项目总预算(BAC)：50000.00					
报告日期：2019年8月1日					

A、59238　　B、51900　　C、50100　　D、48100

19、中级 20 下 50

某项目计划工期 60 天。当项目进行到 50 天的时候，成本绩效指数为 80%，实际成本为 180 万元，当前计划成本为 160 万元。该项目的绩效情况为（50）。

A、CPI>1，SPI>1　　B、CPI＜1，SPI＜1

C、CPI>1，SPI＜1　　D、CPI＜1，SPI>1

20、中级 21 上 50

某软件开发项目到 2021 年 3 月 1 日为止的成本绩效数据如下:根据当前的项目绩效，如果当前偏差是非典型的，项目完工估算值（EAC）是（50）。

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

活动编号	活动	完成百分比%	PV（万元）	AC（万元）	EV（万元）
1	召开启动会议	100	1	1	1
2	收集数据	100	0.9	1	0.9
3	可行性研究	100	4	4.2	4
4	撰写问题定义报告	100	0.75	0.75	1
5	制定项目计划	100	2.1	2.1	2.1
6	客户需求调研	100	6	6.5	6
7	客户需求分析	100	4.5	5.5	4.5
8	研究现有系统	100	5.2	5.7	5.2
9	撰写需求分析报告	100	0.65	0.65	0.85
10	设计界面	80	5.2	5.25	4.16
11	总体设计	70	10.5	11.5	7.35
合计			40.8	44.15	37.06
项目总预算(BAC)187.5					

A、194.6　　B、187.5　　C、190.5　　D、193.8

21、中级22上50

如果项目的成本预算是1000万，当前的实际成本是500万，挣值是450万，则该项目的成本绩效指数是（50），进度绩效指数为（50）。

A、0.9　0.45　　B、0.45　0.9　　C、0.45　0.8　　D、0.9　0.5

22、中级22上50（广东卷）

某项目进行到40天的时候，实际进度为计划的90%，实际成本为110万元，计划成本为130万元，则该项目的绩效为（50）。

A、成本节约，进度超前　　B、成本超支，进度滞后

C、成本节约，进度滞后　　D、成本超支，进度超前

23、中级22下49

下表给出了某信息化建设项目到2022年9月1日为止的成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（49）元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	2000.00	2000.00
2	B	100	1500.00	1800.00
3	C	100	2500.00	2200.00
4	D	80	1000.00	500.00
5	E	75	3000.00	2500.00

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

6	F	60	2500.00	1500.00
合计			12500.00	10500.00
项目总预算（BAC）:50000				
查看日期：2022年9月1日				

A、49950.00　　B、48000.00　　C、48050.00　　D、50050.00

24、中级22下66

某项目成本估算区间如图所示（单位:万元），则在84万元内完成项目的可能性为（66）

项目成本	低	最可能	高
估算值	50	80	92

A、84%　　B、90%　　C、95%　　D、97%

25、中级22下49（广东卷）

某项目到2022年6月30日的部分成本执行(绩效)数据如下表，据此判断该项目（49）。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	2000.00	2200.00
2	B	100	1000.00	800.00
3	C	50	800.00	300.00
4	D	100	900.00	850.00
5	E	60	1500.00	1000.00
6	F	30	3000.00	800.00

A、进度超前、成本节约　　B、进度滞后、成本节约

C、进度超前、成本超支　　D、进度滞后、成本超支

26、中级23上48

下表是某项目截止3月20日的成本执行(绩效)情况

活动编号	活动	计划值（PV）/万元	实际成本（AC）/万元	完成百分比%
1	A	8000.00	9000.00	100
2	B	5000.00	5000.00	100
3	C	3000.00	3000.00	100
4	D	4000.00	3000.00	90
5	E	3000.00	2000.00	80
合　计		23000.00	22000.00	
项目总预算(BAC)/万元：25000.00				
报告日期：2023年3月20日				

按照当前项目绩效，如果剩余工作仍按计划效率完成，则完工尚需估算(ETC)为（48）

A、2000万元　　B、2500万元　　C、3000万元　　D、4136.36万元

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

27、高级 10 上 57

项目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的工期都是三年，在第二年末其挣值分析数据如下表所示，按照趋势最早完工的应是项目（57）。

项目	预算总成本	EV	PV	AC
Ⅰ	1500	1000	1200	900
Ⅱ	1500	1300	1200	1300
Ⅲ	1500	1250	1200	1300
Ⅳ	1500	1100	1200	1200

A、Ⅰ　　B、Ⅱ　　C、Ⅲ　　D、Ⅳ

28、高 14 上 56

项目Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ的工期都是三年，在第二年末其挣值分析数据如下表所示。按此趋势，项目（56）应最早完工。

项目	项目总成本	EV	PV	AC
Ⅰ	1500	1000	1200	900
Ⅱ	1500	1300	1200	1300
Ⅲ	1500	1250	1200	1300
Ⅳ	1500	1100	1200	1200

A、Ⅰ　　B、Ⅱ　　C、Ⅲ　　D、Ⅳ

29、高 16 上 44

项目进行到某阶段时，项目经理进行绩效分析，计算出 CPI 值为 1.09，这表示（44）

A、每花费 109 元人民币，只创造相当于 100 元的价值

B、每花费 100 元人民币，可创造相当于 109 元的价值

C、项目进展到计划进度的 109%

D、项目超额支出 9%的成本

30、高 16 上 45

下表是项目甲、乙、丙三个项目的进度数据，则（45）最有可能在成本的约束内完成。

项目	PV	EV	AC
甲	15000	8000	5000
乙	15000	5000	8000
丙	15000	8000	9000

A、项目甲　　B、项目乙　　C、项目丙　　D、项目甲和项目丙

31、高 18 上 59

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

某信息系统集成项目计划6周完成，项目经理就前4周的项目进展情况进行分析和汇报情况如下，项目的成本执行指数CPI为（59）。

周	计划投入成本值（元）	实际投入成本值（元）	完成百分比
1	1,000	1,000	100%
2	3,000	2,500	100%
3	8,000	10,000	100%
4	13,000	15,000	90%
5	17,000		
6	19,000		

A、0.83　　B、0.87　　C、0.88　　D、0.95

32、高19上59

下表给出了某项目到2018年12月30日为止的部分成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（59）元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	1000.00	1000.00
2	B	100	800.00	1000.00
3	C	100	2000.00	2200.00
4	D	100	5000.00	5100.00
5	E	80	3200.00	3000.00
6	F	60	4000.00	3800.00
合计			16000.00	16100.00
项目总预算（BAC）：40000.00				
报告日期：2018年12月30日				

A、45000　　B、40100　　C、42340　　D、47059

33、高19下37

下表给出了某项目到2019年6月30日为止的成本执行（绩效）数据。如果当前的成本偏差是典型的，则完工估算（EAC）为（37）元。

活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
A	100	2200.00	2500.00
B	100	2500.00	2900.00
C	100	2500.00	2800.00
D	80	1500.00	1500.00
E	70	3000.00	2500.00
F	60	2500.00	2200.00
合计		14200.00	14400.00

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目总预算（BAC）：40000
报告日期：2019年6月30日

A、48000　　B、44000　　C、42400　　D、41200

34、高20下35

项目经理估算新开发产品的成本，最有可能情况下成本为17万元，最好情况下成本为15万元，最坏情况下成本为25万元，则该项目的预期成本为（35）万元。

A、18　　B、19　　C、20　　D、21

35、高20下37

某公司对正在进行的四个项目进行了检查，绩效数据如下表所示，则最有可能提前完成且不超支的是（37）

项目	计划价值	实际成本	挣值
A	1000	600	900
B	1000	1000	1100
C	1000	1300	1200
D	1000	900	800

A、项目A　　B、项目B　　C、项目C　　D、项目D

36、高21上37

某项目的估算成本为90万，在此基础上，公司为项目设置10万元的应急储备和10万元的管理储备，项目工期为5个月。项目进行到第三个月的时候，项目SPI为0.6，实际花费为70万元，EV为60万元。以下描述正确的是（37）

A、项目的项目总预算为110万元

B、项目的成本控制到位，进度上略有滞后

C、基于典型偏差计算，到项目完成时，实际花费的成本为100万元

D、基于非典型偏差计算，到项目完成时，实际花费成本为117万元

37、高21下34

某公司项目的绩效数据如下表所示，能提前完成且不超支的项目有（34）个。

项目	计划价值	挣值	实际成本
A	1000	1500	1200
B	2000	1700	1800
C	2500	2700	2800
D	4000	3500	3200
E	1600	1800	1500

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

38、高23上57

下表是某项目截止22年12月底各项活动的成本执行(绩效)数据。假设当前项目的成本偏差是典型的，则完工尚需估算(ETC)为(57)万元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/万元	实际成本（AC）/万元
1	a	100	1800.00	2200.00
2	b	100	1000.00	1200.00
3	c	100	1500.00	1500.00
4	d	90	4200.00	3600.00
5	e	80	3550.00	3000.00
6	f	80	3000.00	2500.00
7	g	70	1000.00	800.00
8	h	70	4400.00	3200.00
合计			20450.00	18000.00
项目总预算（BAC）:38000.00万元				

A、40000　　B、22000　　C、20900　　D、38450

39、中23下第3批

下表给出了某项目2023年1至4月的成本执行数据，其中（）适合采取“赶工”的方式来控制项目进度。

时间点	1月	2月	3月	4月
累计PV（万元）	54.7	326.5	417.5	485
累计EV（万元）	53.8	328.2	405	488.6
累计AC（万元）	55.7	327.9	399	498

A、1月　　B、4月　　C、2月　　D、3月

40、中23下第4批

某个项目的BAC为600万元。截至目前PV为280万元，AC为250万元，EV为240万元，按照当前绩效，项目的EAC为（ ）。

A、655　　B、610　　C、675　　D、625

41、高级25年第2批

某项目的完工预算（BAC）为560万元，实际成本（AC）为200万元，挣值（EV）为160万元。项目经理发现一个已识别的风险发生，需额外支出20万元。同时，团队新识别了一个高风险，预计需30万元应对，但该风险未在风险登记册中记录。如果按照当前绩效，项目经理重新计算完工估算（EAC）的值是（）。

A、630万元　　B、730万元　　C、650万元　　D、750万元

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

有点难度的题目，请大家先做，如果有疑问，可以听课。

1、中级11上44

某信息化施工项目一共要进行30天，预算总成本60万元，其中5万元为管理成本，40万元为物料使用费，其余为人工成本。按照管理计划，每5天进行一次挣值分析以评价项目绩效。在第5天绩效评价时计算得到CPI（绩效评价指数）为0.95，则说明在前5天的施工中，实际成本①预算成本；如果要使下一次绩效评价时CPI为1，且人工、物料使用成本不能改变，以免影响施工质量，则在这两次绩效评价间，每天平均可花费的管理成本为②元。上述①和②依次序应该填写(44)（假设所有成本按照天数平均分配，工程进度不存在延时或提前情况）。

A、①低于②614元　　B、①高于②614元

C、①低于②1052元　　D、①高于②1052元

2、中级16下45

某个项目的预算是3000万元，工期为5个月，现在过去了3个月，实际成本1800万元，项目进度和绩效都符合计划，而且这种情况也会持续下去，则再过3个月，项目的EV是（45）万元。

A、1800　　B、2400　　C、1200　　D、3000

3、中级21下50

某项目活动A的成本估算为1000元，总工期为10天，项目经理在施工第8天晚上查看工作进度，发现只完成了70%，成本消耗了600元。为了不影响项目整体进度，活动A需要按时完工，项目经理计划在现有成本条件下进行赶工，请计算活动A完工尚需绩效指数（TCPI）为（50）。

A、1.5　　B、0.75　　C、1.17　　D、0.8

4、高级10上58

已知某综合布线工程的挣值曲线如下图所示：总预算为1230万元，到目前为止已支出900万元，实际完成了总工作量的60%，该阶段的预算费用是850万元。按目前的状况继续发展，要完成剩余的工作还需要（58）万元。

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

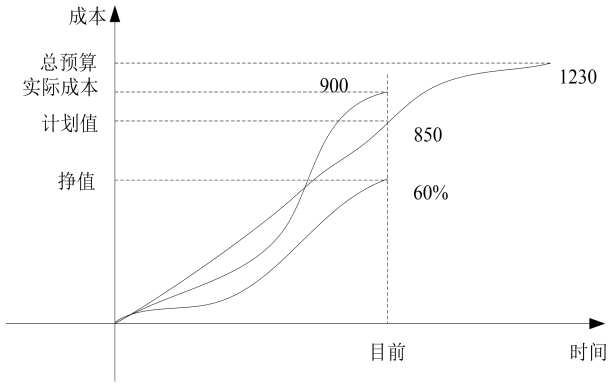

A、330　　B、492　　C、600　　D、738

5、高级 11 上 61

项目计划工期为 4 年，预算总成本为 800 万元。在项目的实施过程中，通过对成本的核算和有关成本与进度的记录得知，开工后第 2 年末实际成本发生额为 200 万元，所完成工作的计划预算成本额为 100 万元。与项目预算成本比较可知：当工期过半时，项目的计划成本发生额应该为 400 万元。此时如果不采取任何纠正措施，照此速度发展下去，那么到开工后第 4 年末项目会出现(61)万元的成本超支。

A、50　　B、100　　C、200　　D、400

6、高 14 下 56

下表是某项目执行过程中的输出表格，(43）说法是不正确的。

工作任务	预算	挣值	实际成本	成本偏差	成本偏差率	进度偏差	进度偏差率	成本 CPI	进度 SPI
1、管理计划编制	63000	58000	62500	-4500	-7%	-5000	-7.9%	0.93	0.92
2、检查表草案	64000	48000	46800	1200	2.5%	-16000	-25%	1.03	0.75
3、课题设计	23000	20000	23500	-3500	-17.5%	-3000	-13%	0.85	0.87
4、中期评估	68000	68000	72500	-4500	-6.6%	0	0	0.94	1
总计	218000	194000	205300	-11300	-6.8%	-24000	-11%	0.95	0.89

A、该表是项目执行过程中的一份绩效报告

B、该表缺少对子项目进展的预测

C、根据此表可以分析出该项目的实际成本低于预算成本

D、根据此表可以分析出该项目的实际进度落后于计划

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

7、高 14 下 58

某项目被分解成 10 项工作，每项工作的预计花费为 10 万元，工期为 10 个月，按照进度计划，前三个月应该完成其中的 3 项工作，但是到第三个月底的时候，项目实际只完成了 2 项工作，实际花费为 30 万元。项目经理采用了挣值分析的方法对该项目的绩效情况进行了分析，以下结论中，（58）是正确的。

A、根据预算，前三个月的计划成本为 30 万元，实际花费也是 30 万元，说明项目的成本控制的还不错，只是进度上有滞后

B、如果该项目按此成本效率执行下去，到整个项目完成时，实际花费的成本将超过预算 50%

C、如果该项目不采取任何措施继续执行下去，实际的完工工期将会超期 1 个月

D、该项目目前的绩效状况不理想，但只要继续采用挣值分析的方法对项目进行监控，将会有效的防止成本超支

8、高 15 上 58

假设某项目任务已进行了充分细化分解，任务安排及完成情况如下图，已获价值适用 50/50 规则（活动开始执行即获得一半价值），则下图中项目监控点的 PV、EV、BAC 分别为（）。

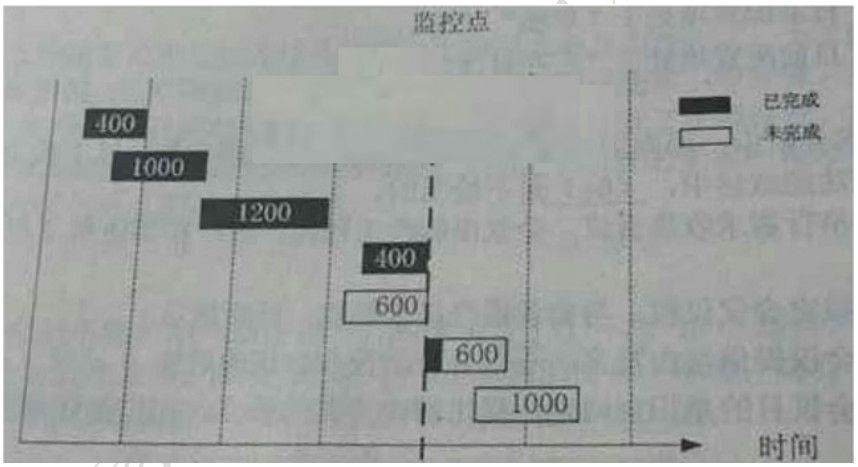

A、PV=4200 EV=3000 BAC=5200　　B、PV=4200 EV=3300 BAC=4600

C、PV=3600 EV=3300 BAC=5200　　D、PV=3600 EV=3000 BAC=4600

9、高 15 下 57-58

某项目包含 A、B、C 三项主要活动，项目经理在成本估算时采用自下而上的方法，分别估算出三项活动的成本分别为 13 万元，23 万元和 8 万元，同时为了应对未来可能遇到的不确定因素，预留了 10 万元的管理储备，同时为每个活动预留了 2 万元的准备金。该项目的总预算为（57）万元。项目进行到第二个月时，实际花费为 20 万元，完成总工作量的 30%。如果项目按照当前绩效继续进展下去，预测项目的完工尚需成本 ETC 约为（58）万元。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（57）A、44　　B、54　　C、60　　D、50

（58）A、46.7　　B、40.7　　C、45　　D、46

10、高17上70

项目经理在运行预算方案编制时，收集到的基础数据如下：工作包的成本估算为40万元；工作包的应急储备金为4万元；管理储备金为2万元。该项目的成本基准是（）万元。

A、40　　B、44　　C、42　　D、46

11、高17下58、59、60

某系统集成项目包含了三个软件模块，现在估算项目成本时，项目经理考虑到其中的模块A技术成熟，已在以前类似项目中多次使用并成功交付，所以项目经理忽略了A的开发成本，只给A预留额5万元，以防意外发生，然后估算了B的成本为50万元，C的成本为30万元，应急储备为10万元。三者集成成本为5万元，并预留了项目的10万元管理储备。如果你是项目组成员，该项目的成本基准是（58）万元，项目预算是（59）万元，项目开始执行后，当项目的进度绩效指数SPI为0.6时，项目实际花费为70万元，超出预算10万元，如果不加以纠偏，请根据当前项目进展，估算该项目的完工估算值（EAC）为（60）万元。

（58）A、90　　B、95　　C、100　　D、110

（59）A、90　　B、95　　C、100　　D、110

（60）A、64　　B、134　　C、194.4　　D、124.4

12、高21下35

某项目估算，最乐观成本105万元，利用三点估算法，按三角分布计算出的值为94万元，按β分布。计算出的值为94.5万元，则最悲观成本为（35）万元。

A、80　　B、81　　C、82　　D、83

13、高21下36

某项目按工作量平均分配到10个月完成，每月成本相同。项目管理储备15万元。在项目进行到第3个月末时，项目实际花费为BAC的30%，完成总工作量的20%，如果不加以纠偏，根据当前进度，项目完工估算为120万元，则项目总预算为（36）。

A、80　　B、85　　C、90　　D、95

14、高21下37

四个项目甲、乙、丙、丁的工期均是四年，在第一年末时，各项目进度数据如表所示，则最有可能在按时完工的同时并能更好控制成本的项目是（37）。

项目	预算	PV	EV	AC
甲	800	200	230	220

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

乙	800	200	210	200
丙	800	200	190	160
丁	800	200	200	200

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、丁

15、高 22 上 35

某软件开发项目包括 A、B、C 三项活动，目前各活动的相关数据如下（单位：万元），则该项目绩效处于（35）状态。

活动	PMB	PV	完成比	AC
A	20	20	100%	20
B	15	5	50%	6
C	7	0	0	0

A、进度提前且成本节约　　B、进度提前且成本超支

C、进度落后且成本节约　　D、进度落后且成本超支

历年考题题目举例（下午案例分析）

很简单的题目，如下题目我们不再讲解。相信大家听了基础课都会做，如果不会做，建议再听下基础课。

1、中级 2009 年下半年试题四

【说明】

某信息系统开发项目由系统集成商 A 公司承建，工期 1 年，项目总预算 20 万元。目前项目实施已进行到第 8 个月末。在项目例会上，项目经理就当前的项目进展情况进行了分析和汇报。截止第 8 个月末项目执行情况分析表如下：

序号	活动	计划成本值（元）	实际成本值（元）	完成百分比
1	项目启动	2000	2100	100%
2	可行性研究	5000	4500	100%
3	需求调研与分析	10000	12000	100%
4	设计选型	75000	86000	90%
5	集成实施	65000	60000	70%
6	测试	20000	15000	35%

【问题 1】（8 分）

请计算截止到第 8 个月末该项目的成本偏差（CV）、进度偏差（SV）、成本执行指数（CPI）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

和进度执行指数（SPI）；判断项目当前在成本和进度方面的执行情况。

【问题 2】（7 分）

请简要叙述成本控制的主要工作内容。

2、中级 2010 上半年试题 2

【说明】

某系统集成公司选定李某作为系统集成项目 A 的项目经理。李某针对 A 项目制定了 WBS，将整个项目分为 10 个任务，这 10 个任务的单项预算如下表。

序号	工作活动	预算费用（PV）（万元）	序号	工作活动	预算费用（PV）（万元）
1	任务 1	3	6	任务 6	4
2	任务 2	3.5	7	任务 7	6.4
3	任务 3	2.4	8	任务 8	3
4	任务 4	5	9	任务 9	2.5
5	任务 5	4.5	10	任务 10	1

到了第四个月月底的时候，按计划应该完成的任务是：1、2、3、4、6、7、8，但项目经理李某检查发现，实际完成的任务是：1、2、3、4、6、7，其他的工作都没有开始，此时统计出来花费的实际费用总和为 25 万元。

【问题 1】（6 分）

请计算此时项目的 PV、AC、EV（需写出计算过程）。

【问题 2】（4 分）

请计算此时项目的绩效指数 CPI 和 SPI（需写出公式）。

【问题 3】（5 分）

请分析该项目的成本、进度情况，并指出可以在哪些方面采取措施以保障项目的顺利进行。

3、中级 2011 年上半年试题 2

【说明】

某布线工程基本情况为：一层到四层，必须在低层完成后才能进行高层布线。每层工作量完全相同。项目经理根据现有人员和工作任务，预计每层需要一天完成。项目经理编制了该项目的布线进度计划，并在 3 月 18 号工作时间结束后对工作完成情况进行了绩效评估，如下表所示：

【问题 1】（5 分）

请计算 2011 年 3 月 18 日时对应的 PV、EV、AC、CPI 和 SPI。

【问题 2】（4 分）

1）根据当前绩效，在下图中划出 AC 和 EV 曲线。（2 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		2011 年 3 月 17 日	2011 年 3 月 18 日	2011 年 3 月 19 日	2011 年 3 月 20 日
计划	计划进度任务	完成第 1 层布线	完成第 2 层布线	完成第 3 层布线	完成第 4 层布线
	预算（元）	10000	10000	10000	10000
实际绩效	实际进度		完成第 1 层布线		
	实际花费（元）		8000		

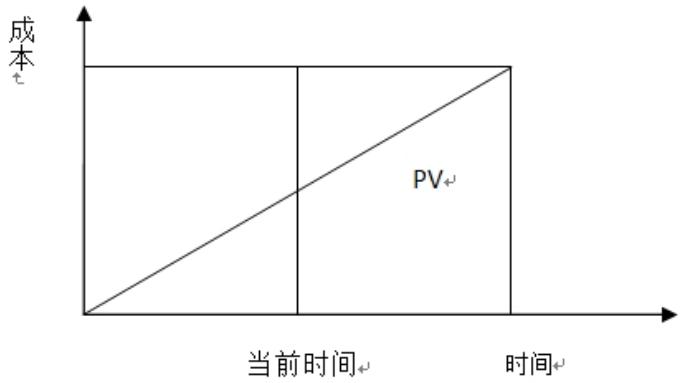

2）根据目前的绩效分析，如果想在以后的工作中改进目前绩效，请你列出具体措施：（2 分）

【问题 3】（6 分）

1）如果在 2011 年 3 月 18 日绩效评估后，找到了影响绩效的原因，并纠正了项目偏差，请计算 ETC 和 EAC，并预测此种情况下的完工日期。（3 分）

2）如果在 2011 年 3 月 18 日绩效评估后，未进行原因分析和采取相关措施，仍按目前状态开展工作，请计算 ETC 和 EAC，并预测此种情况下的完工日期。

4、中级 2012 年上半年试题 2

【说明】

某公司技术人员人力成本如表 1 所示。

	分析师	设计师	程序员	测试工程师
日均成本（元）	350	300	400	300

项目经理根据项目总体要求制定了某项目的网络资源计划图（图 1 所示，单位为日，为简化起见，不考虑节假日），并向公司申请了 2 名分析师负责需求分析，3 名设计师负责系统设计，10 名程序员负责子系统开发和集成，2 名测试工程师负责测试和发布。项目经理估算总人力成本为 27400 元。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

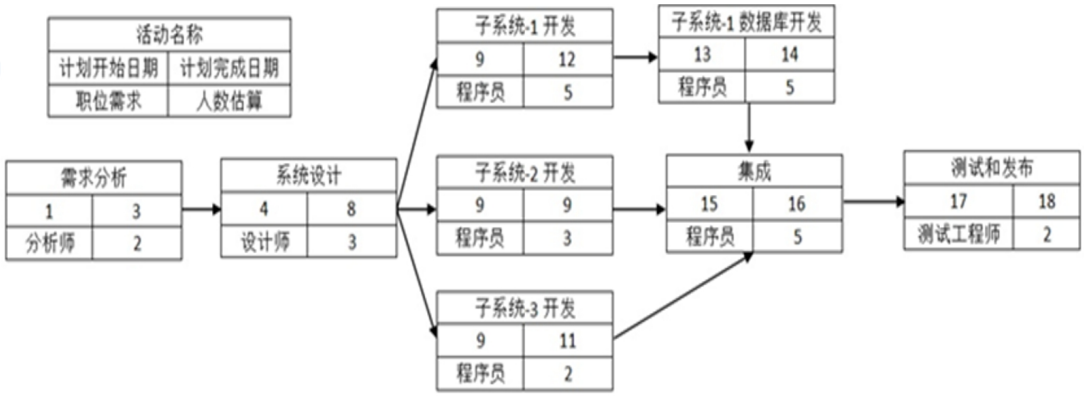

【问题 1】（4 分）

请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

【问题 2】（7 分）

第 9 日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统设计工作、子系统 1 的开发完成了四分之一，子系统 3 的工作完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本 9400 元，请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测按原计划继续执行所需要的 ETC。

【问题 3】（4 分）

假设每名项目组成员均可胜任分析、设计、开发、集成、测试和发布工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人员，此种情况下，该项目最少需要（1）人，子系统 3 的开发最晚应在第（2）日开始。

5、中级 2014 年上半年试题 4

【说明】

某系统集成公司项目经理老王在其负责的一个信息系统集成项目中采取了绩效衡量分析技术进行成本控制，该项目计划历时 10 个月，总预算 50 万元。目前项目已经实施到了第 6 个月末。为了让公司管理层了解项目进展情况，老王根据项目实施过程中的绩效测量数据编制了一份成本执行绩效统计报告，截止第 6 个月末，项目成本绩效统计数据如下表所示。

序号	工作任务单元代号	完成百分比（%）	计划成本值（万元）	实际成本值（万元）
1	W01	100%	3	2.5
2	W02	100%	5	4.5
3	W03	90%	6	6.5
4	W04	80%	8.5	6
5	W05	40%	6.5	1.5
6	W06	30%	1	1.5
7	W07	10%	7	0.5

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 1】（5 分）

请计算该项目截止到第 6 个月末的计划成本（PV）、实际成本（AC）、挣值（EV）、成本偏差（CV）、进度偏差（SV）。

【问题 2】（4 分）

请计算该项目截止到第 6 个月末的成本执行指数（CPI）和进度执行指数（SPI），并根据计算结果分析项目的成本执行情况和进度执行情况。

【问题 3】（3 分）

根据所给数据资料说明该项目表现出来的问题和可能的原因。

【问题 4】（6 分）

假设该项目现在解决了导致偏差的各种问题，后续工作可以按原计划继续实施，项目的最终完工成本是多少？

6、中级 2018 年下半年试题 3

【说明】

下表给出了某信息系统建设项目的所有活动截止到 2018 年 6 月 1 日的成本绩效数据，项目完工预算 BAC 为 30000 元。

活动名称	完成百分比（%）	PV（元）	AC（元）
1	100	1000	1000
2	100	1500	1600
3	100	3500	3000
4	100	800	1000
5	100	2300	2000
6	80	4500	4000
7	100	2200	2000
8	60	2500	1500
9	50	4200	2000
10	50	3000	1600

【问题 1】(10 分)

请计算项目当前的成本偏差 CV、进度偏差 SV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI，并指出该项目的成本和进度执行情况（CPI 和 SPI 结果保留两位小数）。

【问题 2】(3 分)

项目经理对项目偏差产生的原因进行了详细分析，预期未来还会发生类似偏差。如果项目要按期完成，请估算项目中的 ETC（结果保留一位小数）。

【问题 3】(2 分)

假如此时项目增加 10000 元的管理储备，项目完工预算 BAC 如何变化?

【问题 4】(6 分)

以下成本中，直接成本有哪三项?间接成本有哪三项?（从候选答案中选择正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内，所选答案多于三项不得分）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A.销售费用

B.项目成员的工资

C.办公室电费

D.项目成员的差旅费

E.项目所需的物料费

F.公司为员工缴纳的商业保险费

7、中级 2019 年上半年试题 2

【说明】

项目经理根据甲方要求评估了项目的工期和成本。项目进行到 20 天的时候，项目经理对项目开展情况进行了评估。得到了活动实际花费成本(如下图)，此时 A、B、C、D、F 已经完工，E 仅完成了 1/2,G 仅完成了 2/3。H 尚未开工。

工作代号	紧前工作	估算工期	赶工 1 天增加成本	计划成本（万元）	实际成本（万元）
A	-	5	2100	5	3
B	A	6	1000	4	7
C	A	8	2000	7	5
D	B、C	7	1800	8	3
E	C	2	1000	2	3
F	C	2	1200	1	1
G	F	3	1300	3	1
H	D、E、G	3	1600	4	0
I	H	5	1500	5	0

【问题 1】（6 分）

基于以上案例，项目经理得到的代号网络图，请将以下图补充完整。

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

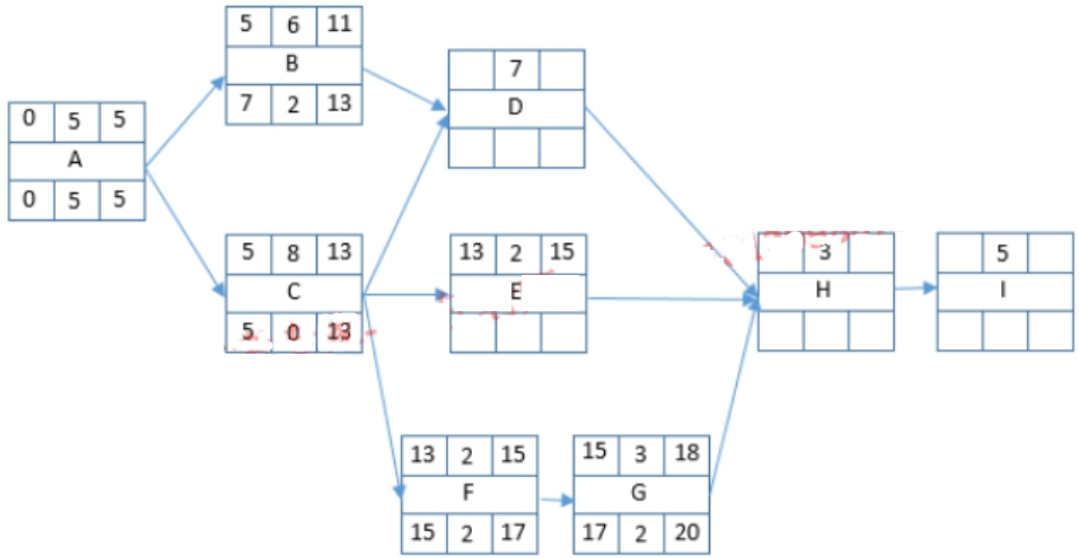

【问题 2】(5 分)

基于补充后的网络图，

(1)请推出项目的工期、关键路径和活动 E 的总时差

(2)项目经理现在想通过赶工的方式提前一天完成项目，应该压缩哪个活动最合适?为什么?

【问题 3】(6 分)

请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV 为并评价项目进度和成本绩效。

8、中级 2019 年下半年试题 2

【说明】

某公司中标了一个软件开发项目，项目经理根据以往的经验估算了开发过程中各项任务需要的工期及预算成本，如下表所示：

任务	紧前任务	工期			PV	AC
		乐观	可能	悲观		
A	/	2	5	8	500	400
B	A	3	5	13	600	650
C	A	3	3	3	300	200
D	B、C	1	1	7	200	
E	C	1	2	3	200	180
F	D、E	1	3	5	300	

到第 13 天晚上，项目经理检查了项目的进展情况和经费使用情况，发现 A、B、C 三项活动均已完工，D 任务明天可以开工、E 任务完成了一半、F 尚未开工。

【问题 1】

请采用合适的方法估算各个任务的工期、并计算项目的总工期和关键路径（5 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 2】

分别给出 C、D、E 三项活动的总时差。（3 分）

【问题 3】

请计算并分析该项目第 13 天晚上时的执行绩效情况。（7 分）

【问题 4】

针对项目目前的绩效情况，项目经理应该采取哪些措施。（5 分）

9、中级 2023 年下半年第 1 批

【说明】

某项目基本情况如下表所示：

活动	紧前活动	工期（天）	最短工期（天）	正常总费用（元）	赶工费用（元/天）
A	/	1	1	5000	/
B	A	3	2	5000	7000
C	A	7	4	11000	1000
D	B	5	3	10000	2000
E	B	8	6	8500	2000
F	CD	4	2	8500	4000
G	EF	1	1	5000	/

【问题 1】

计算项目关键路径、项目总工期，项目 BAC。

【问题 2】

计算项目第九天时的 SV 和 CV，并判断项目的绩效情况。

活动	计划活动百分比	完成百分比	实际花费
A	100%	100%	33000
B	100%	100%	
C	100%	100%	
D	100%	90%	
E	50%	60%	

【问题 3】

如果采取纠正措施，项目的 EAC 是多少？

【问题 4】

结合案例，在项目计划阶段，如果项目想提前 2 天完工，请回答问题

1)在保证总费用最低的条件下，请问首先压缩哪个活动?为什么?

2)在 1)基础上，给出提前 2 天完工的整体压缩方案，并计算压缩后的项目总费用

10、中级 2023 年下半年第 3 批

【说明】

某信息系统工程项目由 ABCDEFG 七个任务构成，对各项任务进行了历时估算并排序，到 15 天结束时，ABC 已经完成，D 明天开始，E 完成了任务的一半，F 和 G 还没开始，如下图:

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

活动	紧前活动	工期	PV	AC
A	-	4	600	650
B	A	8	700	500
C	A	6	400	400
D	BC	3	300	
E	C	3	400	250
F	D	4		
G	EF	5		

【问题 1】(4 分)

请问项目的工期和关键路径?

【问题 2】(8 分)

计算第 15 天结束时，项目的绩效情况?

【问题 3】(3 分)

活动 C、D 的总浮动时间，活动 E 的自由浮动时间?

【问题 4】(4 分)

根据当前绩效指出需要采取的措施?

11、中级 2023 年下半年第 4 批

【说明】

活动	A	B	C	D	E	F	G
紧前活动	/	/	B	AC	/	E	DF
工期（天）	3	2	3	3	4	5	2
人数（个）	2	3	2	5	4	3	4
预算（万元）	8	7	8	10	12	12	9

项目实施到第 9 天结束时，项目已花费成本 50 万元，此时 ABCE 均已完工，DF 各完成 75%，G 尚未开工。

【问题 1】

（1）根据项目信息，将时标网络图补充完整。

（2）根据时标图，写出该项目的关键路径、工期和 D 活动的总时差和自由时差

【问题 2】

该项目最高峰时需要（1）人，为了减少项目人数，项目经理可以采取（2）的方法，则该项目总人数可以降为（3）人，调整的方法是（4）。

（2）的备选项:A、资源平衡　　B、资源平滑

【问题 3】

请计算 PV、EV、AC、CV、SV，并判断项目的绩效情况

12、中级 2023 年下半年第 5 批

【说明】

某工程项目活动的基本信息如下表所示：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

序号	活动名称	紧前活动	工期（月）	预算（万元）
1	A	-	1	20
2	B	A	2	40
3	C	A	5	30
4	D	B	1	40
5	E	C.D	1	80
6	F	E	2	30
7	G	D	4	20
8	H	F.G	3	40
9	I	F	1	30
10	J	H.I	2	40

【问题 1】(5 分)

结合案例，请写出项目关键路径，并计算项目的总工期。

【问题 2】(7 分)

假设活动 G 的最乐观工期为 1 个月，最悲观工期为 7 个月，最可能工期为 4 个月。请计算活动 G 的标准差，以及活动 G 在 5 个月内完工的概率并写出原因。

【问题 3】(8 分)

假设预算按各活动的工期平均分配，项目执行到第九个月结束时，项目的实际已发生金额为 280 万元，活动 ABCDEG 已经完工，活动 F 完成了 2/3，活动 HIJ 尚未开工。请计算项目的进度偏差和成本偏差，并判断项目此时的执行绩效。

13、中级 2023 年下半年第 6 批

【说明】

如下表：

任务	PV	AC	完成百分比
A	100	90	80%
B	70	65	100%
C	90	85	90%
D	80	75	90%
E	50	50	100%

【问题 1】（10 分）

请从进度和成本两方面评价此项目在实施半年后的执行绩效?

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 2】（6 分）

针对项目目前的绩效情况，项目经理宜采用什么措施?

【问题 3】（2 分）

假设项目后续不再发生成本偏差，请计算项目的 EAC。

14、高级 2023 年下半年第 3 批

【说明】

项目有 ABCDEF6 个活动，各活动的关系如下表

活动	紧前	β 分布（乐观、最可能、悲观）工期（天）
A	-	（1、2、3）
B	A	（1、3、5）
C	B	（0.8、2.8、6）
D	A	（5、7、9）
E	CD	（1、2、3）
F	E	（2、4、6）

【问题 1】

根据给出的乐观、悲观、和工期，用 β 算法算出各活动工期

【问题 2】

请算出关键路径和总工期

【问题 3】

①如果活动 C 延迟 1 天，关键路径和工期有什么变化？

②如果活动 C 延迟 2 天，关键路径和工期有什么变化？

【问题 4】

如果每天每个活动的花费是 2 万元，当项目进行到第 9 天末，总成本花费是 32 万元，此时 A、B、C、D 活动均完成，E 活动完成一半，求项目 CV、SV，说明项目的绩效

【问题 5】

如果此时项目的偏差为临时性偏差，求项目 EAC

15、高级 2024 年第 2 批

某项目计划工期为 10 个月，预算 210 万元，第 7 个月结束时，项目经理进行了绩效评估发现实际完成了总计划进度的 70%，项目的实际数据，如表所示:

月份	PV（万元）	AC（万元）
1	30	35
2	50	55
3	70	80
4	90	95
5	110	120
6	130	140

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

7	150	145
8	170	
9	190	
10	210	

【问题 1】

根据项目数据表，可以确定(1)月份的实际花费最低，仅为(2)万元。

【问题 2】

计算项目第 7 个月底时的 EV、CV、SV 值

【问题 3】

评估项目第 7 个月底时的绩效，并给出改进措施

【问题 4】

如果在第 7 个月结束时，找到了影响绩效的原因并纠正了项目偏差，请计算 ETC 和 EAC，并预测此种情况下项目完成时间较原计划提前?落后?不变?

有点难度的题目，请大家先做，如果有疑问，可以听课。

1、中级 2012 年下半年试题 3

某项目 6 个月的预算如下表所示。表中按照月份和活动给出了相应的 PV 值，当项目进行到 3 月底时，项目经理组织相关人员对项目进行了绩效考评，考评结果是完成计划进度的 90%。单位：元

活动	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	活动 PV	活动 EV
编制计划	4000	4000					8000	①
需求调研		6000	6000				12000	
概要设计			4000	4000			8000	②
数据库设计				8000	4000		12000	
详细设计					8000	2000	10000	
。。。。。。								
。。。。。。								
月度 PV	4000	10000	10000	12000	12000			
月度 AC	4000	11000	11000					

注:（表中活动之间的关系为 F-S 关系，即前一个活动结束，后一个活动才能开始）

【问题 1】（7 分）

请计算 3 月底时项目的 SPI、CPI、CV、SV、值，以及表中 1、2 处的值（注：表中 1 处代表“编制计划”活动的 EV 的值，表中 2 处代表“概要设计”活动的 EV 值）。

【问题 2】（7 分）

（1）如果项目按照当前的绩效继续进行，请预测项目的 ETC（完成时尚需估算）和 EAC（完成时估算）。

（2）请评价项目前 3 月的进度和成本绩效并提出调整措施。

【问题 3】（6 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

假设项目按照当前的绩效进行直至项目结束，请在下图中画出从项目开始直到结束时的 EV 和 AC 的曲线，并在图中用相应的线段表明项目完成时间与计划时间的差(用“t”标注)、计划成本与实际成本的差（用“c”标注）。

2、中级 2014 年下半年试题 1

下表是某项目的工程数据，根据各个问题中给出的要求和说明，完成问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内

活动	紧后活动	工期/周
A	C E	5
B	C F	1
C	D	3
D	G H	4
E	G	5
F	H	2
G	--	3
H	--	5

【问题 1】（4 分）

请指出该项目的关键路径，并计算该项目完成至少需要多少周？假设现在由于外部条件的限制，E 活动结束 3 周后 G 活动才能开始；F 活动开始 5 周后 H 活动才可以开始，那么项目需要多长时间才能完成？

【问题 2】（5 分）

分别计算在没有外部条件限制和问题 1 中涉及的外部条件的限制下，活动 B 和 G 的总时差和自由时差。

【问题 3】（6 分）

假设项目预算为 280 万元，项目的所有活动经费按照活动每周平均分布，并与具体的项目无关，则项目的第一周预算是多少？项目按照约束条件执行到第 10 周结束时，项目共花费 200 万元，共完成了 A、B、C、E、F 5 项活动，请计算此时项目的 PV、EV、CPI 和 SPI。

3、中级 2016 年下半年试题 1

【说明】

下图给出了一个信息系统项目的进度计划网络图（含活动历时）

马军老师，购课店铺：xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

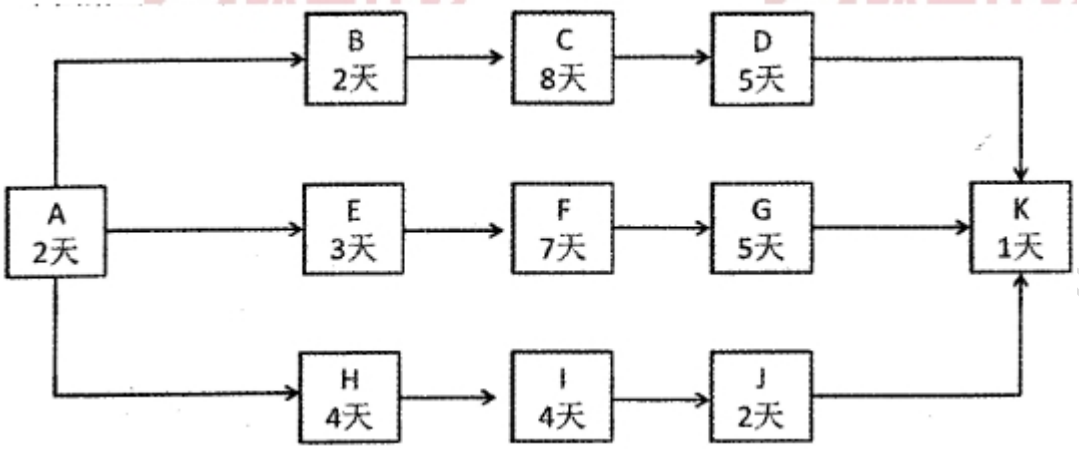

下表给出了该项目各项活动的历时和成本估算值

活动名称	活动历时（单位:天）	成本估算值（单位：元）
A	2	1000
B	2	2000
C	8	4000
D	5	3000
E	3	3000
F	7	4000
G	5	5000
H	4	2000
I	4	3000
J	2	2000
K	1	1000

【问题 1】（5 分）

（1）请指出该项目的关键路径。

（2）请计算该项目的总工期。

（3）请计算活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间。

【问题 2】（3 分）

假设该项目无应急储备，管理储备为 10000 元，计算该项目的完工预算 BAC 和总预算。

【问题 3】（6 分）

按照项目进度计划，第 12 天结束时应完成活动 C、F、J，实际情况为：C 完成了 75%；F 完成了 100%；J 完成了 50%；实际花费 25000 元。请计算该时点的计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI 和进度绩效指数 SPI。

【问题 4】（6 分）

在项目第 12 天结束时，项目经理对项目滞后的原因进行了分析，找出了滞后原因 M（由于 M 造成的偏差是非典型的）

（1）假设 M 在以后的项目实施过程中不会再发生，请计算完工估算 EAC。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）假设 M 在以后的项目实施过程中一直存在，请计算完工估算 EAC。

4、中级 2020 年下半年试题 2

【说明】

以下是某项目的挣值图，图中 A、B、C、D 对应的数值分别是 600，570，500，450。

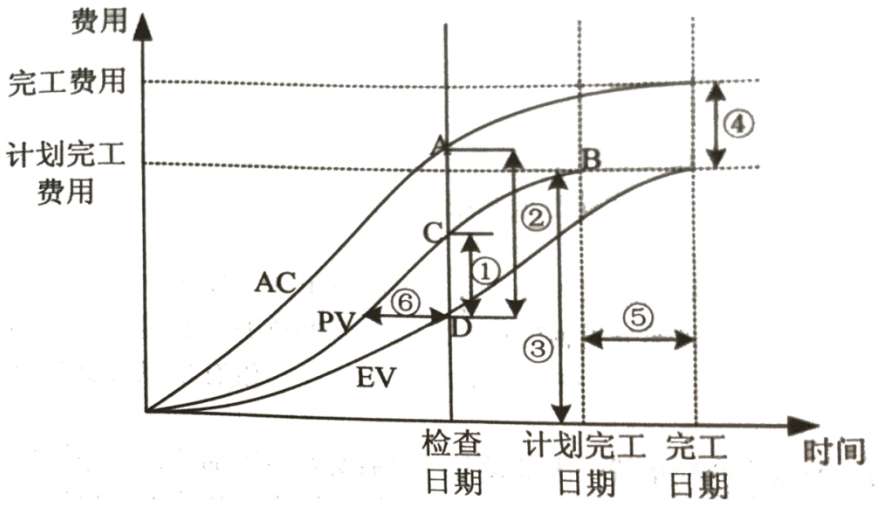

【问题 1】（6 分）

结合案例，请将图中的编号①~⑥填写在答题纸的对应栏内。

【问题 2】（6 分）

结合案例，请计算项目在检查日期时的成本偏差（CV）和进度偏差（SV）并判断当时的执行绩效。

【问题 3】（4 分）

结合案例，针对问题 2 的分析结果，项目经理应该采取哪些措施?

【问题 4】（4 分）

结合案例，如果项目在检查日期时的偏差是典型偏差，请计算项目的完工估算成本（EAC）。

5、中级 2021 年上半年试题 2

【说明】

赵工担任某软件公司的项目经理,于 2020 年 5 月底向公司提交项目报告。该项目各任务是严格的串行关系,合同金额 3.3 亿元,总预算为 3 亿元。

赵工的项目报告描述如下:5月底财务执行状况很好,只花了6000万元。进度方面,已完成A、B 任务,尽管 C 任务还没有完成,但项目团队会努力赶工,使工作重回正轨。

按照公司的要求,赵工同时提交了项目各任务实际花费的数据(见下表）

任务	预计完成日期	预算费用（万元）	实际费用（万元）
A	2020 年 3 月底	1400	1500

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B	2020 年 4 月底	1600	2000
C	2020 年 5 月底	3000	2500
D	2020 年 8 月底	9000	
E	2020 年 10 月底	7600	
F	2020 年 12 月底	6000	
G	2021 年 1 月底	600	
H	2021 年 2 月底	800	
合计		30000	

【问题 1】(6 分)

请计算出目前项目的 PV，EV，AC(采用 50/50 规则计算挣值即工作开始记作完成 50%，工作完成记作完成 100%)

【问题 2】(8 分)

(1)请计算该项目的 CV、SV、CPI、SPI。

(2)基于以上结果请判断项目当前的执行状况。

【问题 3】(4 分)

(1)按照项目目前的绩效情况发展下去请计算该项目的 EAC

(2)基于以上结果请计算项目最终的盈亏情况。

【问题 4】(4 分)

针对项目目前的情况项目经理应该采取哪些措施?

6、中级 2021 年下半年试题 2

【说明】

某公司拟建设一个门户平台，根据工作内容，该平台项目分为需求调研、系统实施、系统测试、数据准备（培训）、上线试运行、验收六个子任务，各子任务预算和三点估算工期如下表所示。

子任务预算及估算工期表

子任务	预算（万元）	三点估算工期（周）		
		最悲观	最可能	最乐观
需求调研	1.8	0.5	1	1.5
系统实施	35.2	4	7	16
系统测试	2.4	1	2	3
数据准备(培训)	2.7	1	1	1
上线试运行	3.6	2	3	10
验收	2.7	1	1	1
合计	48.4			

到第 6 周周末时，对项目进行了检查，发现需求调研已经结束，共计花费 1.8 万元，系统实施的工作完成了一半，已花费 17 万元。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 1】（5 分）

（1）请采用三点估算法估算各个子任务的工期

（2）请分别计算系统实施和系统测试两个任务的标准差。

【问题 2】（9 分）

该项目开发过程中采用瀑布模型，请评估项目到第六周周末时的执行绩效。

【问题 3】（4 分）

如果项目从第 7 周开始不会再发生类似的偏差，请计算此项目的完工估算 EAC 和完工偏差 VAC。

【问题 4】（2 分）

为了提升项目的执行绩效，项目组成员提出采取并行施工的方法加快进度，请指出采取该方式的缺点。

7、中级 2022 年上半年试题 2

【说明】

某项目共有 9 个活动（A-I），总预算 BAC 为 102 万元。该项目活动关系、工期和截止到第 4 周周末的相关项目数据如下表所示：

项目数据表

活动编号	紧前活动	活动工期（周）	PV（万元）	EV（万元）	AC（万元）
A	/	3	6	6	4
B	/	2	5	5	4
C	/	4	10	7	6
D	A	7	5	2	3
E	B	2	4	3	3
F	B	6	4	8	10
G	C	8	0	0	0
H	D、E	8	0	0	0
I	F、G	7	0	0	0

【问题 1】（7 分）

结合案例：

（1）请绘制项目的双代号网络图。

（2）请确定项目的关键路径及工期。

【问题 2】（4 分）

请计算活动 E 的自由浮动时间和总浮动时间。

【问题 3】（6 分）

请判断项目在第 4 周周末时的进度与成本绩效，并说明原因。

【问题 4】（2 分）

项目经理认为目前项目出现进度的问题是暂时情况，后期项目会重新回到正轨，请帮助项目经理重新估算项目的总成本。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

8、中级 2022 年上半年试题 2（广东卷）

【说明】

事件 1：某项目的甘特图如图所示，项目经理预测了各活动工期缩短一天增加的费用（其中，A 活动完成 B，C，D 活动才能开始，B，C，D 活动均完成 E，F 才能开始，费用单位：万元，时间单位：天）

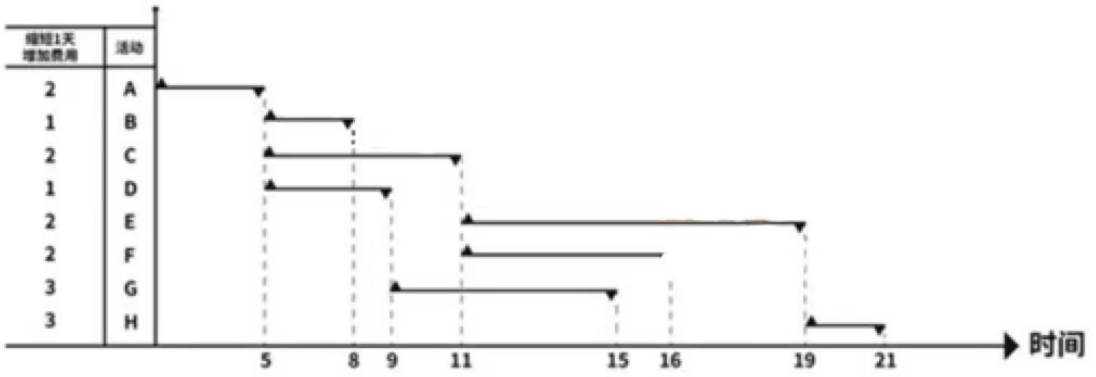

事件 2：项目到第 12 天结束时，项目经理统计了各活动完成情况，如表所示。

活动	完成百分比	12 天结束时 PV	12 天结束时 AC
A	100%	10	8
B	100%	6	6
C	100%	12	10
D	100%	8	10
E	10%	2	2
F	20%	2	4
G	40%	6	8
H	0	0	0

【问题 1】（2 分）

结合案例，确定项目的关键路径。

【问题 2】（4 分）

不考虑间接费用和人力资源，项目经理想通过赶工的方式提前一天并成本最低地完成项目，他应该压缩哪些活动的工期?请给出选择依据。

【问题 3】（8 分）

（1）如果活动 B 拖延 4 天，项目工期会拖延几天?请说明理由。

（2）基于（1），项目的关键路径是否发生变化?请说明理由。

【问题 4】（7 分）

请根据案例中的项目的表格，计算项目第 12 天结束时的成本偏差和进度偏差，并判断项目的执行绩效。

9、中级 2022 年下半年试题 2

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【说明】

某项目的网络资源计划如图所示，已知每位工程师的日均成本为 400 元 / 天。

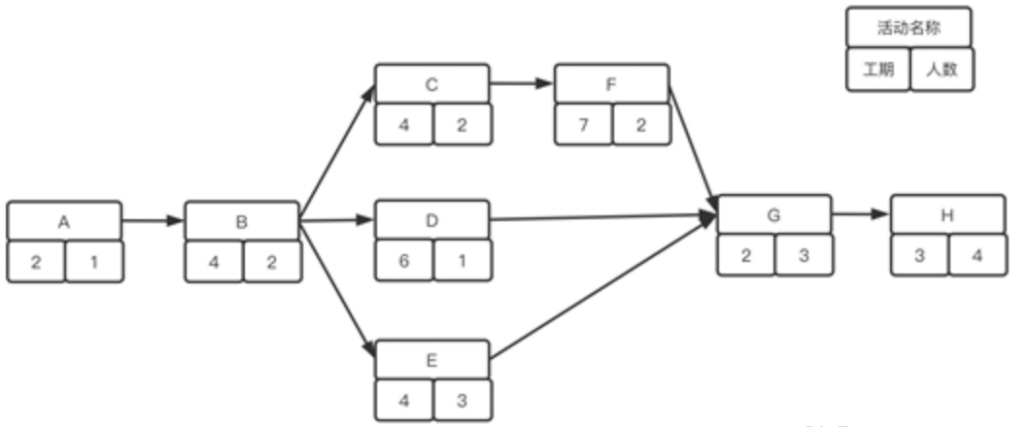

【问题 1】（5 分）

请计算项目的工期及关键路径，并说明活动 E 最晚应在哪天开始，依据是什么？

【问题 2】（8 分）

第 9 日工作结束时，项目组已完成 ABC 三项工作，D 工作完成了三分之一，E 工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为 9800 元。

（1）请给出项目此时的挣值

（2）计算此时项目的 SV 和 CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效

【问题 3】（9 分）

假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划，画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人？

10、中级 2022 年下半年试题 2（广东卷）

【说明】

下表是一个软件项目在编码阶段各活动的计划和实际完成情况（工作量，单位：人天，假设工作量成本：1 万元/人天）。

活动		A	B	C	D	E	F	G	H
计划工作量	第1周	30	—	—	—	—	—	—	—
	第2周	—	30	40	—	—	—	—	—
	第3周	—	—	—	70	40	—	—	—
	第4周	—	—	—	—	—	80	—	—
	第5周	—	—	—	—	—	—	40	70
实际工作量	第1周	40	—	—	—	—	—	—	—
	第2周	—	30	—	—	—	—	—	—
	第3周	—	—	50	60	30	—	—	—
	第4周	—	—	—	—	—	—	30	—
	第5周	—	—	—	—		100	—	80

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 1】（9 分）

为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据（PV/EV/AC 值保留整数，SPI/CPI 保留 2 位小数，单位：万元）

完成时间	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
PV	30	100	210		400
EV	30		210		400
AC	40	70			
SPI	1	0.6			1
CPI	0.75	0.86		1.04	0.95

【问题 2】（4 分）

请说明第 4 周时项目的绩效情况，并说明理由。

【问题 3】（3 分）

第 4 周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险：

（1）快速跟进

（2）减小活动范围或降低活动要求

（3）改进方法或技术

【问题 4】（5 分）

第 4 周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段，项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少？（结果保留整数）

11、高级 2013 年下半年试题 1

【说明】

一个信息系统集成项目有 A、B、C、D、E、F 共 6 个活动，目前是第 12 周末，活动信息如下：

活动 A：持续时间 5 周，预算 30 万元，没有前置活动，实际成本 35.5 万元，已完成 100%。

活动 B：持续时间 5 周，预算 70 万元，前置活动为 A，实际成本 83 万元，已完成 100%。

活动 C：持续时间 8 周，预算 60 万元，前置活动为 B，实际成本 17.5 万元，已完成 20%。

活动 D：持续时间 7 周，预算 135 万元，前置活动为 A，实际成本 159 万元，已完成 100%。

活动 E：持续时间 3 周，预算 30 万元，前置活动为 D，实际成本 0 万元，已完成 0%。

活动 F：持续时间 7 周，预算 70 万元，前置活动为 C 和 E，实际成本 0 万元，已完成 0%。

项目在开始投入资金为 220 万元，第 10 周获得投入资金 75 万元，第 15 周获得投入资金 105 万元，第 20 周获得投入资金 35 万元。

【问题 1】

请计算当前的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及进度绩效指数（SPI）和成本绩效指数（CPI），并分析项目的进展情况

【问题 2】

分别按照非典型偏差和典型偏差的计算方式，计算项目在第13周末的完工尚需成本（ETC）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

和完工估算成本（EAC）

【问题 3】

在不影响项目完工时间的前提下，同时考虑资金平衡的要求，在第13周开始应该如何调整项目进度计划？

12、高级 2014 年下半年试题 1

【说明】

某项目由 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共 10 个工作包组成，项目计划执行时间为 5 个月。在项目执行到第 3 个月末的时候，公司对项目进行了检查，检查结果如下表所示（假设项目工作量在计划期内均匀分布）。

检查结果表

工作包	预算（万元）	预算按月分配（万元）					实际完成（%）
		第一个月	第二个月	第三个月	第四个月	第五个月	
A	12	6	6				100
B	8	2	3	3			100
C	20		6	10	4		100
D	10		6		4		75
E	3	2	1				75
F	40			20	15	5	50
G	3					3	50
H	3				2	1	50
I	2				1	1	25
J	4				2	2	25

【问题 1】（4 分）

计算到目前为止，项目的 PV、EV 分别为多少？

【问题 2】（11 分）

假设该项目到目前为止已支付 80 万元，请计算项目的 CPI 和 SPI，并指出项目整体的成本和进度执行情况以及项目中哪些工作包落后于计划进度，哪些工作包超前于计划进度？

【问题 3】（10 分）

如果项目的当前状态代表了项目未来的执行情况，预测项目未来的结束时间和总成本。并针对项目目前的状况，提出相应的应对措施。

13、高级 2015 年上半年试题 1

【说明】

某信息系统工程项目由 ABCDEFG 七个任务构成，项目组根据不同任务特点，人员情况等，对各项任务进行了历时估算并排序，并给出了进度计划，如下图：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

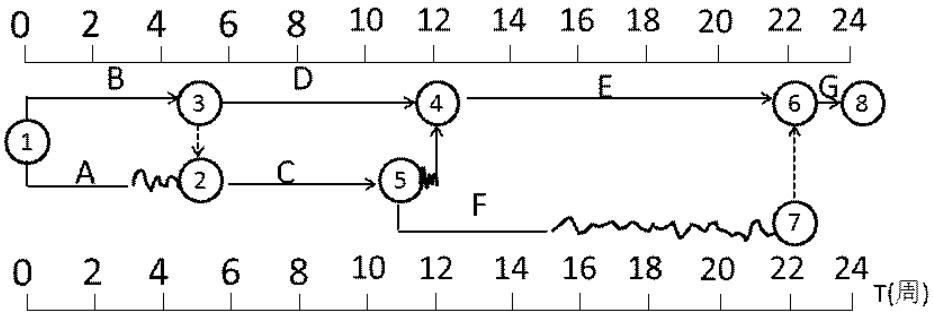

项目中各项任务的预算（方框中，单位是万元）、从财务部获取的监控点处各项目任务的实际费用（括号中，单位为万元），及各任务在监控点时的完成情况如下图：

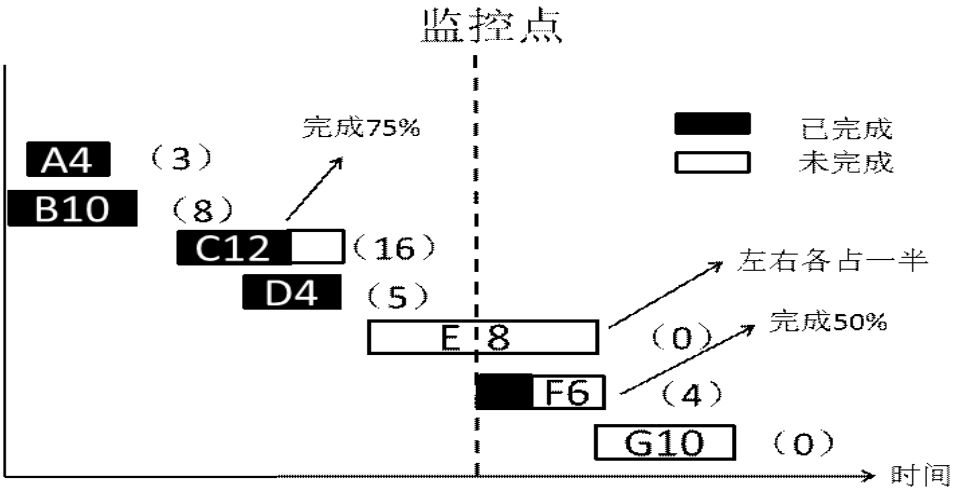

【问题 1】（10 分）

（1）请指出该项目的关键路径、工期？

（2）本例给出的进度计划图叫什么图？还有哪几种图可以表示进度计划？

（3）请计算任务 A、D 和 F 的总时差和自由时差？

（4）若任务 C 拖延 1 周，对项目的进度有无影响？为什么？

【问题 2】（7 分）

计算监控点时刻对应的 PV、EV、AC、CV、SV、CPI 和 SPI。

【问题 3】（4 分）

请分析监控点时刻对应的项目绩效，并指出绩效改进的措施。

【问题 4】（4 分）

（1）请计算该项目的总预算。

（2）若在监控点时刻对项目进行了绩效评估后，找到了影响绩效的原因并予以纠正，请预测此种情况下项目的 ETC、EAC。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、高级 2015 年下半年试题 2

【说明】

已知某信息工程项目由 ABCDEGHI 八个活动构成，项目工期要求为 100 天。项目组根据初步历时估算、各活动间逻辑关系得出的初步进度计划网络图如下图所示（箭线下方为活动历时）。

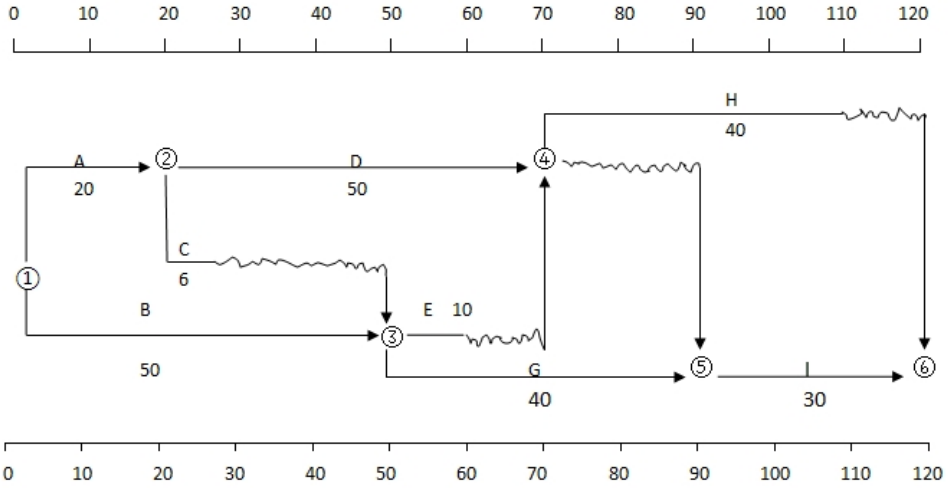

【问题 1】(7 分)

(1) 请给出该项目初步进度计划的关键路径和工期。

(2) 该项目进度计划需要压缩多少天才能满足工期要求？可能需要压缩的活动都有哪些？

(3)若项目组将 B 和 H 均压缩至 30 天，是否可满足工期要求？压缩后项目的关键路径有多少条？关键路径上的活动是什么？

【问题 2】(9 分)

项目组根据工期要求，资源情况及预算进行了工期优化，即将活动 B 压缩至 30 天、D 压缩至 40 天，并形成了最终进度计划网络图；给出的项目所需资源数量与资源费率如下：

活动	资源	费率（元/人天）	活动	资源	费率（元/人天）
A	1 人	180	E	1 人	180
B	2 人	220	G	2 人	200
C	1 人	150	H	2 人	100
D	2 人	240	I	2 人	150

按最终进度计划执行到第 40 天晚对项目进行监测时发现，活动 D 完成一半，活动 E 准备第二天开始，活动 G 完成了 1/4；此时累计支付的实际成本为 40000 元，请在下表中填写此时该项目的绩效信息。

活动	PV	EV
A		
B		
C		

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D		
E		
G		
H		
I		
合计		

【问题 3】(6 分)

请计算第 40 天晚时项目的 CV、SV、CPI、SPI(给出计算公式和计算结果，结果保留 2 位小数)，评价当前项目绩效，并给出改进措施。

【问题 4】(3 分)

项目组发现问题后及时进行了纠正，对项目的后续执行没有影响，请预测项目完工尚需成本 ETC 和完工估算 EAC(给出计算公式和计算结果)

15、高级 2016 年下半年试题 1

【说明】

已知某信息工程由 A、B、C、D、E、F、G、H 八个活动构成，项目的活动历时，活动所需人数、费用及活动逻辑关系如下表所示

活动	历时（单位：天）	所需人数	费用（单位：元/人天）	紧前活动
A	3	3	100	-
B	2	1	200	A
C	8	4	400	A
D	4	3	100	B
E	10	2	200	C
F	7	1	200	C
G	8	3	300	D
H	5	4	200	E、F、G

【问题 1】（4 分）

请给出该项目的关键路径和工期

【问题 2】（12 分）

第 14 天晚的监控数据显示活动 E、G 均完成一半，F 尚未开始，项目实际成本支出为 12000 元。

（1）请计算此时项目的计划值（PV）和挣值（EV）

（2）请判断此时项目的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），以及成本和进度执行情况

【问题 3】（3 分）

若后续不作调整，项目工期是否有影响？为什么？

【问题 4】（6 分）

（1）请给出总预算（BAC）、完工尚需估算（ETC）和完工估算（EAC）的值。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（2）请预测是否会超出总预算(BAC)？完工偏差（VAC）是多少？

16、高级 2017 年上半年试题 1

【说明】

某项目工期为 6 个月，该项目的项目经理在第 3 个月末对项目进行了中期检查，检查结果表明完成了计划进度的 90%，相关情况见下表（单位：万元），表中活动之间存在 F-S 关系。

序号	活动	第 1 月	第 2 月	第 3 月	第 4 月	第 5 月	第 6 月	PV 值
1	编制计划	4	4					8
2	需求调研		6	6				12
3	概要设计			4	4			8
4	数据设计				8	4		12
5	详细设计					8	2	10
	月度 PV	4	10	10	12	12	2	
	月度 AC	4	11	11				

【问题 1】（8 分）

计算中期检查时项目的 CPI、CV 和 SV，以及“概要设计”活动的 EV 和 SPI。

【问题 2】（4 分）

如果按照当前的绩效，计算项目的 ETC 和 EAC。

【问题 3】（8 分）

请对该项目目前的进展情况作出评价。如果公司规定，在项目中期评审中，项目的进度绩效指标和成本绩效指标在计划值的正负 10%即为正常，则该项目是否需要采取纠正措施？如需要，请说明可采取哪些纠正措施进行成本控制；如不需要，请说明理由。

【问题 4】（5 分）

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

（1）应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，并已经制定应急或减轻措施的已识别风险。（）

（2）管理储备主要应对项目的“已知—未知”风险，是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算。（）

（3）管理储备是项目成本基准的有机组成部分，不需要高层管理者审批就可以使用。（）

（4）成本基准就是项目的总预算，不需要按照项目工作分解结构和项目生命周期进行分解。（）

（5）成本管理过程及其使用的工具和技术会因应用领域的不同而变化，一般在项目生命期定义过程中对此进行选择。（）

17、高级 2017 年下半年试题 2

【说明】

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

某信息系统项目包含 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 十个活动，各活动的历时、成本估算值、活动逻辑关系如下表所示：

活动名称	活动历时（天）	成本估算值（元）	紧前活动
A	2	2000	——
B	4	3000	A
C	6	5000	B
D	4	3000	A
E	3	2000	D
F	2	2000	A
G	2	2000	F
H	3	3000	E、G
I	2	2000	C、H
J	3	3000	I

【问题 1】（10 分）

（1）请计算活动 H、G 的总浮动时间和自由浮动时间。

（2）请指出该项目的关键路径。

（3）请计算该项目的总工期。

【问题 2】（10 分）

项目经理在第 9 天结束时对项目进度进行统计，发现活动 C 完成了 50%，活动 E 完成了 50%，活动 G 完成了 100%，请判断该项目工期是否会受到影响？为什么？

【问题 3】（10 分）

结合问题 2，项目经理在第 9 天结束时对项目成本进行了估算，发现活动 B 的实际花费比预估多了 1000 元，活动 D 的实际花费比预估少了 500 元，活动 C 的实际花费为 2000 元，活动 E 的实际花费为 1000 元，其他活动的实际花费与预估一致。

请计算该项目的完工预算 BAC、PV、EV、AC、CPI、SPI。

【问题 4】（3 分）

项目经理对项目进度、成本与计划不一致的原因进行了详细分析，并制定了改进措施。假设该项目改进措施是有效的，能确保项目后续过程中不会再发生类似问题，请计算该项目完工估算 EAC。

18、高级 2018 年下半年试题 2

【说明】

某信息系统项目包含如下 10 个活动，各活动的历时、活动逻辑关系如下表所示

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	
B	5	A
C	2	B,D

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D	6	A
E	3	C,G
F	3	A
G	4	F
H	4	E
I	5	E
J	3	H,I

【问题 1】（9 分）

（1）请给出该项目的关键路线路径和总工期

（2）请给出活动 E,G 的总浮动时间和自由浮动时间

【问题 2】（5 分）

在项目开始前，客户希望将项目工期压缩为 19 天，并愿意承担所发生的所有额外费用，经过对各项活动的测算发现，只有活动 B、D、I 有可能缩短工期，其余活动均无法缩短工期，活动 B、D、I 最多可以缩短的天数以及额外费用如下

活动名称	最多可以缩短的天数	每缩短一天需要增加的额外费用
B	2	2000
D	3	2500
I	3	3000

在此要求下，请给出费用最少的工期压缩方案及额外增加的费用

【问题 3】（4 分）

请将下面的（1）~（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内

项目活动之间的依赖关系分为四种

（1）是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系

（2）是基于具体应用领域的最佳实践或者基于项目的某种特殊性质而设定，即还有其他顺序可以选用，但项目团队仍却按照此种特殊的顺序安排活动

（3）是项目活动与非项目活动之间的依赖关系

（4）是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

【问题 4】（9 分）

假设该项目的总预算为 20 万元，其中包含 2 万元管理储备和 2 万元应急储备，当项目进行到某一天时，项目实际完成的工作量仅为应完成工作的 60%，此时的 PV 为 12 万元，实际花费为 10 万元。

（1）请计算该项目的 BAC

（2）请计算当前时点的 EV、CV、SV

（3）在当前绩效情况下，请计算该项目的完工尚需估算 ETC

19、高级 2019 年上半年试题 2

【说明】

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

某公司承接了一个软件外包项目，项目内容包括 A、B 两个模块的开发测试。项目经理创建了项目的 WBS(见下表)，估算了资源、工期,项目人力资源成本是 1000 元/人天。

活动	人数安排	预计完成工作量（人天）
模块 A 开发	8	48
模块 A 单元测试	1	4
模块 A 修复	8	8
模块 A 回归测试	1	3
模块 B 开发	8	80
模块 B 单元测试	1	3
模块 B 修复	10	10
模块 B 回归测试	1	2
A、B 接口调试	1	2
A、B 联调	2	4

【问题 1】7 分

根据目前 WBS 安排，请计算项目的最短工期，并绘制对应的时标网络图。

【问题 2】10 分

项目开展 11 天后，阶段评审发现:模块 A 的修复工作完成了一半，回归测试工作还没有开始,模块 B 开发工作已经结束，准备进入单元测试。此时，项目已经花费了 18 万的人力资源成本。

(1)请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV,并评价项目目前的进度和成本绩效。

(2)按照当前绩效继续进行，请预测项目 ETC。

【问题 3】6 分

基于问题二，针对项目目前的绩效，项目经理应采取哪种措施保证项目按时完工?

20、高级 2019 年下半年试题 2

【说明】

某公司完成一个工期 10 周的系统集成项目，该项目包含 ABCDE 五项任务，项目经理制定了成本预算表（如表 1），执行过程中记录了每个时段项目的执行情况，如表 2、表 3，

表 1 成本预算表（单位：万元）

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	15	5							
B		10	20	20						
C				5	5	25	5			
D					5	15	10	10		
E								5	20	25
合计	10	25	25	25	10	40	15	15	20	25

表 2 实际成本发生表（单位：万元）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	10	14	10							
B		10	14	20						
C				5	5	10				
D					5	8				
E										
合计	10	24	24	25	10	18	0	0	0	0

表 3 任务完成百分比

任务	1 周	2 周	3 周	4 周	5 周	6 周	7 周	8 周	9 周	10 周
A	30%	50%	100%							
B		20%	50%	100%						
C				5%	10%	40%				
D					10%	20%				
E										
合计										

【问题 1】（5 分）

项目执行到了第 6 周，请填写如下的项目 EV 表，将答案填写在答题纸对应栏内。

【问题 2】（14 分）

（1）经过分析，任务 C 的成本偏差是非典型的，而 D 的偏差是典型的。针对目前的情况，请计算项目完工时的成本估算值（EAC）

（2）判断项目目前的绩效情况

【问题 3】（6 分）

针对项目目前的进度绩效，请写出项目经理可选的措施。

21、高级 2020 年下半年试题 2

【说明】

某软件开发项目包括 ABCD 四个活动，项目总预算为 52000 元。截至 6 月 30 日，各活动相关信息如下表所示。

活动	成本预算	计划成本	实际进度	实际成本
A	25000	25000	100%	25500
B	12000	9000	50%	5400
C	10000	5800	50%	1100
D	5000	0	0	0

C 活动是项目中的一项关键任务，目前刚刚开始，项目经理希望该任务能在 24 天之内完成，项目组一致决定采取快速跟进的方法加快项目进度，并估算 C 活动的预计工期为乐观 14 天、最可能 20 天、悲观 32 天。

【问题 1】（13 分）

结合案例，请计算截至 6 月 30 日各活动的挣值和项目的进度偏差（SV）和成本偏差（CV），

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

并判断项目的执行绩效。

【问题 2】（3 分）

项目组决定采用快速跟进的方式加快进度，请简述该方式的不足。

【问题 3】（4 分）

如果当前项目偏差属于典型偏差，请计算完工估算成本（EAC）。

【问题 4】（5 分）

项目经理尝试采用资源优化技术 24 天完成 C 活动的目标，请计算能达到项目经理预期目标的概率。

22、高级 2021 年下半年试题 2

【说明】

某项目的任务计划表如表 1 所示，资金计划和资金使用情况表如表 2。

表 1 任务计划表

序号	包	任务	紧前任务	人数	计划工期(月)	计划任务完成率					
						1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1		4	2	50%	50%				
2		任务 2	任务 1	2	1			100%			
3	包 B	任务 3	任务 2	1	1				100%		
4		任务 4		4	2	50%	50%				
5		任务 5	任务 1、4	3	3			40%	40%	20%	
6	包 C	任务 6	任务 3	2	2					60%	40%
7		任务 7	任务 3	2	2					50%	50%
8	包 D	任务 8	任务 1、4	2	3			40%	30%	30%	
9		任务 9	任务 5、8	1	1						100%

表 2 资金计划和资金使用情况表（单位：万元）

时间（月）	总预算计划执行	总预算实际执行	财政资金预算计划执行	财政资金预算实际执行	自筹资金预算计划执行	自筹资金预算实际执行
1 月	400	200	200	0	200	200
2 月	700	700	300	100	400	600
3 月	1100	1700	100	100	1000	1600
4 月	2700	3800	600	1000	2100	2800
5 月	2300	1400	400	400	1900	1000
6 月	1800	1400	500	500	1300	900
累计	9000	9200	2100	2100	6900	7100

项目完成后得到任务完成情况月报表如表 3 所示：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

表 3 任务完成情况表

序号	包	任务	计划工期(月)	实际任务完成率					
				1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
1	包 A	任务 1	2	60%	40%				
2		任务 2	1			100%			
3	包 B	任务 3	1						
4		任务 4	2	50%	50%				
5		任务 5	3			30%	40%	30%	
6	包 C	任务 6	2					50%	50%
7		任务 7	2					70%	30%
8	包 D	任务 8	3			40%	50%	10%	
9		任务 9	1						100%
实际任务完成率：某任务当月实际完成量与该任务全部工作量的比值									

【问题 1】（4 分）

请根据项目任务计划表，绘制项目的单代号网络图。

【问题 2】（7 分）

（1）项目参与人员均可胜任任意一项任务，请计算项目每月需要的人数，并估算最少需要多少人?

（2）项目经理希望采用资源平滑的方法减少项目人员，请问该方法是否可行?为什么?

【问题 3】（5 分）

项目第 1 个月月底时，项目经理考察项目的执行情况，请计算此时项目的 PV、EV、AC?

【问题 4】（9 分）

项目第 2 个月月底时，上级部门考核财政资金使用情况，请给出项目此时的执行情况。

23、高级 2022 年上半年试题 2

【说明】

已知某公司承担一个旅游信息监管系统的开发，整个项目划分为四个阶段九项活动，项目相关信息如表所示：

	活动名称	工期/天（乐观，可能、悲观）	紧前活动	人数/人	总预算/万元
需求分析	A 任务下达	（1、4、7）		6	0.6
	B 需求分析	（12、14、22）	A	15	6.3
设计研发	C 总体设计	（13、14、21）	B	13	10.4
	D 初样实现	（8、9、16）	C	17	24.7
	E 正样研制	（10、17、18）	D	18	10.2
系统测试	F 密码测评	（6、7、8）	E	9	5.1
	G 软件测试	（5、8、11）	E	12	10.6
	H 用户试用	（9、16、17）	FG	20	15.7
项目收尾	I 收尾	（3、5、7）	H	10	3

【问题 1】（12 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

结合案例:

（1）每个活动的乐观、可能和悲观成本服从β分布，请计算每个活动的成本，并绘制项目的时标网络图。

（2）如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，请指出项目实施需要的最少人数。

【问题 2】（3 分）

请确定项目的关键路径，工期。

【问题 3】（6 分）

项目进展到第 70 天时，项目已完成总工作量的 3/4，花费 60 万元，请计算此时项目的 PV、EV、SV 和 CV 值（假设项目每项活动的日工作量相同，计算结果精确到整数）。

【问题 4】（4 分）

请指出当前项目绩效情况，并说明项目经理应该采取哪些措施?

24、中级 2023 年上半年试题 2

【说明】

某工程项目部分信息如下表所示。

活动	紧前活动	正常工作		赶工	
		时间（天）	每天人工费用（元）	时间（天）	每天人工费用（元）
A	/	10	40	6	75
B	/	8	40	8	40
C	A、B	6	35	4	60
D	B	16	60	12	85
E	C	24	5	24	5
F	D、E	4	10	2	25
G	F	4	15	2	35
H	F	10	30	8	40
I	F	4	30	3	45
J	G	12	25	8	40
K	H、I、J	16	50	12	72
L	C	8	40	6	60
M	L	24	5	24	5
N	K、M	4	10	4	10

【问题 1】(5 分)

结合案例:

(1)请写出项目关键路径，并计算项目工期。

(2)如果活动 L 工期拖延 10 天，对整个工期是否有影响，请说明原因。

【问题 2】(8 分)

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

假设项目总成本为 100 万，按进度计划平均分摊到项目活动中，工程执行到第 40 天结束，项目经理发现已经完成了 3/5 的工作量，花费的成本为 65 万元。请计算项目的成本绩效和进度绩效，并说明项目此时的绩效情况。

【问题 3】(7 分)

若要求该项工程在 70 天内完工，为保证工程能在 70 天内完成，且人工费用最低，请按照案例表格提供的时间和费用信息，写出哪些活动需要赶工并计算赶工后增加的总人工费用。

25、高级 2023 年上半年试题 2

【说明】

以下是某项目的基本信息：

活动	紧前活动	工期（天）	所需人数（人）
A	/	3	6
B	/	4	9
C	/	2	12
D	A	4	7
E	B	2	2
F	C	3	9
G	C	4	7
H	D	3	5
I	EF	6	8
J	G	7	4
K	HI	5	6

【问题 1】(10 分)

结合案例：

(1)请画出该项目的双代号网络图

(2)计算该项目的关键路径和工期

【问题 2】(5 分)

根据项目经理的预测，H 活动是项目组面临的一个新问题，一旦延期将会影响到整个项目的工期，这种说法对吗?为什么?如果不对，其延期几天会影响整个项目的工期?

【问题 3】(7 分)

项目的费用主要取决于项目中的人力资源成本(500 元/人天)，项目中各活动为紧前活动完成后立即开始。运行到第十天时项目经理对项目进展情况进行了统计。其中 ABCDEFG 均已完工，HK 尚未开工，IJ 各完成了 50%，项目已花费成本 100000 元，请计算项目此时的进度偏差和成本偏差，并说明项目的执行绩效。

【问题 4】(3 分)

在当前绩效情况下，请写出项目经理应该采取的措施。

大家好：有学员朋友建议还是按考试时间来汇总计算题，我们自 2025 年题目开始，对计

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

算题采用按考试时间整理了。

5、2025 年计算题

1、25 年第 1 批

某项目的活动持续时间及逻辑关系如下图所示，该项目总工期是（）天。

活动	持续时间（天）	紧前活动
A	2	-
B	3	A
C	4	A
D	2	B
E	5	B
F	3	C
G	1	DE
H	4	FG

A、16　　B、14　　C、13　　D、15

2、25 年第 2 批

某项目活动 A 的最乐观时间为 9 天，最悲观时间为 21 天，最可能时间为 12 天，客户希望提前 2 天完成该活动。项目经理使用三点估算法计算了该活动的期望持续时间，如果完成的概率符合正态分布，则该活动的期望持续时间和提前 2 天完成概率是（）。

A、11 天　16%　　B、13 天 16%　　C、11 天　32%　　D、13 天 32%

3、2025 年第 1 批案例分析

某医疗大数据公司基于机器学习技术正在研发糖尿病风险预测系统，由 10 名开发人员组成的项目团队，需在六个月内完成全流程开发，并推进项目商业落地项目活动，关键信息如下表：

活动	描述	紧前活动	工期（周）	所需人员数量
A	需求分析	-	2	3
B	健康算法开发	A	8	5
C	界面原型设计	A	4	2
D	服务器搭建	A	3	4
E	数据安全模块开发	D	5	3
F	系统集成测试	B、C、E	3	6

在模型训练方面，项目需要依赖第三方供应商提供的健康数据集，其质量直接决定预测模型。在早期识别糖尿病风险的有效性，在预算紧缩与开发周期限定的双重挑战下，供需双方展开策略博弈：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A：供应商侧：提供 S1（高价+高质量数据）或 S2（低价+标准数据）两种方案，

B：项目团队：需要选择 T1（接受高价+联合风险担保）或 T2（拒绝高价+自担延期风险）作为应对机制。

结合案例回答下列问题

【问题 1】

（1）请参照活动 A 的单代号表示法，给出活动 C 的最迟开始时间、总浮动时间和最迟完成时间以及活动 F 的最早开始时间和最早完成时间

0	2	2
A		
0	0	2

（2）计算项目关键路径及总工期。

【问题 2】

假设每名开发人员能力相同，项目所有活动均可承担，在确保总工期不受影响的情况下，请完成如下人员安排计划表

序号	活动	周	需要人员数量
1	活动 A	第 1 至 2 周	3
2	活动 B	(1)	5
3	活动 C	(2)	2
4	活动 D	(3)	4
5	活动 E	(4)	3
6	活动 F	(5)	6

【问题 3】

供应商与项目团队赢得矩阵如下所示，请给出双方最优策略及均衡结果（单位：万元）。

项目团队 / 供应商	T1	T2
S1	（4，0.5）	（-2,1）
S2	（1.5,0.8）	（2,1）

表格中 X1，X2 指供应商收益，X 指项目团队收益。例如（4,0.5）表示，当供应商采取 S1 策略，项目团队采取 T1 应对策略时，供应商获得 4 万收益，项目团队获得 0.5 万元收益

4、2025 年第 2 批案例分析

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

信息系统项目包含6个活动，如下表所示：

活动	紧前活动
A	-
B	A
C	A
D	A
E	B,C
F	D,E

各活动单日费用需0.5万元，这6个活动由6个小组完成，每个小组只能承担一个活动。由于活动性质及每个小组的技术水平不同，他们完成各项活动所需的总费用及时间也不同。各组完成各项活动的总费用（单位：万元）如表所示：

	A	B	C	D	E	F
1组	7	12	13	9	11	10
2组	3	11	13	6	6	9
3组	5	13	12	8	8	6
4组	3	13	11	5	11	10
5组	6	14	14	8	6	7
6组	3	11	14	5	8	6

为了确保项目能够以最小总费用完成，需要合理安排负责各活动的小组。

【问题1】

请画出项目的单代号网络图。

【问题2】

请使用运筹学中的指派问题方法，确定总费用最小的小组指派方案，并计算最小总费用。

【问题3】

根据最小总费用指派方案，计算各活动完成时间，给出关键路径，并计算项目总完成时间。

6、2026年计算题

1、26年第2批

某项目BAC为100万元，当前AC=50万元，EV=40万元。如果预期项目剩余部分的CPI不变，（）万元;如果未来工作将按计划速度完成，EAC=（）万元。

A、125　100　　B、110　125　　C、125　110　　D、110　100

2、26年第2批

某信息系统项目包含A、B、C、D、E、F、G、H、I、J十个活动。各活动的历时、活动逻辑关系如下表所示。该项目的总预算为200万元，其中包含20万元管理储备和20万元应急储备，当项目进行到某一天时，项目实际完成的工作量仅为截止当前计划完成工作量的60%，此

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

时PV为120万元，实际花费为100万元。则项目总工期是（ ）天。假设以当前CPI完成剩余工作，BAC和EAC分别是（ ）万元和（ ）万元。

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	-
B	4	A
C	4	A
D	2	A
E	6	B、C
F	2	D
G	3	E、F
H	3	G
I	2	G
J	3	H、I

A、21　180　250　　B、20　160　250
C、21　160　222　　D、20　180　222

3、2026年第1批案例分析

某大型科技公司承接了“智慧政务云平台”二期建设项目，合同金额1200万元，工期18个月。项目经理张某负责该项目的整体管理。在项目执行中期，随着人工智能大模型技术的引入，系统架构复杂度显著增加，安全与稳定性面临严峻挑战。

项目组识别出三个主要的安全风险：

风险1：数据泄露风险，发生概率50%，预计造成成本损失40万元；

风险2：服务中断风险（如DDoS攻击），发生概率30%，预计造成成本损失60万元；

风险3：核心算法被篡改风险，发生概率20%，预计造成成本损失20万元。

针对上述风险，公司制定了两种应对方案：

方案A：投入预防成本15万元，实施全面的安全加固，可将所有风险的影响成本降低50%，但风险发生概率保持不变；

方案B：不投入预防成本（0万元），但需预留20万元应急储备金。项目周期内，除原有3项安全风险之外，还有15%的概率会发生严重联合故障，一旦发生严重联合故障，需要额外支付20万元应急费用。

此外，项目团队还需建立安全度量体系，并应对AI系统带来的新型情景风险。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 1】(7 分)

请从风险管理的角度，结合本项目背景，提出具体的风险管理方案或措施。

【问题 2】(6 分)

设计 2 个安全类度量的指标，指标定义、计算方式及用途。

【问题 3】(4 分)

应对 AI 系统带来的情景问题的处理办法。

【问题 4】(8 分)

请计算：

(1)不采取任何应对方案时，项目面临的 3 个安全风险的总期望成本;

(2)方案 A、方案 B 的 EMV;

(3)判断应优选哪套方案。

4、2026 年第 2 批案例分析

A 公司承接了某城市应急管理局的智慧应急指挥平台建设项目，计划工期 20 个月。项目旨在构建于多模态大语言模型的城市级应急指挥系统，实现自然灾害、公共安全事件、公共卫生事件的 AI 智能预警、智能研判和智能调度。在项目进行过程中，项目团队采取了如下策略:

策略 1：项目经理制定了项目管理计划，包括进度管理计划，成本管理计划，质量管理计划，风险管理计划等。

策略 2：项目团队实时跟踪 AI 技术趋势，关注公众对 AI 应急的认知变化，跟踪掌握中央及地方政策动向。

策略 3：项目经理与项目团队一起分析自然灾害、公共安全事件、公共卫生事件对项目的影响及相互依赖关系。

策略 4：面对数据获取困难问题，项目团队设计了轻量化数据接口原型验证技术方案，同时与大数据局进行谈判争取数据开放。

策略 5：项目初期，项目团队与高校合作开发数字孪生仿真平台，模拟数种极端灾害情景，通过蒙特卡洛量化应急系统失效导致的后果。

策略 6：在数据工程平台建设阶段，因发现历史数据投毒，增加了数据清洗和数据溯源功能，但也导致该阶段的工期延期。

策略 7：在多模态 AI 模型训练阶段，为追赶进度，技术团队采用“简化版模型”临时方案。

策略 8：项目执行过程中，项目经理实时监控 SPI/CPI 指标，并根据 SPI/CPI 指标，对项目进行调整，确保项目能顺利交付。

策略 9：项目经理定期盘点已用储备资金并测算剩余需求，建立审批机制确保储备使用与目标一致。

截至第 12 个月末，项目的执行情况如下：

活动	计划成本	工期	实际完成情况
A	300	2	按计划完成，实际支出 350 万元
B	700	3	按计划完成，实际支出 650 万元
C	2000	4	延期 1 个月完成，实际支出 2200 万元

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D	3200	8	完成活动进度的 30%，实际支出 1400 万元
E	1800	2	尚未开始，提前支出 200 万元进行技术预研
F	1000	1	尚未开始

【问题 1】（9 分）

结合案例，补充以下表格

	是否促进不确定性绩效域的预期目标实现	可帮助实现哪些不确定性绩效域的绩效目标
策略 1	否	-
策略 2	（1）	（2）
策略 3	（3）	（4）
策略 4	是	积极识别、分析和应对不确定性
策略 5	（5）	（6）
策略 6	（7）	（8）
策略 7	（9）	（10）
策略 8	（11）	（12）
策略 9	（13）	（14）

【问题 2】（9 分）

请计算第 12 个月末项目的成本偏差和进度偏差（或成本绩效指数和进度绩效指数，结果保留 2 位小数），并判断项目绩效情况。

【问题 3】填空题（7 分）

项目试运行期间，为了应对网络攻击等风险，项目经理依据项目风险管理过程，执行（1）过程，将风险相关信息记录到（2）；再执行（3）过程，评估数据泄露概率和损失影响程度，将所有已识别的优先级列表和结论记录在（4）中；基于分析结果，执行（5）过程，把“确定启用管理储备进行系统重建”策略补充更新至（6）中；全程执行（7）过程，监控残余风险和新出现的风险；事件结束后，更新相关的项目文件。

马军老师，网课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第七章 信息化发展

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 1 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

“新型基础设施”主要包括信息技术设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面。其中信息基础设施包括（1）。

①通信基础设施 ②智能交通基础设施 ③新技术基础设施 ④科教基础设施 ⑤算力基础设施

A、①③⑤ B、①④⑤ C、②③④ D、②③⑤

2、2023 年 5 月第 2 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

数据价值化是指以（2）为起点，经历数据资产化，数据资本化的阶段，实现数据价值化的过程。

A、数据智能化 B、数据资源化 C、数据安全性 D、数据产业化

3、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下关于数字产业化的说法中，错误的是（）。

A、数字产业化是指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动，包括电子信息制造业、电信业、软件、信息技术、互联网行业等

B、数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分

C、从整体构成上看，数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四个部分。

D、产业数字化发展重点包括：（1）云计算（2）大数据（3）物联网（4）工业互联网（5）区块链（6）人工智能（7）虚拟现实和增强现实

4、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下说法中，错误的是（）。

A、边际决策：基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。

B、多元融合：强调社会关系和社会活动的动态性及其融合的高效性等，实现服务可编排和快速集成，从而满足各项社会发展的创新需求

C、数字孪生：围绕现实世界与信息世界的互动融合进行能力构建，包括社会孪生、城市孪生和设备孪生等，将推动城市空间摆脱物理约束，进入数字空间。

D、数据治理：围绕对社会状态的本质反映及模拟预测等进行能力构建，洞察可变因素与不可见因素对社会发展的影响，从而提升生活质量。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下关于数字化转型的说法，错误的是（）。

A、常见数字化转型的驱动因素主要包括：（1）新技术的强势发展（2）低“交互成本”运作（3）业务运行的透明化（4）个性化需求的满足

B、数字化转型组织架构及工作机制的建议可分为 4 个层次：（1）规划层（2）实施层（3）能力层（4）资源层

C、通过计算智能化完成物理对象到信息空间的映射

D、数字化转型基本原理揭示了个体智慧由“自然人”个体，转移到组织智慧（计算机、信息系统等掌握的）的必要性和重要性。

6、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于车联网的说法中，错误的是（）。

A、车联网（loV）系统是一个“端、管、云”三层体系。

B、管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体。

C、车与云平台间的通信是指车辆通过卫星无线通信或移动蜂窝等无线通信技术实现与车联网服务平台的信息传输，接收平台下达的控制指令，实时共享车辆数据

D、云系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备 loV 寻址和网络可信标识等能力的设备。

7、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下说法中，错误的是（）。

A、“一网通办”是依托于一体化在线政务服务平台，通过规范网上办事标准，优化网上办事流程，搭建统一的互联网政务服务总门户，整合政府服务数据资源和完善配套制度等措施，推行政务服务事项网上办理，推动企业群众办事线上只登录一次即可全网通办。

B、“跨省通办”是申请人在办理地之外的省市提出事项申请或在本地提出办理其他省市事项申请，办理模式通常可分为全程网办、代收代办和多地联办等。

C、“一网统管”通常从城市治理突出问题出发，以城市事件为牵引，统筹管理网格，统一城市运行事项清单，构建多级城市运行“一网统管”应用体系，推动城市管理、应急指挥、综合执法等领域的“一网统管”,实现城市运行态势感知、体征指标监测、统一事件受理、智能调度指挥、联动协同处置、监督评价考核等全流程监管。

D、一网指通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。

8、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

以下关于产业数字化的典型特征、说法错误的是（）。

A、以数字科技变革生产工具　　B、以数据资源为关键生产要素

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、以信息网络为市场配置纽带　　D、以云平台为产业生态载体

9、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

《智能制造能力成熟度模型》规定了企业智能制造能力在不同阶段应达到的水平。（）应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享。

A、二级（规范级）　　B、三级（集成级）　　C、四级（优化级）　　D、五级（引领级）

10、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下，以（）为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。

A、数据　　B、资源　　C、信息　　D、技术

11、2023 年 11 月第 4 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

车联网系统是一个“端、管、云”三层体系。其中（）解决互联互通问题，（）是多源海量信息的汇聚。

A、云系统 端系统　　B、端系统 云系统　　C、端系统 管系统　　D、管系统 云系统

12、2024 年 5 月第 1 批

数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种（）为目标的高层次转型。

A、组织模式　　B、评估模式　　C、技术模式　　D、业务模式

13、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，主要在技术、产品、()、产业四个方面进行融合。

A、软件　　B、网络　　C、硬件　　D、业务

14、2024 年 5 月第 1 批

新型基础设施建设是以新发展理念为引领，以()为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要的基础设施体系。

A、区块链　　B、人工智能　　C、技术创新　　D、工业互联网

15、2024 年 5 月第 2 批

《“十四五”国家信息规划》中提出了打造协同高效的数字政府体系，深入推进“放管服”改革，加快政府职能转变，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持整体集约建设数字政府，推动政务业务协同，（）深化推进，“一网通办”、“跨省通办”、“一网统管”，畅通参与政策制定的渠道，推动国家行政体系更加完善、政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，推动有效市场和有为政府更好结合，打造服务型政府。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、加快政务数据开放共享和开发利用

B、加快政务数据资产使用便捷性

C、加快推动政务数据的价值提升和变现

D、严格管控政务数据的质量和使用范围

16、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于信息系统生命周期的描述，不正确的是（）。

A、信息系统的产生、建设、运行、维护、完善构成一个循环的过程，并有一定的规律可循

B、信息系统建设和维护随着各种环境变化，需要不断维护和修改，必要时可由新系统替代

C、信息系统的生命周期可简化为系统规划、系统分析、系统设计、系统运行和维护等阶段

D、信息系统建设周期长、投资大、用户习惯难以改变，定制化开发后无法进行重建和升级

17、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于车联网网络连接范畴。

A、车内设备之间进行用于对设备状态实时监测的信息数据传输

B、人通过运营商移动网络与车辆之间进行用于控制车辆的信息沟通

C、通过无线通信技术实现与服务平台的信息传输

D、人与人之间在车上通过运营商的移动网络进行通话与短信沟通。

18、2025 年 5 月第 1 批

某连锁咖啡店通过数据发现“午后咖啡”销量骤降，自动触发“第二杯半价”优惠券推送。基于组织能力数字化转型及持续迭代参考模型(CPSD 模型)，该案例属于（）。

A、信息物理世界　　B、数据框架与信息调制

C、决策能力边际化　　D、科学社会物理赛博机制

19、2025 年 5 月第 1 批

2024 年 12 月，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部在充分调研的基础上，组织编制了《国家数据基础设施建设指引》，其中，数据流通利用设施是国家数据基础设施的重要组成部分，包括（）。

①可信数据空间 ②数场 ③数据元件④长距无损网络⑤智算⑥数联网⑦区块链网络⑧隐私保护计算平台

A、①②③④⑤⑥　　B、①②③⑥⑦⑧　　C、①②③⑤⑥⑧　　D、①②④⑥⑦⑧

20、2025 年 5 月第 1 批

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2025 年中央一号文件对进一步深化农村改革的各项任务作出全面部署。“推进农业科技力量协同攻关”的相关措施不包括（）。

A、强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业

B、发挥农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种

C、推进“互联网+”政务服务，深化乡村智慧社区建设

D、推动农机装备高质量发展，推进老旧农机报废更新

21、2025 年 5 月第 2 批

香农将热力学中的熵引入了信息论，熵是系统（）的度量，信息是系统（）的度量。

A、传输速率　错误频率　　B、无序程度　有序程度

C、错误频率　传输速率　　D、有序程度　无序程度

22、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

数据价值化是指以（）为起点，经历（）、（）阶段，实现数据价值化的经济过程。

A、数据资产化　数据资源化　数据产业化

B、数据资源化　数据产业化　数据资本化

C、数据资本化　数据资产化　数据资源化

D、数据资源化　数据资产化　数据资本化

23、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

新型基础设施包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面，以下（）属于融合基础设施。

A、智能交通基础设施　　B、科教基础设施

C、算力基础设施　　D、人工智能基础设施

24、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

智慧转移的 S8D 模型是基于 DIKW 模型构筑了“智慧一数据”“数据一智慧”两大过程。以下活动中，属于“数据一智慧”过程的是（）。

①通过智慧结构化明确了业务体系层面的内容

②通过架构可视化实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新

③通过孪生虚拟化完成物理对象到信息空间的映射

④通过知识模型化定义业务活动的逻辑关系

⑤通过数据平台化实现了数据的采集、存储和共享等

⑥通过计算智能化实现多元条件下的调度和决策

A、②③⑥　　B、④⑤⑥　　C、①④⑤　　D、①②③

25、2025 年 5 月第 2 批

关于新质生产力相关的描述，不正确的是（）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、新质生产力发展面临的主要安全挑战是数据泄露与网络攻击风险

B、新质生产力能够在全球协作体系中实现价值最大化

C、新质生产力的核心驱动力是信息、知识和创新技术

D、新质生产力主要依赖传统物质资源要素创造价值

26、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

根据《智能制造能力成熟度模型》，（ ）实现跨业务活动间的数据共享。

A、二级(集成级)　　B、三级(优化级)　　C、四级(规范级)　　D、五级(引领级)

27、2026 年 5 月第 1 批

应用场合不同，信息的侧重面也不一样，对于金融信息而言，最重要的特性是（ ），而对于经济与社会信息而言，最重要的特性是（ ）。

A、安全性、及时性　　B、安全性、经济性

C、可靠性、及时性　　D、可靠性、经济性

28、2026 年 5 月第 1 批

（ ）具备发散性与聚集性，含有大量用户行为信息，该特点成就了其在（ ）当中的核心地位。

A、社交网络、消费互联网　　B、搜索引擎、产业互联网

C、物联网平台、工业互联网　　D、电商平台、数字孪生

29、2026 年 5 月第 1 批

关于数字经济中的数字产业化与产业数字化，下列说法正确的是（ ）。

A、数字化治理属于数字经济产业统计分类中的一类

B、数字化效率提升业属于数字产业化范畴

C、数据价值化不属于数字经济组成部分

D、数字要素驱动业、数字化效率提升业分别对应数字产业化、产业数字化

30、2026 年 5 月第 1 批

抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，提升国家创新体系整体效能，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，推动（ ）融合，不断催生新质生产力。

A、科技创新和产业创新　　B、理论创新和制度创新

C、文化创新和模式创新　　D、管理创新和服务创新

31、2026 年 5 月第 2 批

“十五五规划纲要”第四篇指出要深入推进（）建设，提升数智化发展水平，其中第十二章提出强化（）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、网络强国　算力算法数据高效供给　　B、网络强国　数据模型网络安全保障
C、数字中国　算力算法数据高效供给　　D、数字中国　数据模型网络安全保障

32、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

车联网系统是一个“端、管、云”三层体系，其中（）属于云系统能力，（）属于管系统能力。

A、IoV 寻址和网络可信标识　　异构网间通信与漫游
B、虚拟化与海量存储　　IoV 寻址和网络可信标识
C、异构网间通信与漫游　　实现车辆自组网
D、虚拟化与海量存储　　实现车辆自组网

33、2026 年 5 月第 2 批

数据要素市场化配置应建立在明确的数据产权、（）、定价机制、（）监管机制、法律范围等保障制度的基础上。

A、共享机制、流通机制　　B、共享机制、分配机制
C、交易机制、流通机制　　D、交易机制、分配机制

34、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

元宇宙的主要特征包括:沉浸式体验、虚拟身份、（）和（）。

A、虚拟文化治理　虚拟社会　　B、虚拟产业治理　虚拟社会
C、虚拟空间治理　虚拟经济　　D、虚拟社会治理　虚拟经济

35、2026 年 5 月第 2 批

互联网环境下的“无身份社会”带来了更加快捷的社会活动与经济效能，相关参与者可以不用消耗时间精力来完成共同参与者的“身份认定”，这是因为互联网搭建了更高层级的（），其通过数据记录、存储、整合与共享等方面的能力，实现了社会活动的一定程度上的复杂校验和过程（）。

A、数据共享模式 可优化　　B、数据共享模式 可回溯
C、信任校验模式 可优化　　D、信任校验模式 可回溯

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、信息化内涵主要包括信息网络体系、信息产业基础、社会运行环境、效用积累过程 4 个方面，其中信息科学技术研究与开发、信息装备制造、信息咨询服务是属于（）。

A、信息网络体系　　B、信息产业基础　　C、社会运行环境　　D、效用积累过程

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2、以下（）不属于新型基础设施建设。
A、5G 基建　　B、特高压　　C、城际高速公路　　D、城际轨道交通

3、工业互联网网络体系不包括（）。
A、网络互联　　B、数据互通　　C、标识解析　　D、协同互动

4、车联网（IoV）系统不包含（）。
A、端系统　　B、管系统　　C、云系统　　D、操作系统

5、以下说法中，错误的是（）。
A、农业现代化是用现代工业装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代管理方法管理农业，用现代科学文化知识提高农民素质的过程；是建立高产、优质、高效农业生产体系，把农业建成具有显著经济效益、社会效益和生态效益的可持续发展的农业的过程；也是大幅度提高农业综合生产能力、不断增加农产品有效供给和农民收入的过程。
B、智能制造（IM）是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
C、企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核心业务活动的精准预测和优化属于企业智能制造能力成熟度等级第 4 级的特征。
D、《国家信息化发展战略纲要》强调国家信息化发展战略总目标是建设网络强国，分“三步走”其中：第二步到 2025 年，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。

6、以下说法中，错误的是（）。
A、工业互联网平台体系具有四大层级：它以网络为基础，平台为中枢，数据为要素，安全为保障。
B、工业互联网平台体系包括边缘层、IaaS、PaaS 和 SaaS 四个层级，相当于工业互联网的“操作系统”。
C、工业互联网安全具有三大特点：①涉及范围广②造成影响大③企业防护基础弱
D、数字经济包括数字产业化、产业数字化、数字化治理三个部分。

7、数据价值化是指以数据资源化为起点，经历数据资产化、数据资本化阶段，实现数据价值化的经济过程。上述三个要素构成数据价值化的“三化”框架，其中，不包含（）。
A、数据资源化　　B、数据资产化　　C、数据资本化　　D、数据产业化

8、关于数字政府的相关内容，说法错误的是（）。
A、数字政府通常是指以新一代信息技术为支撑，以“业务数据化、数据业务化”为着力点，通过数据驱动重塑政务信息化管理架构、业务架构和组织架构，形成“用数据决策、数据服务、

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

数据创新”的现代化治理模式。
B、数字政府既是“互联网+政务”深度发展的结果，也是大数据时代政府自觉转型升级的必然，其核心目的是以人为本，实施路径是共创、共享、共建、共赢的生态体系。
C、《“十四五”国家信息化规划》中提出打造协同高效的数字政府服务体系，深入推进“放管服”改革、加快政府职能转变，打造市场化、法治化、国际化营商环境，坚持整体集约建设数字政府，推动条块政务业务协同，加快政务数据开放共享和开发利用，深化推进“一网通办”“跨省通办”“一网统管”。
D、协同化是政府数字化最基本的技术要求，政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群集约式规划与建设的演化过程，是政府整体转型的必要条件。

9、以下说法中，错误的是（）。
A、智慧城市发展成熟度划分为规划级、管理级、协同级、优化级、引领级 5 个等级。
B、数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。
C、数字化转型是建立在数字化转换、数字化升级基础上，进一步触及组织核心业务，以新建一种业务模式为目标的高层次转型。数字化转型是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式。
D、基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求是多元融合的内容。

10、元宇宙的主要特征不包含（）。
A、沉浸式体验　　B、虚拟身份　　C、虚拟社会治理　　D、现实经济

11、（）的通信是指用户可以通过 Wi-Fi、蓝牙、蜂窝等无线通信手段与车辆进行信息沟通，使用户能通过对应的移动终端设备监测并控制车辆。
A、车与人　　B、车与云平台　　C、车与车　　D、车与路

12、以下说法，错误的是（）。
A、信息基础设施包括：①以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施；②以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施；③以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。信息基础设施凸显“技术新”。
B、互联网环境下的“无身份社会”带来了更加快捷的社会活动与经济效能，相关参与者可以不用消耗时间精力来完成共同参与者的“身份认定”
C、数字民生建设重点通常强调：普惠、赋能、利民。
D、应聚焦智慧城市与城市经济社会发展深度融合，基于数据与知识模型实施城市经济、社会精准化治理，推动数据要素的价值挖掘和开发利用，推进城市竞争力持续提升是智慧城市第 5 级引领级的特点。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、数字化转型基本原理中，通过（）完成物理对象到信息空间的映射。
A、孪生虚拟化　　B、架构可视化　　C、计算智能化　　D、知识模型化

14、（）指农业、工业、服务业等传统产业广泛利用信息技术，大力开发和利用信息资源，建立各种类型的产业互联网平台和网络，实现产业内各种资源、要素的优化与重组，从而实现产业的升级。
A、产业信息化　　B、产品信息化　　C、社会生活信息化　　D、国民经济信息化

15、将工业经验知识转化为平台上的模型库、知识库，并通过工业微服务组件方式，方便二次开发和重复调用，加速共性能力沉淀和普及是（）的作用。
A、数据汇聚　　B、建模分析　　C、知识复用　　D、应用创新

16、数字政府建设关键词不包括（）。
A、共享　　B、互通　　C、便利　　D、节约

17、（）是指系统服务对象领域的专门知识，以及分析和处理该领域问题的模型，又称为对象的处理模型。
A、管理系统模型　　B、信息处理模型　　C、系统实现条件　　D、网络系统

18、信息系统的生命周期分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护，其中系统实施包含（）。
A、可行性分析与项目开发计划　　B、需求分析　　C、概要设计　　D、编码

19、信息化内涵里的“信息装备制造”属于（ ）。
A、信息网络体系　　B、信息产业基础　　C、社会运行环境　　D、效用积累过程

20、科教基础设施属于新型基础设施建设里的（）。
A、创新基础设施　　B、融合基础设施　　C、信息基础设施　　D、网络基础设施

21、工业互联网平台体系具有四大层级：它以网络为基础，（）为中枢，数据为要素，安全为保障。
A、网络　　B、平台　　C、数据　　D、安全

22、（）提供大数据、人工智能分析的算法模型和物理、化学等各类仿真工具，结合数字孪生、工业智能等技术，对海量数据挖掘分析，实现数据驱动的科学决策和智能应用。
A、数据汇聚　　B、建模分析　　C、知识复用　　D、应用创新

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

23、企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享是（）层的特点。
A、一级（规划级）　B、二级（规范级）　C、三级（集成级）　D、四级（优化级）

24、（）主要强调组织的互联互通，业务协同方面能实现一个跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的高效协同管理和服务。
A、协同化　B、云端化　C、智能化　D、数据化

25、数字政府从面向社会大众政务服务视角来看，主要内容不包含（）。
A、一网通办　B、跨省通办　C、一网统管　D、每日督办

26、（）是基于决策算法和信息应用等进行能力构建，强化执行端的决策能力，从而达到快速反应、高效决策的效果，满足对社会发展的敏捷需求。
A、数据治理　B、数字孪生　C、边际决策　D、多元融合

27、（）应明确智慧城市发展战略、原则、目标和实施计划等，推进城市基础设施智能化改造，多领域实现信息系统单项应用，对智慧城市全生命周期实施管理。
A、规划级　B、管理级　C、协同级　D、引领级

28、（）是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。
A、数字乡村　B、数字政府　C、数字生活　D、数字农业

29、“数据--智慧”过程中，通过（）实现业务知识模型与经验沉淀的复用和创新。
A、对象数字化　B、孪生虚拟化　C、架构可视化　D、计算智能化

30、以下（）不是元宇宙的特点。
A、沉浸式体验　B、虚拟身份　C、虚拟经济　D、真实空间

31、以下（）不是产业数字化的典型特征。
A、以数字科技变革生产工具　B、以数据资源为关键生产要素
C、以数字内容重构产品结构　D、以服务平台为市场配置纽带

32、以下（）是产业数字化的内容。
A、数字产品制造业　B、数字产品服务业　C、数字技术应用业　D、数字化效率提升业

33、以下关于信息的说法中，错误的是（）。
A、信息是确定性的增加

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、信息在客观世界中大量存在、产生和传递
C、对于金融信息而言，其最重要的特性是安全性
D、对于经济与社会信息而言，其最重要的特性是精确性

34、乡村振兴战略的重点不包括（）。
A、建设基础设施　　B、发展智慧农业　　C、建设数字乡村　　D、智能制造

35、在“一网统管”建设中，预警强调（）。
A、主要包括政务云、政务网和政务大数据中心等
B、通过对多个部门的数据进行整合，将城市运行情况充分反映出来。
C、畅通各级指挥体系，为跨部门、跨区域、跨层级联勤联动、高效处置提供快速响应能力。
D、基于多维、海量、全息数据汇集，实现城市运行体征的全量、实时掌握和智能预警。

36、数字生活是依托互联网和一系列数字科技技术应用为基础的一种生活方式，可以方便快捷地带给人们更好的生活体验和工作便利。人们将像享受空气、阳光、水一样享受数字化生活工具带来的舒适和便捷属于（）。
A、生活工具数字化　　B、生活方式数字化　　C、生活内容数字化　　D、生活节奏数字化

37、以下关于数字生态的说法中，错误的是（）。
A、数据作为新型生产要素，具有劳动工具和劳动对象的双重属性。
B、数据要素市场就是将尚未完全由市场配置的数据要素转向由市场配置的动态过程，其目的是形成以市场为根本调配机制，实现数据流动的价值或者数据在流动中产生价值。
C、良好的营商环境是一个国家或地区经济软实力和综合竞争力的重要体现。
D、在数字生态建设中，不需要关注网络安全和数据安全。

38、科学技术是第一生产力，在四次科技革命中，第四科学范式是（）。
A、经验范式　　B、理论范式　　C、模拟范式　　D、数据密集型研究范式

39、组织数字化转型需要在能力因子不断细化的基础上，针对能力因子的数字化转型实施迭代，组织每个能力因子数字化“封装”的持续迭代主要包含四项活动，其中不包含（）。
A、信息物理世界(也称数字孪生，CPS)建设
B、决策能力边际化部署
C、科学社会物理赛博机制构筑
D、终端侧管理

40、以下说法中，错误的是（）。
A、农业现代化是用现代工业装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代管理方法管理农业，用现代科学文化知识提高农民素质的过程。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、农业信息化是农业现代化的重要技术手段。
C、农业信息化是指利用信息技术和信息系统为农业产供销及相关的管理和服务提供有效的信息支持，以提高农业的综合生产力和经营管理效率的过程
D、数据资产化主要包括两种方式，数据信贷融资与数据证券化。

41、2022 年 5 月第 7 题

元宇宙本身不是一种技术，而是一个理念和概念，它需要整合不同的新技术，强调虚实相融。元宇宙主要有以下几项核心技术：一是（7），包括 VR、AR 和 MR，可以提供沉浸式的体验;二是（7），能够把现实世界镜像到虚拟世界里面去，在元宇宙里面，我们可以看到很多自己的虚拟分身;三是用（7）来搭建经济体系。经济体系将通过稳定的虚拟产权和成熟的去中心化金融生态具备现实世界的调节功能，市场将决定用户劳动创造的虚拟价值。

A、扩展现实 数字孪生 区块链　　B、增强现实 虚拟技术 区块链
C、增强现实 数字孪生 大数据　　D、扩展现实 虚拟技术 大数据

42、2022 年 11 月第 5 题

“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，在推进产业数字化转型中，实施（5）行动，推动数据赋能全产业链协同转型。

A、上云用数赋智　　B、数字技术　　C、智能资源　　D、平台化功能

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第八章 信息技术发展

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第3题

网络安全态势感知在（3）的基础上，进行数据整合，特征提取等，应用一系列态势评估算法，生成网络的整体态势情况。

A、安全应用软件　　B、安全基础设施　　C、安全网络环境　　D、安全大数据

2、2023年5月第4题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（4）是指一个操作系统中多个程序同时并行运行，而（4）则可以同时运行多个操作系统，而且每一个操作系统中都有多个程序运行，（4）只是单CPU模拟双CPU来平衡程序运行性能，这两个模拟出来的CPU是不能分离的，只能协同工作。

A、虚拟化技术　多任务　超线程技术

B、超线程技术　虚拟化技术　多任务

C、虚拟化技术　超线程技术　多任务

D、多任务　虚拟化技术　超线程技术

3、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

（）是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、语音识别、中文OCR等方面。

A、自然语言处理（NLP）　　B、机器学习　　C、专家系统　　D、神经网络

4、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于区块链的说法中，错误的是（）。

A、区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。

B、区块链概念可以理解为以非对称加密算法为基础，以改进的默克尔树为数据结构，使用共识机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种分布式存储数据库技术。

C、激励机制可确保分布式系统中的所有节点均可参与数据区块的验证过程，并通过共识机制选择特定节点将新产生的区块加入到区块链中

D、区块链系统中的加密算法一般分为散列（哈希）算法和对称加密算法。

5、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于云计算的说法中，错误的是（）。

A、云计算实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时通过宽带网络接入“云”

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

并获得服务，按照实际需求获取或释放资源，根据需求对资源进行动态扩展。

B、PaaS 向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务。

C、云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。

D、基于 ABE 密码机制的云计算访问控制包括 3 个参与方：数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器。

6、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不是人工智能的技术？

A、机器学习　　B、神经网络　　C、NLP　　D、虚拟化

7、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

以下说法中，错误的是（）。

A、自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向

B、从“人工+智能”向自主智能系统发展。

C、专家系统其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验，它能够应用人工智能技术和计算机技术，根据系统中的知识与经验，进行推理和判断

D、神经网络是自然语言处理的一种形式

8、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在云计算中，向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web 应用等平台化的服务是（）。

A、IaaS　　B、PaaS　　C、SaaS　　D、TaaS

9、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

大数据获取的研究主要集中在以下（）方面。

A、数据存储和计算　　B、数据采集、整合和清洗

C、数据分析和可视化　　D、数据安全和隐私保护

10、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

（）以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型，并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和实体的可疑或非法行为。

A、用户和实体行为分析（UEBA）　　B、云计算　　C、物联网　　D、人工智能

11、2023 年 11 月第 4 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

微信中语音转换为文字的功能，主要应用了（）技术。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、虚拟现实　　B、专家系统　　C、自然语言处理　　D、大数据

12、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于信息安全的描述，不正确的是:（）。

A、网络安全技术主要包括防火墙、入侵检测与防护、VPN、安全扫描、网络蜜罐技术、用户和实体行为分析技术

B、随着物联网、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术的广泛应用，信息安全面临着新的问题和挑战

C、信息安全可以划分为设备安全、数据安全、平台安全、行为安全四个层次

D、信息系统安全包括网络安全、操作系统安全、数据库系统安全和应用系统安全

13、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

虚拟现实的关键技术不包括（）。

A、蒙特卡洛分析技术　B、人机交互技术　C、传感器技术　D、动态环境建模技术

14、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）主要关注大数据存储、大数据协同和安全隐私等方面。

A、大数据获取技术　　B、大数据可视化技术

C、大数据处理技术　　D、大数据管理技术

15、2024年5月第2批

（）利用复杂的算法、模型和规则，从大规模数据集中学习，以创造新的原创内容的人工智能技术。这项技术能够创造文本、图片、声音、视频和代码等多种类型的内容，全面超越了传统软件的数据处理和分析能力。

A、NLP(自然语言处理)　　B、AIGC(生成式人工智能)

C、OCR(光学字符识别)　　D、CV(计算机视觉)

16、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于物联网感知层设备。

A、摄像头　　B、温度传感器　　C、二维码标签　　D、以太网交换机

17、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于TCP/IP 的应用层协议。

A、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议)

B、FTP(File Transfer Protocol，文件传输协议)

C、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议)

D、ARP(Address Resolution Protocol，地址解析协议)

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

18、2025 年 5 月第 1 批

某医院拟部署大模型分析电子病历辅助智能诊断，为了严格保护患者隐私，应采用的技术是（）。

A、检索增强生成　　B、强化学习　　C、联邦学习　　D、知识蒸馏

19、2025 年 5 月第 1 批

关于人工智能未来发展趋势的描述，不正确的是（）。

A、保持人工智能在单一学科领域的快速发展

B、构建“人工智能+X”的创新发展模式

C、制定人工智能法律法规规避社会风险

D、通过人机混合智能实现人类智能的延伸拓展

20、2025 年 5 月第 1 批

为推动人形机器人产业高质量发展，培育形成新质生产力，工业和信息化部印发了《人形机器人创新发展指导意见》。某公司研发的机器人在通过复杂地形时能够自主调整姿态以维持平衡，这一技术突破属于该项政策支持的关键技术攻关领域中的（）。

A、机器人“小脑”关键技术群　　B、机器体关键技术群

C、机器肢关键技术群　　D、机器人“大脑”关键技术群

21、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

下列说法中，正确的是（）。

A、网络设备的控制与数据面紧密耦合，由交换机自主决策转发规则

B、应用平面通过 OPenFlow 协议直接配置数据平面设备

C、数据平面负责全局网络管理，控制平面负责执行简单的数据包转发

D、通过控制面与数据面分离，实现网络流量的灵活控制

22、2025 年 5 月第 2 批

关于大语言模型的描述，不正确的是（）。

A、大语言模型可以超越训练数据的知识领域生成内容

B、大语言模型支持语言、图像和语音等多种数据类型的处理

C、大语言模型的训练需要大量计算资源

D、大语言模型使用的参数规模通常可达 10 亿级以上

23、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于直接式存储(DAS)、网络接入存储(NAS)的描述不正确的是（）。

A、DAS 数据传输协议是 SCSI/FC/ATA，NAS 数据传输协议是 TCP/IP

B、DAS 不一定采用集中式管里，NAS 采用集中式管理

C、DAS 的容量扩充能力高，NAS 的容量扩充能力低

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、DAS 的传输对象是数据块，NAS 的传输对象是文件

24、2025 年 5 月第 2 批

（）属于区块链的典型应用领域。

①能源交易　②图像识别与处理　③内容生成　④学历认证　⑤金融交易溯源 ⑥交通路况预测

A、①②③　B、②⑤⑥　C、③④⑥　D、①④⑤

25、2025 年 5 月第 2 批

某外卖平台中，用户收到基于地理位置的个性化推荐，其背后的技术驱动是（）。

A、云计算实时模拟物流配送效率

B、区块链技术提供的数据追踪能力

C、大数据技术结合用户历史行为数据分析

D、加密算法保护用户隐私的同时生成推荐

26、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（ ）能防止数据被随意篡改。

A、多方维护　B、哈希验证　C、智能合约　D、开放共识

27、2026 年 5 月第 1 批

下列选项中，不属于非关系型数据库特点的是（ ）

A、易扩展　B、需要 SQL 解析

C、高并发读写性能好　D、事务支持较弱

28、2026 年 5 月第 1 批

关于隐性 AI 标识，下列说法错误的是（ ）。

A、隐性标识也被称为数字水印

B、隐性标识可以用于溯源 AI 生成内容

C、隐性标识对普通用户不可见

D、隐性标识是为了满足用户的知情权

29、2026 年 5 月第 2 批

（）赋予了物联网（）特性，使得物联网拥有了随时掌握物品准确位置及周边环境的能力。

A、生物识别技术 可跟踪性　B、北斗定位技术 互联性

C、二维码技术 互联性　D、射频识别技术 可跟踪性

30、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于信息安全的描述，不正确的是（）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、信息系统的四个安全层次是网络安全、数据安全、内容安全和行为安全

B、信息安全的三个主要属性是保密性、完整性和可用性

C、UEBA 系统架构通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层

D、加密技术的两个主要元素是算法和密钥

31、2026 年 5 月第 2 批

关于虚拟现实与量子计算技术结合的应用，不正确的是（）。

A、量子计算可用于提升虚拟现实系统中三维交互与实时仿真效率

B、量子计算可用于加速虚拟现实场景中的复杂环境渲染

C、量子计算机目前已广泛应用于虚拟现实的复杂场景构建

D、量子机器学习可用于虚拟现实中的智能感知、手势识别、场景理解等

32、2026 年 5 月第 2 批

可信数据空间是基于（）、连接（）实现数据资源共享公用的一种数据流通利用基础设施。

A、共识规则 多方主体　　B、效益规则 多层网络

C、效益规则 多方主体　　D、共识规则 多层网络

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下说法，错误的是（）。

A、从网络的作用范围可将网络类别划分为个人局域网（PAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）、公用网（Public Network）、专用网（Private Network）

B、软件定义网络（SDN）是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，它可通过软件编程的形式定义和控制网络，其通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。

C、第五代移动通信技术（5G）是具有高速率、高时延和大连接特点的新一代移动通信技术。5G 采用短帧、快速反馈、多层/多站数据重传等技术。

D、5G 的三大类应用场景，即增强移动宽带（eMBB）、超高可靠低时延通信（uRLLC）和海量机器类通信（mMTC）。

2、以下关于存储的内容，说法错误的是（）。

A、开放系统的存储分为：内置存储和外挂存储。外挂存储根据连接的方式分为直连式存储（DAS）和网络化存储（FAS）。网络化存储根据传输协议又分为网络接入存储（NAS）和存储区域网络（SAN）

B、存储虚拟化是“云存储”的核心技术之一，它把来自一个或多个网络的存储资源整合起来，向用户提供一个抽象的逻辑视图，用户可以通过这个视图中的统一逻辑接口来访问被整合的存

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

储资源。用户在访问数据时并不知道真实的物理位置。
C、绿色存储技术是指从节能环保的角度出发，用来设计生产能效更佳的存储产品，降低数据存储设备的功耗，提高存储设备每瓦性能的技术。
D、DAS 容量扩充能力高。

3、以下说法中，错误的是（）。
A、常见的数据结构模型有三种：层次模型、网状模型和关系模型。
B、关系模型是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型。
C、数据库根据存储方式可以分为关系型数据库（SQL）和非关系型数据库（Not Only SQL，NoSQL）
D、数据仓库是一个面向主题的、集成的、非易失的且随时间变化的数据集合，用于支持实时业务。

4、以下关于信息安全的说法中，错误的是（）。
A、保密性、完整性、可用性是信息安全的基本属性。
B、信息系统安全可以划分为四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。
C、非对称加密体制下，解密秘钥可以公开，加密秘钥必须保密。
D、从架构上来看，UEBA 系统通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层。

5、以下关于物联网的说法中，错误的是（）。
A、物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层
B、物联网关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统框架等。
C、MEMS 赋予了普通物体新的“生命”，它们有了属于自己的数据传输通路、存储功能、操作系统和专门的应用程序，从而形成一个庞大的传感网，使物联网能够通过物品来实现对人的监控与保护。
D、射频识别技术（RFID）是物联网中使用的一种传感器技术，用于网络层。

6、以下关于大数据的说法中，错误的是（）。
A、大数据主要特征包括：（1）数据海量（2）数据类型多样（3）数据价值密度高（4）数据处理速度快
B、大数据技术架构主要包含大数据获取技术、分布式数据处理技术和大数据管理技术，以及大数据应用和服务技术。
C、大数据获取的研究主要集中在数据采集、整合和清洗三个方面
D、大数据应用和服务技术：主要包含分析应用技术和可视化技术

7、以下关于区块链的说法，错误的是（）。
A、区块链技术具有多中心化存储、隐私保护、防篡改等特点，提供了开放、分散和容错的事务机制，成为新一代匿名在线支付、汇款和数字资产交易的核心。
B、区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、区块链的关键技术包括：分布式账本、加密算法、共识机制
D、多方维护是指在区块链网络中，每台物理设备均可作为该网络中的一个节点，任意节点可自由加入且拥有一份完整的数据库拷贝。

8、以下关于人工智能的说法，错误的是（）。
A、人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术。
B、机器学习是一种自动将模型与数据匹配，并通过训练模型对数据进行“学习”的技术。机器学习的研究主要聚焦在机器学习算法及应用、强化学习算法、近似及优化算法和规划问题等方面。神经网络是机器学习的一种形式。
C、专家系统是一个智能计算机程序系统，通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取等 6 个部分构成。
D、自然语言处理就是一般地研究自然语言。

9、以下关于虚拟现实的说法，错误的是（）。
A、虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性（也称想象性）和自主性。
B、虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。
C、虚拟现实技术已经从桌面虚拟现实系统、沉浸式虚拟现实系统、分布式虚拟现实系统等，向着增强式虚拟现实系统（AR）和元宇宙的方向发展。
D、通过虚拟现实系统所建立的信息空间，就是单纯的数字信息空间。

10、以下说法，错误的是（）。
A、软件定义网络 SDN 的整体架构由下到上（由南到北）分为数据平面、控制平面和应用平面。
B、网状模型：是在关系结构的数据库中用二维表格的形式表示实体以及实体之间的联系的模型。
C、关系型数据库支持事务的 ACID 原则，即原子性、一致性、隔离性、持久性。
D、目前，主流的分布式计算系统有 Hadoop、Spark 和 Storm。

11、SDN 中的接口具有开放性，以控制器为逻辑中心，（）接口负责与数据平面进行通信。
A、南向　　B、北向　　C、东向　　D、西向

12、（）是整个数据仓库系统的核心。针对现有各业务系统的数据，进行抽取、清理并有效集成，按照主题进行组织。
A、数据源　　B、数据的存储与管理　　C、联机分析处理(OLAP)服务器　　D、前端工具

13、（）由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、网络层　　B、感知层　　C、应用层　　D、传输层

14、（）实现数据源的获取，然后通过整合和清理技术保证数据质量。
A、数据采集技术　　B、数据整合技术　　C、数据清洗技术　　D、数据存储技术

15、只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判断出数据是否已被篡改。这体现了信息安全基本要素的（20）。
A、机密性　　B、完整性　　C、可用性　　D、可靠性

16、DDOS拒绝服务攻击是以通过大量合法的请求占用大量网络资源,造成网络瘫痪，该网络攻击破坏了信息安全的（21）属性。
A、可控性　　B、可用性　　C、完整性　　D、保密性

17、以下关于云计算的说法中，错误的是（）。
A、云计算是一种基于互联网的计算方式，实现了“快速、按需、弹性”的服务，用户可以随时通过宽带网络接入“云”并获得服务，按照需求获取或释放资源，对资源进行动态扩展。
B、PAAS是向用户提供计算机能力、存储空间等基础设施方面的服务。
C、云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。
D、容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，属于操作系统虚拟化的范畴，也就是由操作系统提供虚拟化的支持。目前最受欢迎的容器环境是Docker。

18、OSI采用了分层的结构化技术，以下（）不属于OSI的分层模型内容。
A、物理层　　B、感知层　　C、网络层　　D、应用层

19、在TCP/IP协议中，以下（）不属于应用层的协议。
A、FTP　　B、TFTP　　C、SMTP　　D、TCP

20、以下关于软件定义网络（SDN）的说法中，错误的是（）。
A、数据平面由交换机等网络通用硬件组成，各个网络设备之间通过不同规则形成的SDN数据通路连接
B、控制平面包含了逻辑上为中心的SDN控制器，掌握着全局网络信息，负责各种转发规则的控制
C、应用平面包含着各种基于SDN的网络应用，用户无须关心底层细节就可以编程、部署新应用。
D、北向接口负责与数据平面进行通信

21、以下关于5G的说法中，错误的是（）。
A、第五代移动通信技术（5G）是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代移动通信技术。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、5G同时支持中低频和高频频段，其中中低频满足覆盖和容量需求，高频满足在热点区域提升容量的需求。
C、为了支持低时延、高可靠，5G采用长帧、快速反馈、多层/多站、数据重传等技术。
D、5G的三大类应用场景，即增强移动宽带（eMBB）、超高可靠低时延通信（uRLLC）和海量机器类通信（mMTC）。

22、以下关于存储的说法中，错误的是（）。
A、DAS容量扩充能力低
B、DAS主要应用于局域网
C、SAN灾难容忍度高，有专有方案
D、NAS的数据传输协议是FC

23、（）用“树”结构表示实体集之间的关联，其中实体集（用矩形框表示）为结点，而树中各结点之间的连线表示它们之间的关联。
A、层次模型　　B、网状模型　　C、关系模型　　D、表格模型

24、（）是整个数据仓库系统的核心。
A、数据源　　B、数据的存储与管理　　C、联机分析处理（OLAP）服务器　　D、前端工具

25、以下关于信息安全，说法错误的是（）。
A、完整性:信息是正确的、真实的、未被篡改的、完整无缺的属性。
B、信息系统安全可以划分为四个层次：设备安全、数据安全、内容安全、行为安全。
C、对称加密以数据加密标准RSA算法为典型代表，非对称加密通常以（DES）算法为代表。
D、用户和实体行为分析（UEBA）以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型，并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和实体的可疑或非法行为。从架构上来看，UEBA系统通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层。

26、以下关于物联网的说法中，错误的是（）。
A、物联网架构可分为三层：感知层、网络层和应用层。
B、物联网关键技术主要涉及传感器技术、传感网和应用系统框架等。
C、微机电系统（MEMS）是由微传感器、微执行器、信号处理和控制电路、通信接口和电源等部件组成的一体化的微型器件系统。
D、感知层由各种网络，包括互联网、广电网、网络管理系统和云计算平台等组成，是整个物联网的中枢，负责传递和处理感知层获取的信息。

27、以下关于云计算的说法中，错误的是（）。
A、云计算是一种基于互联网的计算方式，实现了“快速、按需、弹性”的服务。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、SaaS向用户提供虚拟的操作系统、数据库管理系统、Web应用等平台化的服务。
C、云计算的关键技术主要涉及虚拟化技术、云存储技术、多租户和访问控制管理、云安全技术等。
D、容器技术是一种全新意义上的虚拟化技术，属于操作系统虚拟化的范畴，也就是由操作系统提供虚拟化的支持。目前最受欢迎的容器环境是Docker。

28、以下关于云计算的说法中，错误的是（）。
A、在虚拟化技术中，可以同时运行多个操作系统，而且每一个操作系统中都有多个程序运行，每一个操作系统都运行在一个虚拟的CPU或者虚拟主机上
B、分布式文件系统作为云存储技术中的重要组成部分，在维持兼容性的基础上，对系统复制和容错功能进行提升。
C、云计算访问控制模型就是按照特定的访问策略来描述安全系统，建立安全模型的一种方法。用户（租户）可以通过访问控制模型得到一定的权限，进而对云中的数据进行访问，访问控制模型多用于动态分配用户的权限。
D、基于ABE密码机制的云计算访问控制包括4个参与方：数据提供者、可信第三方授权中心、云存储服务器和用户。

29、一般根据正确性条件和数据约束规则，清除不合理和错误的数据，对重要的信息进行修复，保证数据的完整性是（）。
A、数据采集技术　　B、数据整合技术　　C、数据清洗技术　　D、数据挖掘技术

30、以下关于大数据的说法中，错误的是（）。
A、大数据主要特征包括：（1）数据海量（2）数据类型多样（3）数据价值密度低（4）数据处理速度快
B、目前，主流的分布式计算系统有Hadoop、Spark和Storm。Hadoop常用于离线的复杂的大数据处理，Spark常用于离线的快速的大数据处理，而Storm常用于在线的实时的大数据处理。
C、大数据的可视化技术主要集中在文本可视化技术、网络（图）可视化技术、时空数据可视化技术、多维数据可视化和交互可视化等。
D、大数据（Big Data）是具有体量大、结构单一、时效性强等特征的数据，处理大数据需要采用新型计算架构和智能算法等新技术。

31、以下关于区块链的说法中，错误的是（）。
A、区块链技术具有多中心化存储、隐私保护、防篡改等特点，提供了开放、分散和容错的事务机制，成为新一代匿名在线支付、汇款和数字资产交易的核心。
B、区块链分为公有链、联盟链、私有链和混合链四大类。
C、区块链系统中的加密算法一般分为散列（哈希）算法和非对称加密算法。
D、多方维护是指区块链技术能够为用户提供灵活可变的脚本代码，以支持其创建新型的智能合约

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

32、（）是指是否支持超级权限节点对全网节点、数据进行监管。
A、合规监管　　B、性能效率　　C、资源消耗　　D、容错性

33、关于人工智能的说法中，错误的是（）。
A、ChatGPT属于人工智能的内容
B、人工智能的关键技术主要涉及机器学习、自然语言处理、专家系统等技术
C、自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地使用自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。
D、神经网络不是机器学习的一种形式

34、以下关于虚拟现实的说法中，错误的是（）。
A、虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性（也称想象性）和自主性。
B、虚拟现实的关键技术主要涉及人机交互技术、传感器技术、动态环境建模技术和系统集成技术等。
C、随着虚拟现实技术的快速发展，按照其“沉浸性”程度的高低和交互程度的不同，虚拟现实技术已经从桌面虚拟现实系统、沉浸式虚拟现实系统、分布式虚拟现实系统等，向着增强式虚拟现实系统（AR）和元宇宙的方向发展。
D、动态环境建模技术是VR技术更好地实现人机交互的关键。

35、基于ABE密码机制的云计算访问控制包括4个参与方，其中，不包括（）。
A、数据提供者　　B、可信第三方授权中心　　C、云存储服务器　　D、认证中心

36、以下关于5G的说法中，错误的是（）。
A、5G建立在正交频分多址（OFDMA）和多入多出（MIMO）基础技术上
B、5G同时支持中低频和高频频段
C、高频满足覆盖和容量需求，中低频满足在热点区域提升容量的需求
D、5G针对中低频和高频设计了统一的技术方案，并支持百MHz的基础带宽

37、网络安全技术不包括（）。
A、防火墙　　B、入侵监测与防护　　C、容器技术　　D、VPN

38、在大数据获取技术中，分布式爬取属于（）。
A、数据采集技术　　B、数据整合技术　　C、数据清洗技术　　D、数据存储技术

39、创新基于对象的数据连接、相似性连接等大数据融合技术属于（）。
A、大数据分析与挖掘技术　　B、数据整合技术　　C、数据清洗技术　　D、数据存储技术

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

40、常用的非对称加密算法不包括（）。

A、DES　　B、RSA　　C、Elgamal　　D、ECC(椭圆曲线加密算法)

41、以下关于机器学习的说法中，错误的是（）。

A、神经网络是机器学习的一种形式，并用于分类型应用程序。它根据输入、输出、变量权重或将输入与输出关联的“特征”来分析问题。它类似于神经元处理信号的方式。

B、深度学习是通过多等级的特征和变量来预测结果的神经网络模型。深度学习模型使用一种称为反向传播的技术，通过模型进行预测或对输出进行分类。

C、强化学习是机器学习的另外一种方式，指机器学习系统制订了目标而且迈向目标的每一步都会得到某种形式的奖励。

D、机器学习模型是以统计为基础的，而且应该将其与常规分析进行对比以明确其价值增量。但是往往没基于人类假设和回归分析的传统“手工”分析模型准确。

42、以下属于SAN特点的是（）。

①安装难易度：困难　②数据传输协议：FC　③适合对象：大型组织　④容量扩充能力：低

A、①②③　　B、①②③④　　C、②③④　　D、①②④

43、2017年11月第16题

针对信息系统，安全可以划分为四个层次，其中不包括（16）。

A、设备安全　　B、人员安全　　C、内容安全　　D、行为安全

44、2018年5月第6题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某云计算服务商向电信运营商提供计算能力、存储空间及相应的运营管理服务，按照云计算服务提供的资源层次，该服务类型属于（6）。

A、IaaS　　B、CaaS　　C、PaaS　　D、SaaS

45、2018年5月第19题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

TCP/IP是Internet的核心协议，应用程序通过应用层协议利用网络完成数据交互的任务。其中，（19）是用来在客户机与服务器之间简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。

A、FTP　　B、TFTP　　C、HTTP　　D、SMTP

46、2018年5月第21题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

IEEE802规范定义了网卡如何访问传输介质，以及如何在传输介质上传输数据的方法。其中，（21）是重要的局城网协议。

A、IEEE802.1　　B、IEEE802.3　　C、IEEE802.6　　D、IEEE802.11

47、2019年5月第1题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

RFID 射频技术多应用于物联网的（1）。

A、网络层　　B、感知层　　C、应用层　　D、传输层

48、2021 年 5 月第 13 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

测试人员用工具获取系统的传输数据包，查看发送和接收方内容的一致性，验证数据的（13）。

A、完整性　　B、保密性　　C、可控性　　D、合法性

49、2021 年 11 月第 15 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于 RSA 算法的描述，不正确的是：（15）。

A、RSA 算法是非对称算法的代表

B、RSA 算法加密密钥与解密密钥不同

C、RSA 算法中解密密钥公开，而加密密钥需要保密。

D、利用 RSA 密码可以同时实现数字签名和数据加密

50、2022 年 5 月第 14 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（14）是利用公开密钥进行加密的技术。

A、AES　　B、IDEA　　C、DES　　D、RSA

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第九章 信息系统治理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第5题

GB/T 34960.1中定义了IT治理框架，（5）不属于IT治理框架的三大治理域。

A、管理体系　　B、技术体系　　C、顶层设计　　D、资源

2、2023年5月第6题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（6）不属于IT审计的目标。

A、对IT目标的实现进行审查和评价

B、识别与评估IT风险

C、保护信息资产的安全

D、提出评价意见及改进

3、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于审计工作底稿，说法错误的是（）。

A、审计工作底稿是指审计人员对制订的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据，以及得出的审计结论做出的记录。

B、审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。

C、审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿

D、综合类工作底稿是指审计人员在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿，包括:符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细表等

4、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于审计证据的说法中，错误的是（）。

A、审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料

B、客观性是指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据可靠

C、充分性是指要求审计人员根据所获证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对审计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关

D、合法性是指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系

5、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于统计抽样的说法中，错误的是（）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、统计抽样采用概率学原理，涉及计算样本量、抽取样本。

B、利用统计抽样，审计人员可以量化描述样本与总体的接近程度（评价抽样精度）以及用百分比表示的样本能够代表总体的概念（可靠性或置信水平）

C、属性抽样也称为金额估计抽样或平均值估计抽样，是一种由样本估计总体的货币金额或其他度量单位（如重量）的抽样技术。

D、用的统计抽样方法有：属性抽样和变量抽样

6、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

IT 治理体系框架具体包括（）。

①IT 战略目标 ②IT 治理组织③IT 治理机制④IT 治理域⑤IT 治理标准⑥IT 绩效目标

A、①②③④⑤⑥　　B、①②③　　C、④⑤⑥　　D、①②③④⑤

7、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

IT 审计业务和服务通常分为 IT 内部控制审计和 IT 专项审计，（）属于 IT 内部控制审计。

A、应用控制审计　　B、数据审计

C、网络与信息安全审计　　D、信息系统生命周期审计

8、2024 年 5 月第 1 批

治理活动的主要任务聚焦在全局统等，价值导向，机制保障，创新发展，文化助推五个方面。其中“指导建立规范过程管理和痕迹管理，并向利益相关者公开质量设定举措”属于( )的内容。

A、机制保障　　B、创新发展　　C、价值导向　　D、全局统筹

9、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

IT 审计常用的审计技术不包括（）。

A、产品分析技术　　B、审计抽样技术　　C、风险评估技术　　D、大数据审计技术

10、2024 年 5 月第 2 批

（）的核心是关注 IT 定位和信息化建设与数字化转型的责权利划分。

A、IT 技术　　B、IT 治理　　C、IT 管理　　D、IT 架构

11、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在 IT 审计流程中，“深入调查并调整审计计划”，属于（）的工作内容之一。

A、审计终结阶段　　B、审计准备阶段　　C、后续审计阶段　　D、审计实施阶段

12、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在确定 IT 审计范围时，（）需要根据审计的目的和投入的审计成本来确定。

A、逻辑范围　　B、物理范围　　C、组织范围　　D、总体范围

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于 IT 审计流程的描述，不正确的是（）。

A、在审计终结阶段归档审计底稿与报告

B、在后续审计阶段重新执行完整的审计步骤

C、在审计实施阶段开展符合性及实质性测试

D、在审计准备阶段组建团队并编制计划

14、2025 年 5 月第 1 批

信息系统项目管理审计内容与方法，不包括（）。

A、启动与计划　　B、实施与控制　　C、治理　　D、组织管理

15、2025 年 5 月第 1 批

关于组织 IT 治理相关的描述，不正确的是（）。

A、建立与 IT 发展相适应的组织文化发展策略

B、把组织治理纳入 IT 治理并建立 IT 治理机构

C、确保在可控成本与风险下实现 IT 战略目标

D、设立跨部门委员会统筹 IT 战略与业务集成

16、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

IT 治理的目标不包括（）。

A、与业务目标一致　　B、进行数据决策

C、风险管理　　D、有效利用信息与数据资源

17、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在 IT 审计流程中，（）是审计实施阶段的工作。

A、进行符合性测试　　B、编制审计计划

C、整理审计证据　　D、明确审计目的及任务

18、2026 年 5 月第 1 批

组织开展 IT 治理活动的主要任务聚焦在全局统筹、（ ）、机制保障、（ ）和文化助推。

A、价值导向 创新发展　　B、风险防控 战略匹配

C、价值导向 安全合规　　D、战略协同 持续改进

19、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在 IT 审计风险中，（ ）指假设 IT 活动不存在相关控制的情况导致重大错误的风险。

A、总体审计风险　　B、控制风险　　C、检查风险　　D、固有风险

马在老师 购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

审计证据的（）是指审计证据能够反映和证实客观经济活动特征的程度，它常受到审计证据的类型、取证的渠道和方式等因素的影响。

A、合法性　　B、客观性　　C、充分性　　D、可靠性

21、2026 年 5 月第 2 批

在 IT 治理的方法与标准中，不包括（ ）。

A、ISO/IEC 38500 系列　　B、GB/T 34960 系列

C、ISO 31000 系列　　D、COBIT 框架

本章可以做的另一些题目：

本块题目为我按新教材写的模拟题，大家可以选择性的做。模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下说法错误的是（）。

A、IT 治理主要目标包括：与业务目标一致、有效利用信息与数据资源、风险管理。

B、IT 治理管理层次大致可分为 4 层：决策层、管理层、执行管理层、业务与服务执行层

C、有效的 IT 治理必须关注五项关键决策，包括 IT 原则、IT 架构、IT 基础设施、业务应用需求、IT 投资和优先顺序。

D、IT 治理本质上关心：①实现 IT 的业务价值；②IT 风险的规避。

2、GB/T 34960.2《信息技术服务治理第 2 部分：实施指南》提出了 IT 治理通用要求的实施指南，分析了实施 IT 治理的环境因素，规定了 IT 治理的实施框架、实施环境和实施过程，并明确顶层设计治理、管理体系治理和资源治理的实施要求。该标准不适用于（）。

A、建立组织的 IT 治理实施框架，明确实施方法和过程；

B、组织内部开展 IT 治理的实施；

C、IT 治理相关软件或解决方案实施落地的指导；

D、第三方对组织的 IT 治理能力进行评价

3、以下说法错误的是（）。

A、信息和技术治理框架管理目标分为四个领域。

B、治理目标与治理流程有关，而管理目标与管理流程有关。治理流程通常由高级和中级管理层负责，而管理流程则在董事会和执行管理层的职责范围内

C、COBIT 给出了建议设计流程：①了解组织环境和战略；②确定治理系统的初步范围；③优化治理系统的范围；④最终确定治理系统的设计。

D、IT 审计的目的是指通过开展 IT 审计工作，了解组织 IT 系统与 IT 活动的总体状况，对组织是否实现 IT 目标进行审查和评价，充分识别与评估相关 IT 风险，提出评价意见及改进建议，促进组织实现 IT 目标。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、下列说法，错误的是（）。

A、IT 审计风险主要包括固有风险、控制风险、检查风险和总体审计风险。

B、总体审计风险是指针对单个控制目标所产生的各类审计风险总和。

C、常用审计方法包括：访谈法、调查法、检查法、观察法、测试法和程序代码检查法等。

D、计算机辅助审计技术是指遵循大数据理念，运用大数据技术方法和工具，利用数量巨大、来源分散、格式多样的数据，开展跨层级、跨系统、跨部门和跨业务等的深入挖掘与分析，提升审计发现问题、评价判断、宏观分析的能力。

5、下列说法，错误的是（）。

A、审计证据是指由审计机构和审计人员获取，用于确定所审计实体或数据是否遵循既定标准或目标，形成审计结论的证明材料。审计证据是审计意见的支柱，是审计人员形成审计结论的基础。

B、审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。它形成于审计过程，也反映整个审计过程。

C、审计工作底稿一般分为综合类工作底稿、业务类工作底稿和备查类工作底稿

D、审计流程一般分为审计准备、审计实施、审计终结 3 个阶段。

6、审计证据的特点不包括（）。

A、充分性　　B、主观性　　C、客观性　　D、合法性

7、（）是指通过预定的审计程序未能发现重大、单个或与其他错误相结合的风险。

A、检查风险　　B、固有风险　　C、控制风险　　D、总体审计风险

8、明确审计涉及的组织机构、主要流程、活动及人员等属于（）。

A、总体范围　　B、组织范围　　C、物理范围　　D、逻辑范围

9、管理目标分为四个领域，其中：针对 IT 解决方案的定义、采购和实施以及它们到业务流程的整合属于（）。

A、调整、规划和组织（APO）

B、内部构建、外部采购和实施（BAI）

C、交付、服务和支持（DSS）

D、监控、评价和评估（MEA）

10、IT 审计技术不包括（）。

A、风险评估技术　　B、审计抽样技术　　C、计算机辅助审计技术　　D、区块链技术

11、组织高层关于如何使用 IT 的陈述是（）的内容。

A、IT 原则的决策　　B、IT 架构的决策　　C、业务应用需求决策　　D、IT 基础设施决策

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

12、建立IT治理机制的原则不包括（）。
A、简单　　B、透明　　C、适合　　D、共享

13、（）是审计人员到被审计单位的经营场所及其他有关场所进行实地察看，来证实审计事项的一种方法。
A、观察法　　B、检查法　　C、测试法　　D、调查法

14、（）从人作为分析主体和需求主体的视角出发，强调基于人机交互的、符合人的认知规律的分析方法，目的是将人所具备的、机器并不擅长的认知能力融入数据分析过程中。
A、大数据可视化分析技术
B、大数据智能分析技术
C、大数据多数据源综合分析技术
D、大数据并行分析技术

15、审计工作底稿三级复核制度是指以审计机构负责人、（）和项目负责人(或项目经理)为复核人，依照规定的程序和要点对审计工作底稿进行逐级复核的制度。
A、部门负责人　　B、PMO　　C、质量管理员　　D、配置管理员

16、马军老师正在进行审计工作，目前，他正在深入调查并调整审计计划、了解并初步评估IT内部控制，请问，他目前处于审计的（）阶段。
A、审计准备阶段　　B、审计实施阶段　　C、审计终结阶段　　D、后续审计阶段

17、马军老师正在进行审计技术的选择，他惊讶的发现，目前时间及成本都不允许对既定总体中的所有交易或事件进行全面审计了，于是他选择了（）。
A、风险评估技术　　B、审计抽样技术　　C、计算机辅助审计技术　　D、大数据审计技术

18、组织的IT目标主要包括：（）。
①组织的IT战略应与业务战略保持一致；
②保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效；
③提高信息系统的安全性、可靠性及有效性；
④合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。
⑤对组织是否实现IT目标进行审查和评价
A、①②⑤　　B、②③④⑤　　C、①②③④　　D、①②③④⑤

19、制定IT的目标；分析新技术的机遇和风险；建设关键过程与核心竞争力；分配责任、定义规程、衡量业绩；管理风险和获得可靠保证等属于（）的职责。
A、最高管理层　　B、执行管理层　　C、业务与服务执行层　　D、业务运营层

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、以下（）不属于GB/T34960.1《信息技术服务治理第1部分：通用要求》的内容。
A、第三方对组织的IT治理能力进行评价
B、研发、选择和评价IT治理相关的软件或解决方案
C、建立组织的IT治理体系，并实施自我评价
D、第三方开展IT治理评价的指导

21、信息和技术治理框架的管理目标不包含（）。
A、调整、规划和组织　　B、内部构建、外部采购和实施
C、交付、服务和支持　　D、设计和部署

22、组织的IT目标不包括（）。
A、组织的IT战略应与业务战略保持一致
B、提高信息系统的安全性、可靠性及有效性
C、保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效
D、充分识别与评估相关IT风险

23、需要根据审计目的和投入的审计成本来确定是IT审计的（）。
A、总体范围　　B、组织范围　　C、物理范围　　D、逻辑范围

24、审计人员只能评估其风险水平而不能对其实施控制和影响，其风险水平的衡量由于需要兼顾传统内部控制的思想和计算机系统管理的知识，因而较为复杂且难以准确计量，这种风险是（）。
A、固有风险　　B、控制风险　　C、检查风险　　D、测试风险

25、（）是指为了达到预期目的，在制订调研计划的基础上，通过书面或口头回答问题的方式收集研究对象的相关资料，并做出分析、综合，得到某一结论的研究方法。
A、访谈法　　B、调查法　　C、检查法　　D、观察法

26、（）是在风险分析的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，对风险程度进行划分，以揭示影响成败的关键风险因素。
A、风险识别技术　　B、风险分析技术　　C、风险评价技术　　D、风险应对技术

27、（）是从人作为分析主体和需求主体的视角出发，强调基于人机交互的、符合人的认知规律的分析方法，目的是将人所具备的、机器并不擅长的认知能力融入数据分析过程中。
A、计算机辅助审计技术　　B、大数据可视化分析技术
C、审计抽样技术　　D、大数据智能分析技术

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

28、（）指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系。
A、充分性　　B、客观性　　C、相关性　　D、可靠性

29、以下关于审计工作底稿，说法错误的是（）。
A、内容要求包括资料翔实、重点突出、繁简得当、结论明确；
B、业务类工作底稿指审计人员在审计实施阶段为执行具体审计程序所形成的审计工作底稿，包括：符合性测试中形成的内部控制问题调查表和流程图、实质性测试中形成的项目明细表等
C、审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。它形成于审计过程，也反映整个审计过程。
D、审计工作底稿可详可略，可正式也可以非正式。

30、整理审计证据属于（）阶段的内容。
A、审计准备　　B、审计实施　　C、审计终结　　D、后续审计

31、在IT治理框架中，下列（）治理域包含信息技术的战略，以及支撑战略的组织和架构。
A、管理体系治理域　　B、资源治理域　　C、顶层设计治理域　　D、投资管理治理域

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十章 信息系统管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 7 题

信息系统战略三角不包括（7）。

A、安全技术　　B、业务战略　　C、组织机制　　D、信息系统

2、2023 年 5 月第 8 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

数据管理能力成熟度模型(DCMM)将组织的管理成熟度划分为 5 个等级，每个级别中数据的重要程度会有所不同，从（8）开始强调数据管理的规范化，数据被当做实现组织绩效目标的重要资产。

A、量化管理级　　B、稳健级　　C、优化级　　D、受管理级

3、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

组织意识到数据是资产，根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关人员进行初步管理是（）的特点。

A、初始级　　B、受管理级　　C、稳健级　　D、量化管理级

4、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

CIA 三要素不包括（）。

A、保密性　　B、完整性　　C、可用性　　D、不可抵赖性

5、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下关于数据安全的说法，错误的是（）。

A、组织的数据安全能力域通常包括数据安全策略、数据安全管理和数据安全审计、数据安全改进 4 个能力项

B、数据安全策略是数据安全的核心内容，在制定的过程中需要结合组织管理需求、监管需求以及相关标准等统一制定。

C、数据安全管理是在数据安全标准与策略的指导下，通过对数据访问的授权、分类分级的控制、监控数据的访问等进行数据安全的管理工作，满足数据安全的业务需要和监管需求，实现组织内部对数据生存周期的数据安全管理。

D、数据安全审计是一项控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的策略、标准和活动。数据安全审计的目标是为组织以及外部监管机构提供评估和建议。

6、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在数据质量中，（）是数据管理和数据应用各项工作有序开展的基础，是数据治理沟通和实施的依据。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、数据治理组织　　B、数据制度建设　　C、数据治理沟通　　D、数据安全管理

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是高效做事。

A、技术　　B、资源　　C、人员　　D、过程

8、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不是迈克尔·波特提出的战略框架。

A、差异性战略　　B、总成本领先战略　　C、专注战略　　D、增长型战略

9、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

以下（）不是数据治理能力域的内容。

A、数据治理组织　　B、数据制度建设　　C、数据治理沟通　　D、数据标准建设

10、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）架构中使用的软件通常被引向软件即服务（SaaS）的相关架构，同时，这些应用程序在通过互联网交付时也被称为Web服务。

A、集中式架构　　B、主机架构　　C、分布式架构　　D、面向服务的系统架构（SOA）

11、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

当业务对新应用和快速设计迭代要求较高时，用（）。

A、集中式架构　　B、主机架构　　C、分布式架构　　D、面向服务的系统架构（SOA）

12、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

以下关于数据生存周期能力域的说法中，错误的是（）。

A、组织的数据生存周期能力域通常包括数据需求、数据设计和开发、数据运维和数据退役四个能力项。

B、数据设计和开发是对历史数据的管理，根据法律法规、业务、技术等方面需求，对历史数据的保留和销毁，执行历史数据的归档、迁移和销毁工作。

C、数据需求是指组织对业务运营、经营分析和战略决策过程中产生和使用数据的分类、含义、分布和流转的描述。

D、数据运维是指数据平台及相关数据服务建设完成上线投入运营后，对数据采集、数据处理、数据存储等过程的日常运行及其维护过程。

13、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

GB/T28827.1《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》定义的IT运维能力模型包含治理要求、运行维护服务能力体系和价值实现，其中（）为价值实现赋能。

A、用户需求　　B、治理要求　　C、战略要求　　D、运维服务能力体系

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

信息系统的运维和服务中，IT 服务管理是通过主动管理和流程的持续改进来确保 IT 服务交付有效且高效的一组活动，（）不属于 IT 服务管理的活动。

A、服务台　　B、事件管理　　C、过程开发　　D、配置管理

15、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

信息安全管理的 CIA 三要素指的是（）。

A、一致性、可用性、完整性　　B、保密性、有效性、可用性

C、一致性、可用性、有效性　　D、保密性、完整性、可用性

16、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在数据管理领域，数据管理能力成熟度模型(DCMM)，将组织的管理成熟度划分为初始级、（）、稳健级、量化管理级和优化级。

A、可进阶级　　B、发展级　　C、受管理级　　D、安全级

17、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

信息系统战略三角包括( )。

A、业务战略、技术战略和组织机制

B、业务战略、组织机制和信息系统

C、技术战略、组织管理和信息系统

D、发展战略，技术战略和组织管理

18、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于数据生存周期相关的描述，正确的是（）。

A、数据规划的核心是收集、评审需求并更新数据标准

B、数据退役的核心是监控数据提供方服务水平，确保数据持续可用

C、数据运维工作包括设计数据保留策略并制定归档流程以满足法规要求

D、数据设计和开发是提供数据应用，持续满足组织的数据需求的过程

19、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于 IT 服务管理相关内容的描述，正确的是（）。

A、可用性管理聚焦于在服务中断时快速诊断并实施临时修复方案

B、服务台的职责是制定服务目录并监控服务绩效以实现 SLA 目标

C、发布管理用于审查变更请求的适用性以避免与其他计划活动冲突

D、配置管理的核心是通过技术手段识别并记录所有配置项及其相互关系

20、2025 年 5 月第 2 批

马军老师·购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

依据国家标准 GB/T36073《数据管理能力成熟度评估模型》，组织的数据应用能力域不包括（）。

A、数据服务　　B、数据开放共享　　C、数据分类分级　　D、数据分析

21、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某信息系统近期频繁发生服务中断的故障，应启动（）程序。

A、容量管理　　B、发布管理　　C、问题管理　　D、事件管理

22、2026 年 5 月第 1 批

数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）包括组织、技术、数据、资源 4 个通用能力域，以及数据化运营、数字化生产和（ ）3 个业务能力域。

A、数字化营销　　B、数字化服务　　C、数字化创新　　D、数字化协同

23、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

（ ）能够防御免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾害。

A、第一级安全保护能力　　B、第二级安全保护能力

C、第三级安全保护能力　　D、第四级安全保护能力

24、2026 年 5 月第 1 批

（ ）是针对信息系统解决方案的定义、采购和实施，以及它们与业务流程的整合，（ ）是针对信息系统的性能监控及其与内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一致性管理。

A、规划和组织、设计和实施　　B、规划和组织、运维和服务

C、设计和实施、优化和持续改进　　D、运维和服务、优化和持续改进

25、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

数据管理能力成熟度模型（DCMM）将组织的管理成熟度划分为 5 个等级，每个级别中数据的重要程度会有所不同，（ ）数据被认为是获取竞争优势的重要资源，数据管理的效率能监控。

A、优化级　　B、稳健级　　C、量化管理级　　D、受管理级

26、2026 年 5 月第 2 批

DCMM 的数据架构能力域中，在（）能力项定义数据相关工作优先级和指定数据责任人。

A、数据分布　　B、元数据管理　　C、数据模型　　D、数据集成与共享

27、2026 年 5 月第 2 批

关于信息系统设计和实施的描述，不正确的是（）。

A、组织必须从业务战略开始，使用业务战略确定目标，形成业务需求并转换为信息系统

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

架构要求

B、集中式架构、分布式架构、面向产品的系统架构是三种常见信息系统体系架构模式

C、应用级信息系统除业务应用外还须考虑设备、操作环境、数据库和程序组件

D、转换框架将业务战略转化为信息系统架构进而转变为信息系统设计

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、信息系统战略不包括（）。

A、总成本领先战略　　B、差异性战略　　C、专注化战略　　D、分析型战略

2、以下说法，错误的是（）。

A、信息系统体系架构有三种常见模式：集中式架构、分布式架构、面向服务的系统架构（SOA）

B、集中式体系架构在某些方面更易于管理，因为所有功能都集中在主机或小型机中，而不是分布在所有设备和服务器中。集中式架构往往更适合具有高度集中式治理的组织。

C、当发生了几个看起来具有相同或相似根本原因的事件时，就会启动事件管理活动。

D、组织通常使用 IT 管理工具来促进对用户终端计算机的高效和一致的管理。一般来说，最终用户计算机是“锁定”的，这限制了最终用户可能在其设备上执行的配置更改的数量和类型，包括操作系统配置、补丁安装、软件程序安装、使用外部数据存储设备等，最终用户可能会将此类限制视为不便。

3、DCMM 将组织的管理成熟度划分为 5 个等级：初始级、受管理级、稳健级、量化管理级和优化级。其中数据已被当做实现组织绩效目标的重要资产，在组织层面制定了系列的标准化管理流程，促进数据管理的规范化是（）级。

A、初始级　　B、稳健级　　C、量化管理级　　D、优化级

4、确保 IT 运维能“保障做事”的是（）。

A、人员　　B、资源　　C、技术　　D、过程

5、应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难，以及其他相当程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能，是第（）的要求。

A、一级　　B、二级　　C、三级　　D、四级

6、智能运维需具备若干智能特征，智能特征不包括（）。

A、能感知　　B、会描述　　C、自学习　　D、自评估

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

7、下列说法中，错误的是（）。
A、智能运维能力框架包括组织治理、智能特征、智能运维场景实现、能力域和能力要素。
B、组织通过场景分析、场景构建、场景交付和效果评估四个过程，基于数据管理能力域提供的高质量数据，结合分析决策能力域做出合理判断或结论，并根据需要驱动自动控制能力域执行运维操作，使运维场景具备智能特征，提升智能运维水平，实现质量可靠、安全可控、效率提升、成本降低。
C、能力应用以运维场景为中心，通过场景分析、能力构建、服务交付、迭代调优四个关键环节，可以使运维场景具备智能特征。根据复杂程度，运维场景分为单一场景、复合场景和全局场景。
D、等级保护对象受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害，或者对国家安全造成严重危害是安全保护等级第 3 级的说明。

8、以下说法错误的是（）。
A、信息系统管理覆盖四大领域：（1）规划和组织（2）设计和实施（3）运维和服务（4）优化和持续改进
B、业务战略，可以推动组织机制和信息系统的有机融合。
C、容量管理用于确认信息系统中有足够的容量满足服务需求。容量管理由三个子过程组成：业务容量管理、服务容量管理、资源容量管理。
D、配置管理的目标是确保使用标准化的方法和程序来高效、及时地处理所有更改，以最大限度地减少与变更相关的事件对服务质量造成的影响，从而改善组织的日常运行。

9、六西格玛倡导的五阶段方法 DMAIC/DMADV，（）阶段目标包括价值流分析、信息系统异常的源头分析和确定优化改进的驱动因素。
A、分析阶段　　B、度量阶段　　C、定义阶段　　D、控制验证阶段

10、以下说法中，错误的是（）。
A、组织的数据战略能力域通常包括数据战略规划、数据战略实施和数据战略评估三个能力项。
B、组织的数据治理能力域通常包括数据治理组织、数据制度建设和数据治理沟通三个能力项。
C、组织的数据架构能力域通常包括数据模型、数据分布、数据集成与共享和元数据管理四个能力项
D、组织的数据生存周期能力域通常包括数据需求、数据设计和开发、数据运维三个能力项。

11、管理信息系统运行的管理控制主要活动包括过程开发、标准制定、资源分配、过程管理，其中（）是从运行执行任务的方式到所使用的技术，采用标准化定义和约束，从而有效推动信息系统运行相关工作的一致性。
A、过程开发　　B、标准制定　　C、资源分配　　D、过程管理

12、（）是服务中与服务干系人沟通和交互的重要界面，负责对服务干系人遇到的问题和需求进

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

行响应和处理。
A、服务台　　B、事件管理　　C、问题管理　　D、服务级别管理

13、（）对数据质量检查过程中发现的数据质量问题及相关信息进行分析，找出影响数据质量的原因，并定义数据质量问题的优先级，作为数据质量提升的参考依据。
A、数据质量分析　　B、数据质量需求　　C、数据质量检查　　D、数据质量提升

14、（）通过对组织中核心数据元的标准化，可以使数据的拥有者和使用者对数据有一致的理解。
A、数据元　　B、指标数据　　C、元数据　　D、参考数据和主数据

15、（）识别服务需求并遵循能力管理的要求对服务场景进行完整的策划。
A、服务需求　　B、服务提供　　C、服务价值　　D、服务部署

16、针对信息系统服务的运行交付和支持，包括安全的是（）。
A、规划和组织　　B、设计和实施　　C、运维和服务　　D、优化和持续改进

17、（）其主体系统通常部署于数据中心，以消除管理物理分离的基础设施带来的困难。
A、集中式架构　　B、分布式架构　　C、面向服务的系统架构　　D、软件即服务（SaaS）

18、（）应测量和管理所有信息系统运行的相关过程，确保过程在时间上和预算目标内被正确和准确地执行。
A、过程开发　　B、标准制定　　C、资源分配　　D、过程管理

19、（）是对IT服务的级别进行定义、记录和管理，并在可接受的成本之下与干系人达成一致的管理过程。
A、服务级别管理　　B、问题管理　　C、变更管理　　D、配置管理

20、( )目标包括流程定义、指标定义、流程基线和度量系统分析。
A、定义阶段　　B、度量阶段　　C、分析阶段　　D、改进/设计阶段

21、（）不属于数据应用能力域的能力项。
A、数据分析　　B、数据开放共享　　C、数据服务　　D、数据制度建设

22、（）是一项控制活动，负责定期分析、验证、讨论、改进数据安全管理相关的策略、标准和活动。
A、数据安全审计　　B、数据安全策略　　C、数据安全管理　　D、数据制度建设

23、数据元主要活动和工作要点不包括（）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、建立数据元的分类和命名规则
B、数据元的查找和引用
C、建立数据元的统一目录
D、元数据的创建

24、制定数据恢复检查机制，定期检查退役数据状态，确保数据在需要时可恢复属于（）的内容。
A、数据退役　　B、数据需求　　C、数据设计和开发　　D、数据运维

25、组织意识到数据是资产，根据管理策略的要求制定了管理流程，指定了相关人员进行初步管理属于（）的特点。
A、初始级　　B、受管理级　　C、稳健级　　D、量化管理级

26、（）是“正确做事”。
A、人员　　B、资源　　C、过程　　D、技术

27、对于（）管理，至少应根据不同场景要求，配置开放共享服务管理所需要的算力、带宽、存储等。
A、资源　　B、数据　　C、算法　　D、人员

28、（）是指基于运维场景分析的结果和目标要求，应用赋能平台中适合运维场景数据特点的加工处理能力、系统性设计数据的处理流程，构建符合特定运维场景需求的智能运维解决方案。
A、场景分析　　B、能力构建　　C、服务交付　　D、迭代调优

29、（）指具备对人、活动和对象进行分析、定位、判断的特点。
A、自学习　　B、会诊断　　C、可决策　　D、自执行

30、CIA三要素不包括（）。
A、保密性　　B、完整性　　C、可用性　　D、可审查性

31、等级保护对象受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重危害，或者对国家安全造成严重危害是（）的特征。
A、第一级　　B、第二级　　C、第三级　　D、第四级

32、应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难，以及其他相当程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能是（）的安全保护能力。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、第一级　　B、第二级　　C、第三级　　D、第四级

33、信息系统指的不仅仅是组件，这些组件必须根据设计蓝图进行组装，硬件、软件、数据和（）必须以一致的模式组合在一起，才能拥有可行的信息系统。
A、网络　　B、安全　　C、信息　　D、项目管理

34、2017年11月第15题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

GB/T 22240-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》标准将信息系统的安全保护等级分为五级。“信息系统收到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害”是（15）的特征。

A、第二级　　B、第三级　　C、第四级　　D、第五级

35、2019年5月第16题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

信息安全等级保护管理办法中，如果信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害，则该系统应该受到（16）保护。

A、第二级　　B、第三级　　C、第四级　　D、第五级

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十一章　信息系统工程

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第9题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在常用的OOD原则中，（9）原则是一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解，该原则与结构化方法的（9）原则是一致的。

A、单职 高内聚　　B、组合重用 低耦合　　C、迪米特 低耦合　　D、开闭 高内聚

2、2023年5月第10题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（10）是（10）的基础，二者的目的都是为了在系统崩溃或灾难发生时能够恢复数据或系统。

A、数据容灾 数据备份　　B、数据存储 数据安全

C、数据安全 数据存储　　D、数据备份 数据容灾

3、2023年5月第11题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

从信息系统集成技术角度来看，（11）在最上层。主要解决（11）问题。

A、数据集成　互通　　B、网络集成　互连

C、软件集成　互适应　　D、应用集成　互操作性

4、2023年5月第12题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（12）是防止非法实体对交换数据的修改、插入、删除以及在数据交换过程中的数据丢失。

A、对等实体认证服务　　B、数据保密服务

C、数据完整性服务　　D、数据源点认证服务

5、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）包括多种保密服务，为了防止网络中各系统之间的数据被截获或被非法存取而泄密，提供密码加密保护。

A、数据保密服务　B、对等实体认证服务　C、数据完整性服务　D、禁止否认服务

6、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

数据标准化的主要内容不包含（）。

A、数据安全化标准　B、数据元标准化　　C、元数据标准化　　D、数据标准化管理

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

以下说法中，错误的是（）。

A、CORBA是OMG进行标准化分布式对象计算的基础

B、DCOM作为COM的扩展，不仅继承了COM优点，而且针对分布环境还提供了一些新

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

的特性，如位置透明性、网络安全性、跨平台调用

C、COM+为 COM 的新发展或 COM 更高层次上的应用，其底层结构仍然以 COM 为基础，几乎包容了 COM 的所有内容

D、J2EE 的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层和信息系统层。

8、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

网络服务主要包括互联网服务、多媒体信息检索、信息点播、信息广播、远程计算和事务处理以及其他信息服务等是（）的内容。

A、传输子系统　　B、交换子系统　　C、网络操作系统　　D、服务子系统

9、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

（）描述了一般事物与该事物中的特殊种类之间的关系，也就是父类与子类之间的关系。

A、泛化　　B、继承　　C、实现　　D、依赖

10、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

以下关于数据清理的说法中，错误的是（）。

A、数据分析：是指从数据中发现控制数据的一般规则，比如字段域、业务规则等，通过对数据的分析，定义出数据清理的规则，并选择合适的清理算法。

B、数据检测：是指根据预定义的清理规则及相关数据清理算法，检测数据是否正确，比如是否满足字段域、业务规则等，或检测记录是否重复。

C、数据修正：是指手工或自动地修正检测到的错误数据或重复的记录。

D、数据清理主要包括数据分析、数据检测和数据修正、数据导入四个步骤

11、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型和对象关系模型属于（）。

A、概念模型　　B、逻辑模型　　C、物理模型　　D、信息模型

12、2023 年 11 月第 4 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是指当有新版本发布的时候，先少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布；如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。

A、蓝绿部署　　B、金丝雀部署　　C、虚拟机部署　　D、持续部署

13、2023 年 11 月第 4 批

（）确立代码与事物或概念之间的——对应关系，以保证数据的准确性和相容性，为信息集成与资源共享提供良好的基础。

A、元数据标准化　　B、数据元标准化

C、数据模式标推化　　D、数据分类与编码标准化

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、2023 年 11 月第 4 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于应用集成的技术要求。

A、系统中应用分布的透明性

B、应用间数据的存储

C、分布式环境中应用的可移植性

D、应用间的互操作性

15、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

软件过程能力成熟度模型(CSMM)包括治理、开发与交付、管理与支持、（）四个能力域。

A、数据管理　　B、组织管理　　C、战略管理　　D、运营管理

16、2024 年 5 月第 1 批

依据 ISSE-CMM 中公共特性的成熟度等级定义,（）不属于 ISSE-CMM 的 Level2:规划和跟踪级。

A、将过程域执行的方法形成标准化和程序化文档

B、对组织的标准化过程族进行裁剪

C、在执行过程域中，使用文档化的标准和程序

D、验证过程与可用标准的一致性

17、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）定位于在并发事务中保证数据库中数据的逻辑一致性。

A、保证数据库的完整性　　B、保证数据的操作完整性

C、保证数据的语义完整性　　D、防止非法的数据访问

18、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在应用集成中，有多个组件帮助协调连接各种应用。其中（）利用特定的数据结构，帮助开发人员快速访问其他应用的功能。

A、事件驱动型操作　　B、API　　C、数据映射　　D、RNN

19、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于白盒测试方法。

A、静态测试　　B、功能测试　　C、人工检查代码逻辑　　D、语句覆盖

20、2024 年 5 月第 2 批

由安全机制、OSI 网络参考模型、安全服务三个轴形成的信息安全系统三维空间中，操作系统漏洞检测与修复属于（）。

A、平台安全　　B、应用完全　　C、通信安全　　D、授权和审计安全

马老师购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

21、2024 年 5 月第 2 批

实现异构数据源的数据集成，首先需要（）。

A、进行数据清洗　　B、实施数据标注　　C、获取原始数据　　D、矫正数据质量

22、2024 年 5 月第 2 批

制定一个数据元标准的步骤是（）。

①界定业务范围

②开展业务流程分析与信息建模

③描述数据的内容，质量等信息

④提取数据元并规范属性

⑤发布数据元标准并维护

A、①②③⑤④　　B、③①②④⑤　　C、①④②③⑤　　D、③①④②⑤

23、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在安全工程中，关于安全服务的描述，正确的是（）。

A、禁止否认服务由不得否认发送和不得否认接收两种服务组成

B、数据完整性服务不包括数据交换过程中的数据丢失

C、对等实体认证服务用于确认通信双方实体的合法性及有效性

D、数据保密服务可提供链接方式、环接方式和桥接方式三种数据保密

24、2025 年 5 月第 1 批

在软件集成中，关于软件标准的描述，正确的是（）。

A、DCOM 是分布式组件对象模型，主要用于本地组件通信

B、COM+把 COM 组件软件提升到应用层，与操作系统的结合更加紧密

C、J2EE 是一种基于 Java 的桌面应用程序开发平台

D、CORBA 是一种基于.NET 框架的集成技术

25、2025 年 5 月第 1 批

数据只有得到充分的()才能发挥出它的作用。通过数据集成、数据挖掘和数据服务、数据可视化、信息检索等技术手段帮助数据用户从()中找到所需要的数据，并将数据以一定的方式展现出来，实现对数据的（）。

A、开发利用 数据目录 价值共享　　B、开发利用 数据资源 开发利用

C、价值评估 数据资源 价值共享　　D、价值评估 数据目录 开发利用

26、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

软件过程能力成熟度模型(CSMM)4 个能力域包括（）。

①战略与规划②开发与交付③管理与支持④组织管理⑤治理

A、①②④⑤　　B、①②③④　　C、①②③⑤　　D、②③④⑤

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

27、2025 年 5 月第 1 批

在如下数据表的相关描述中，4003、王亮、45 是（）。

User ID	User Name	Age
4003	王亮	45
4004	张三	20

A、主数据　　B、数据元　　C、元数据　　D、元元数据

28、2025 年 5 月第 2 批

对于新建信息系统的数据源提取，一般适用（）提取法？在（）的基础上分析提取数据源及其属性。

A、自下而上　　概念数据模型和逻辑数据模型

B、自上而下　　概念数据模型和逻辑数据模型

C、自上而下　　逻辑数据模型和物理数据模型

D、自下而上　　逻辑数据模型和物理数据模型

29、2025 年 5 月第 2 批

数据集成的目的是为应用提供（）的访问支持，因此集成后的数据必须保证（）。

A、实时　正确性　　B、实时　完整性

C、统一　正确性　　D、统一　完整性

30、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于数据挖掘与传统数据分析的描述，不正确的是（）。

A、两者都是主要运用统计学的方法和手段对数据进行分析

B、数据挖掘通常是预测型和发现型的，预测未来的情况.

C、数据挖掘所需的数据量比传统数据分析所需的数据量大

D、传统数据分析通常是回顾型和验证型的，分析已经发生了什么

31、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下测试内容属于黑盒测试方法的是（），该方法属于（）。

A、控制流测试　静态测试　　B、结构测试　静态测试

C、功能测试　动态测试　　D、代码走查　动态测试

32、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

系统集成涉及网络集成、数据集成、软件集成、应用集成。以下相关描述，不正确的是（）。

A、软件集成重点关注工作流层面的连接，其主要目的是将数据按照一定规则组合并实现其业务价值

B、在技术上，系统集成要遵循的基本原则包括开放性、结构化、先进性和主流化

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、应用集成是指将独立的软件应用连接起来，实现协同工作，通常涉及应用编程接口和数据映射

D、数据集成处理的主要对象是系统中各种异构数据库中的数据，数据仓库技术是数据集成的主要技术

33、2026 年 5 月第 1 批

国际标准化组织提出了概念，要求按共同约定的规则进行统一组织、分类和标识数据，规范统一数据的含义、表示方法和取值范围等，保证数据从产生的源头就具备一致性。“一数一源”指的是（ ）。

A、元数据标准化　　B、数据元标准化

C、数据模式标准化　　D、数据分类与编码标准化

34、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在 ISSE 信息系统安全工程的成熟度等级中，包含“协调安全实施”公共特性的是哪一级（ ）。

A、Level2 规划和跟踪级　　B、Level1 非正规实施级

C、Level3 充分定义级　　D、Level4 量化控制级

35、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

黑盒测试是根据 SRS 所规定的功能来设计测试用例的方法，一般不包括（）。

A、随机测试　　B、边界值分析　　C、数据流测试　　D、等价类划分

36、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

安全服务包括对等实体认证服务、数据保密服务、数据完整性服务、数据源点认证服务、禁止否认服务等。政府电子公文系统使用数字签名属于（），员工通过电子合同签署平台签署劳务合同属于（）。

A、对等实体认证服务　禁止否认服务　　B、禁止否认服务　数据源点认证服务

C、数据源点认证服务　禁止否认服务　　D、数据保密服务　对等实体认证服务

37、2026 年 5 月第 2 批

数据模式描述方法中，（）用来描述数据集、单个实体、属性的摘要信息。

A、图描述方法　　B、UML 图方法　　C、IDEFIX 方法　　D、数据字典方法

38、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于应用集成与数据集成的描述，不正确的是（ ）。

A、应用集成是在功能层面将多个应用直接连接起来

B、数据集成负责数据的高效存储以及数据的共享与应用

C、应用集成不需要太多的存储空间和计算空间

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、数据集成是将系统中的数据按一定的规则组织成为一个整体

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下说法中，错误的是（）。

A、从目前已有的软件架构评估技术来看，可以归纳为三类主要的评估方式，分别是基于调查问卷（或检查表）的方式、基于场景的方式和基于度量的方式。

B、独立构件风格是指包括进程通信和事件驱动的系统

C、需求是多层次的，包括业务需求、用户需求和系统需求

D、QFD 将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和过渡需求。

2、以下说法中，错误的是（）。

A、需求过程：主要包括需求获取、需求分析、需求规格说明书编制、需求验证与确认等

B、使用结构化分析（SA）方法进行需求分析。一般使用实体关系图（E-R 图）表示数据模型，用数据流图（DFD）表示功能模型，用状态转换图（STD）表示行为模型。

C、构件图描述一个封装的类和它的接口、端口，以及由内嵌的构件和连接件构成的内部结构。

D、面向对象设计（OOD）是 OOA 方法的延续，其基本思想包括抽象、封装和可扩展性，其中可扩展性主要通过继承和泛化来实现。

3、以下说法中，错误的是（）。

A、使用静态测试的方法也可以实现白盒测试。例如，使用人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于白盒测试的范畴

B、容器技术目前是部署中最流行的技术。

C、蓝绿部署是指当有新版本发布的时候，先让少量用户使用新版本，并且观察新版本是否存在问题。如果出现问题，就及时处理并重新发布；如果一切正常，就稳步地将新版本适配给所有的用户。

D、不可变服务器是一种部署模式，是指除了更新和安装补丁程序以外，不对服务器进行任何更改。

4、CSMM 模型中，组织管理能力域包括过程管理、人员能力管理、组织资源管理、（）能力子域。

A、过程能力管理　　B、项目监控　　C、开源应用　　D、质量保证

5、在软件过程能力成熟度等级中，其中：在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标，属于（）的结果特征。

A、初始级　　B、项目规范级　　C、组织改进级　　D、量化提升级

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

6、（）是考虑各种具体的技术实现因素，进行数据库体系结构设计，真正实现数据在数据库中的存放。

A、概念模型　　B、逻辑模型　　C、物理模型　　D、信息模型

7、以下说法中，错误的是（）。

A、数据建模过程包括数据需求分析、概念模型设计、逻辑模型设计和物理模型设计等过程

B、元数据是关于数据的数据

C、数据元是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。

D、数据备份结构可以分为四种：NAS 备份结构、基于 LAN 的备份结构、LANFREE 备份结构和 SERVER-FREE 备份结构。常见的备份策略主要有三种：完全备份、差分备份和增量备份。

8、以下说法中，错误的是（）。

A、数据质量元素分为数据质量定量元素和数据质量非定量元素。

B、数据产品的质量控制分成前期控制、中期控制和后期控制三部分。

C、数据清理的三个步骤：数据分析、数据检测和数据修正。

D、数据服务主要包括数据目录服务、数据查询与浏览及下载服务、数据分发服务。

9、以下说法中，错误的是（）。

A、数据可视化主要运用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成为图形或图像在屏幕上显示出来，并能进行交互处理。

B、传输介质分为无线传输介质和有线传输介质两大类。常用的无线传输介质主要包括无线电波、微波、红外线等，常用的有线传输介质主要包括双绞线、同轴电缆、光纤等。

C、数据集成可以分为基本数据集成、多级视图集成、模式集成和多粒度数据集成四个层次。

D、ISSE 将信息安全系统工程实施过程分解为：工程过程、风险过程和保证过程、控制过程四部分。

10、下面说法错误的是（ ）。

A、在架构评估过程中，评估人员所关注的是系统的质量属性。

B、UML 是一种定义良好、易于表达、功能强大且普遍适用的编程语言。

C、使用结构化分析（SA）方法进行需求分析，其建立的模型的核心是数据字典。

D、软件需求规格说明书（SRS）是需求开发活动的产物。

11、在结构化设计中需要遵循的基本原则是（ ）。

A、高内聚高耦合　　B、继承和多态　　C、高内聚低耦合　　D、封装和可扩展

12、下列说法不正确的是（ ）。

A、对代码的动态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查；

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、Alpha测试是指由用户在开发环境下进行测试；Beta测试是指由用户在实际使用环境下进行测试；
C、黑盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中；
D、白盒测试方法主要有控制流测试、数据流测试和程序变异测试等。

13、下面哪项不属于安全服务的内容（）。
A、对等实体认证服务　　B、数据保密服务　　C、数据验证服务　　D、禁止否认服务

14、（）是将数据模型转换为真正的数据库结构，还需要针对具体的DBMS进行物理模型设计，使数据模型走向数据存储应用环节。
A、数据需求分析　　B、概念模型设计　　C、逻辑模型设计　　D、物理模型设计

15、ISSE-CMM体系结构中，建立可测度的质量目标是（）的公共特性。
A、量化控制级　　B、充分定义级　　C、持续改进级　　D、规划和跟踪级

16、（）对已经获取到的需求进行提炼、分析和审查，以确保所有的项目干系人都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。
A、需求获取　　B、需求分析　　C、需求验证　　D、需求确认

17、（）包括解释器和基于规则的系统。
A、虚拟机风格　　B、独立构件风格　　C、数据流风格　　D、仓库风格

18、以下说法中，错误的是（）。
A、从目前已有的软件架构评估技术来看，可以归纳为三类主要的评估方式，分别是基于调查问卷（或检查表）的方式、基于场景的方式和基于度量的方式。这三种评估方式中，基于度量的评估方式最为常用。
B、需求是多层次的，包括业务需求、用户需求和系统需求。
C、QFD将软件需求分为三类，分别是常规需求、期望需求和意外需求。
D、需求过程主要包括需求获取、需求分析、需求规格说明书编制、需求验证与确认等

19、以下说法中，错误的是（）。
A、一般使用实体关系图（E-R图）表示数据模型，用数据流图（DFD）表示功能模型，用状态转换图（STD）表示行为模型。
B、软件需求规格说明书（SRS）是需求开发活动的产物，编制该文档的目的是使项目干系人与开发团队对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础。
C、需求评审就是对SRS进行技术评审，SRS的评审可以发现那些二义性的或不确定性的需求，为项目干系人提供在需求问题上达成共识的方法。
D、把杂乱无章的用户要求和期望转化为用户需求，这就是需求获取的工作。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、（）描述一组对象之间连接的结构关系。
A、依赖　　B、关联　　C、泛化　　D、实现

21、（）强调消息跨越不同对象或参与者的实际时间，而不仅仅只是关心消息的相对顺序。
A、类图　　B、构件图　　C、组合结构图　　D、定时图

22、（）视图对组成基于系统的物理代码的文件和构件进行建模。
A、逻辑视图　　B、进程视图　　C、实现视图　　D、部署视图

23、关于面向对象设计（OOD）的原则，说法错误的是（）。
A、开闭原则：对扩展封闭，对修改开放。
B、单职原则：设计功能单一的类。本原则与结构化方法的高内聚原则是一致的。
C、李氏替换原则：子类可以替换父类。
D、组合重用原则：要尽量使用组合，而不是继承关系达到重用目的。

24、以下关于设计模式，说法错误的是（）。
A、根据处理范围不同，设计模式可分为类模式和对象模式。
B、类模式处理类和子类之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译时刻就被确定下来，属于动态关系。
C、根据目的和用途不同，设计模式可分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三种。
D、结构型模式主要用于处理类或对象的组合

25、编码效率主要包括（）。
①程序效率　　②算法效率　　③存储效率　　④I/O效率
A、①②　　B、①②③　　C、③④　　D、①②③④

26、以下关于软件测试的说法中，错误的是（）。
A、静态测试是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。静态测试包括对文档的静态测试和对代码的静态测试。
B、对文档的静态测试主要以检查单的形式进行，而对代码的静态测试一般采用桌前检查、代码走查和代码审查。
C、白盒测试方法中，最常用的技术是逻辑覆盖，即使用测试数据运行被测程序，考查对程序逻辑的覆盖程度。
D、白盒测试也称为功能测试，主要用于集成测试、确认测试和系统测试中。

27、以下说法中，错误的是（）。
A、持续交付是一系列开发实践方法，用来确保让代码能够快速、安全地部署到生产环境中。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、在开发测试阶段，做到持续集成，让测试人员尽早进入项目开始测试
C、持续交付让软件在整个生命周期内都处于可部署的状态
D、持续交付让软件版本边界模糊化，不便于管理

28、关于持续部署，说法错误的是（）。
A、容器技术上手简单，轻量级架构，体积很小
B、容器技术的集合性更好，能更容易对环境和软件进行打包复制和发布；
C、部署方式采用蓝绿部署或金丝雀部署。
D、应根据环境的不同，使用不同的部署方式；

29、在软件过程能力成熟度等级中，在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标属于（）的特征。
A、1级:初始级　　B、2级:项目规范级　　C、3级:组织改进级　　D、4级:量化提升级

30、以下关于数据模型的说法中，错误的是（）。
A、可以将数据模型划分为三类：概念模型、逻辑模型和物理模型。
B、概念模型：也称信息模型，它是按用户的观点来对数据和信息建模，也就是说，把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个具体的DBMS，它是概念级别的模型。
C、概念模型是对现实世界的抽象和概括，它应该真实、充分地反映现实世界中事物和事物之间的联系，有丰富的语义表达能力，能表达用户的各种需求。
D、逻辑模型是考虑各种具体的技术实现因素，进行数据库体系结构设计，真正实现数据在数据库中的存放。

31、以下关于元数据和数据元的说法中，错误的是（）。
A、数据元是数据库、文件和数据交换的基本数据单元。
B、常用的数据元提取方法有两种：自上而下提取法和自下而上提取法。
C、对于新建系统的数据元提取，一般适用“自上而下”的提取法；对于已建系统的数据元提取，一般适用自下而上提取法。
D、元数据一般来说由三部分组成：①对象②特性③表示

32、数据管理机构对提交的数据标准建议、现行数据标准的修改或封存建议进行审查属于（）阶段的工作。
A、确定数据需求　　B、制定数据标准　　C、批准数据标准　　D、实施数据标准

33、以下说法中，错误的是（）。
A、数据备份结构可以分为四种：DAS备份结构、基于LAN的备份结构、LANFREE备份结构和SERVER-FREE备份结构。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、常见的备份策略主要有三种：完全备份、差分备份和增量备份
C、备份软件主要分为两大类：一是操作系统自带的软件，如麒麟操作系统的“备份”工具，这类软件实现的功能都很简单；二是专业备份软件，其能够实现比较全面的功能。
D、数据容灾是数据备份的基础。

34、以下关于数据质量的说法中，错误的是（）。
A、数据质量可以通过数据质量元素来描述，数据质量元素分为数据质量定量元素和数据质量非定量元素。
B、数据质量评价方法分为直接评价法和间接评价法
C、数据产品的质量控制分成前期控制和后期控制两个大部分
D、数据清理主要包括数据分析、数据检测和数据修正、数据导入四个步骤

35、数据挖掘与传统数据分析不同点包括（）。
①两者分析对象的数据量有差异，数据挖掘所需的数据量比传统数据分析所需的数据量大，数据量越大，数据挖掘的效果越好
②两者运用的分析方法有差异，传统数据分析主要运用统计学的方法、手段对数据进行分析，而数据挖掘综合运用数据统计、人工智能、可视化等技术对数据进行分析
③两者分析侧重有差异，传统数据分析通常是回顾型和验证型的，通常分析已经发生了什么，而数据挖掘通常是预测型和发现型的，预测未来的情况，解释发生的原因
④两者成熟度不同，传统数据分析由于研究较早，其分析方法相当成熟，而数据挖掘除基于统计学等方法外，部分方法仍处于发展阶段。
A、①②　　B、①②③　　C、①②③④　　D、②③④

36、以下说法中，错误的是（）。
A、数据服务主要包括数据目录服务、数据查询与浏览及下载服务、数据分发服务。
B、数据查询、浏览和下载是网上数据共享服务的重要方式，用户使用数据的方式有查询数据和下载数据两种。
C、层次数据实际上是二维数据的一种特例，即二维中有一维是时间轴。它以图形方式显示随着时间变化的数据，是可视化信息最常见、最有用的方式之一
D、网络数据指与任意数量的其他节点有关系的节点的数据。网络数据中的节点不受与它有关系的其他节点数量的约束(不同于层次节点有且只有一个父节点),网络数据没有固有的层次结构，两个节点之间可以有多条连接路径，也就是说节点间关系的属性和数量是可变的

37、（）是指从大量的、不完全的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中且人们事先不知道的潜在、有用的信息和知识的过程。
A、全文检索　　B、字段检索　　C、基于内容的多媒体检索　　D、数据挖掘

38、（）主要是通过检索式中的专门符号来规定检索词在结果中的相对位置。在某些情况下，

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

若不限制检索词之间的位置关系则会造成误检，影响查准率。
A、布尔逻辑检索技术　　B、截词检索技术　　C、临近检索技术　　D、限制检索技术

39、（）是数据库的第一道安全防线，是授权、审计等的前提条件。
A、标识和认证　　B、机密数据管理　　C、多级保护　　D、限界

40、系统集成在技术上需要遵循的基本原则包括：开放性、结构化、先进性和主流化。其中（）是把一个复杂系统分解成相对独立和简单的子系统，每一个子系统又分解成更简单的模块，这样自顶向下逐层模块化分解，直到底层每一个模块都是可具体说明和可执行的为止。
A、开放性　　B、结构化　　C、先进性　　D、主流化

41、（）主要任务是调度和管理网络资源，并为网络用户提供统一、透明使用网络资源的手段。
A、网络操作系统　　B、服务子系统　　C、服务器子系统　　D、网管子系统

42、下列关于数据集成的说法中，错误的是（）。
A、数据集成可以分为基本数据集成、多级视图集成、模式集成和多粒度数据集成四个层次。
B、多级视图机制有助于对数据源之间的关系进行集成：底层数据表示方式为局部模型的局部格式，高级数据表示为综合模型格式。
C、多粒度数据集成是异构数据集成中最难处理的问题，理想的多粒度数据集成模式是自动逐步抽象。
D、数据集成处理的主要对象是系统中各种异构数据库中的数据。数据库技术是数据集成的关键。

43、下列关于软件集成的说法中，错误的是（）。
A、CORBA是OMG进行标准化分布式对象计算的基础。
B、COM对象可能由各种编程语言实现，并为各种编程语言所引用。COM对象作为某个应用程序的构成单元，不但可以作为该应用程序中的其他部分，而且还可以单独地为其他应用程序系统提供服务。
C、DCOM作为COM的扩展，不仅继承了COM优点，而且针对分布环境还提供了一些新的特性，如位置透明性、网络安全性、跨平台调用。COM+为COM的新发展或COM更高层次上的应用。
D、J2EE的体系结构可以分为客户端层、服务器端组件层、EJB层3层。

44、下列关于应用集成的说法中，错误的是（）。
A、用语言做比喻，语法、语义、语用三者对应到系统集成技术上，网络集成解决语法的问题，数据集成解决语义的问题，应用集成解决语用的问题。
B、对应用集成的技术要求大致有：具有应用间的互操作性、具有分布式环境中应用的可移植性、具有系统中应用分布的透明性
C、如果一个子系统(构件或部分)可以从一个环境移植到另一个环境，称它是互操作的。
D、应用集成既可以部署在云端，集成SaaS CRM等云应用，也可以部署在受防火墙保护的本地，

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

集成传统ERP系统等，还可以部署在混合环境中，集成本地应用和托管在专用服务器上的云应用。

45、在信息安全空间中，说法错误的是（）。
A、X轴是“安全机制”
B、Y轴是“OSI网络参考模型”
C、Z轴是“安全服务”
D、由X、Y、Z三个轴形成的信息安全系统三维空间就是信息系统的“安全空间”。具有认证、权限、完整、加密和可审计五大要素，也叫作“安全空间”的五大属性。

46、（）主要包括操作系统漏洞检测与修复、网络基础设施漏洞检测与修复、通用基础应用程序漏洞检测与修复、网络安全产品部署等。
A、基础设施实体安全　　B、平台安全　　C、数据安全　　D、通信安全

47、（）用于确保数据发自真正的源点，防止假冒。
A、对等实体认证服务　　B、数据保密服务　　C、数据完整性服务　　D、数据源点认证服务

48、以下说法中，错误的是（）。
A、信息安全系统工程能力成熟度模型（ISSE-CMM）主要适用于工程组织、获取组织和评估组织。
B、ISSE将信息安全系统工程实施过程分解为：工程过程、风险过程和保证过程三部分。
C、规范化执行属于第2级：规划和跟踪级的特征
D、建立可测度的质量目标属于第5级：持续改进级的特性。

49、信息安全（）包含系统集成商、应用开发商、产品提供商和服务提供商等，这些组织可以使用ISSE-CMM对工程能力进行自我评估。
A、工程组织　　B、获取组织　　C、评估组织　　D、实施组织

50、以下说法中，错误的是（）。
A、需求过程主要包括需求获取、需求分析、需求规格说明书编制、需求验证与确认等。
B、需求获取是一个确定和理解不同的项目干系人的需求和约束的过程。
C、需求分析对已经获取到的需求进行提炼、分析和审查，以确保所有的项目干系人都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其他不足的地方。
D、需求测试就是对SRS进行技术评审。

51、（）表示类之间的整体与部分的关系。“部分”只能属于一个“整体”，“部分”与“整体”的生命周期相同。
A、组合聚集　　B、共享聚集　　C、实现　　D、泛化

52、以下关于软件设计的相关内容，说法中，错误的是（）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、结构化设计(SD)是一种面向数据流的方法，它以SRS和SA阶段所产生的DFD和数据字典等文档为基础，是一个自顶向下、逐步求精和模块化的过程。

B、在SD中，需要遵循一个基本的原则：高内聚，低耦合。

C、紧密耦合表示模块之间联系非常强，松散耦合表示模块之间联系比较弱，非耦合则表示模块之间无任何联系，是完全独立的。

D、李氏替换原则：扩展开放，对修改封闭。

53、数据的完整性和保密性是通过给予用户权限来实现的，用户只能访问拥有的权限所对应级别的数据，属于（）技术。

A、多级保护　　B、限界　　C、机密数据管理　　D、标识和认证

54、2017年11月第27题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（27）又称为设计视图，它表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的部分，即类、子系统、包和用例实现的子集。

A、逻辑视图　　B、进程视图　　C、实现视图　　D、用例视图

55、2018年5月第7题

老于是某银行的系统架构师，他为银行投资管理系统设计的软件架构包括进程通信和事件驱动的系统，该软件架构风格属于（7）。

A、数据流风格　　B、独立构件风格　　C、仓库风格　　D、虚拟机风格

56、2018年5月第9题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

软件测试是发现软件错误(缺陷)的主要手段，软件测试方法可以分为静态测试和动态测试，其中（9）属于静态测试。

A、代码走查　　B、功能测试　　C、黑盒测试　　D、白盒测试

57、2018年11月第7题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

软件需求是多层次的，包括业务需求、用户需求、系统需求，其中业务需求（7）。

A、反应了企业或客户对系统高层次的目标需求

B、描述了用户具体目标或者用户要求系统必须完成的任务

C、从系统角度来说明软件的需求，包括功能需求、非功能需求和设计约束

D、描述了用户任务系统应该具备的功能和性能

58、2018年11月第8题

关于设计模式的描述，不正确的是（8）。

A、设计模式包括模式名称、问题、目的、解决方案、效果、实例代码和相关设计模式等基本要素

B、根据处理范围不同，设计模式分为类模式和对象模式

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、根据目的和用途不同，设计模式分为创建型模式、结构型模式和行为型模式

D、对象模式处理对象之间的关系，这些关系通过继承建立，在编译的时刻就被确定下来，属于静态关系

59、2018年11月第27题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

UML的（27）描述了一个特定对象的所有可能状态以及由于各种事件的发生而引起的状态之间的转移。

A、控制图　　B、状态图　　C、协作图　　D、序列图

60、2019年5月第7题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

软件架构中，（7）模式包括主程序/子程序、数据抽象和面向对象，以及层次结构。

A、数据流　　B、调用/返回　　C、虚拟机　　D、独立构件

61、2019年11月第7题

在软件需求分析中，（7）分别用来表示功能模型和行为模型。

A、数据流图、状态转换图　　B、状态转换图、E-R图

C、状态转换图、数据流图　　D、E-R图、状态转换图

62、2020年11月第8题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

软件工程需求分析阶段，使用实体联系图表示（8）模型。

A、行为　　B、数据　　C、功能　　D、状态

63、2021年5月第9题

质量功能部署（QFD）将软件需求分为常规需求、（9）和意外需求。

A、期望需求　　B、业务需求　　C、系统需求　　D、行为需求

64、2022年5月第9题

使用结构化分析（SA）方法进行需求分析，围绕数据字典建立的三个层次的模型不包括（9）。

A、实体关系图　　B、业务流程图　　C、数据流图　　D、状态转换图

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十二章 项目管理概论

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 17 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（17）重在对项目进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致;（17）通过对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益。

A、项目集管理 组织级项目管理

B、项目组合管理 组织级项目管理

C、项目集管理 项目组合管理

D、项目组合管理 项目集管理

2、2023 年 5 月第 18 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目经理相关能力的描述，不正确的是（18）。

A、项目管理、战略和商务、领导力是项目经理需要关注的技能

B、人际交往占据项目经理的绝大部分工作内容

C、领导力关注近期目标，关注可操作性的问题和问题的解决

D、战略和商务技能有助于项目经理了解与项目相关的商业因素

3、2023 年 5 月第 19 题

关于项目管理原则中“驾驭复杂性原则”的描述，不正确的是（19）。

A、复杂性可能在项目生命周期的任何时间出现

B、影响价值、沟通、技术、风险的因素都可能造成复杂性

C、项目团队能够实时预测未来复杂性的出现并分析其原因

D、复杂性是由系统交互、不确定性和模糊性等造成的

4、2023 年 5 月第 20 题

关于项目价值的描述，不正确的是（20）。

A、项目存在于组织中，为干系人创造价值

B、价值以过程为导向并定量定义，以获得预期的经济收益为目标

C、项目可通过提高效率、生产力、效果或响应能力来创造价值

D、价值是项目成功的最终指标，可创造满足需要的新产品、服务或结果

5、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下关于项目价值的说法中，错误的是（）。

A、价值是指某种事物的作用、重要性或实用性。

B、价值是项目的最终成功指标和驱动因素。

C、项目的价值只可表现为财务收益值，不可表现为所取得的公共利益和社会收益

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、价值通过可交付物的预期成果来体现。项目的目的就是提供预期的成果，预期的成果通过有价值的解决方案来实现。可通过商业论证方式，从定性或定量方面说明项目成果的预期价值

6、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

以下（）属于引发项目的因素。

①符合法律法规或社会需求　　②满足干系人要求或需求

③创造、改进或修复产品、过程或服务　　④执行、变更业务或技术战略

A、①②③　　B、①②　　C、①②③　　D、①②③④

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注人际关系、团体与合作；服务优先于领导是（）。

A、放任型　　B、交易型　　C、服务型　　D、魅力型

8、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）属于启动过程组的内容？

A、识别干系人　　B、规划进度管理　　C、范围确认　　D、成本预算

9、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

（）识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动。

A、整合管理　　B、范围管理　　C、进度管理　　D、成本管理

10、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

在适应性项目中，启动过程组需要（），以便在开展执行和监控过程组时与他们频繁互动，获得的反馈意见能够确保项目交付出正确的成果。

A、识别出这些关键干系人　　B、进行回顾性审查

C、制定一套高层级计划　　D、维护未完项的清单

11、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

以下（）不属于组织过程资产？

A、过程资产　　B、治理文件　　C、安保和安全　　D、资源可用性

12、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

“领导力”指通过讨论或辩论方式与他人合作，带领他们从一个位置到另一个位置。（）不属于领导力。

A、创新　　B、挑战现状　　C、关注人际关系　　D、关注赢利

马军老师 购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

识别干系人属于（）的内容。

A、启动过程组　　B、规划过程组　　C、执行过程组　　D、监控过程组

14、2023年11月第4批

某跨国企业需要建设覆盖多个国家的人力资源系统，项目经理在规划系统建设时对系统覆盖多个国家的文化规范、语言、时区等问题进行了充分的调研，确保了该系统满足管理需要，这是价值驱动的项目管理原则中（）原则的体现。

A、展现领导力行为　　B、驾驭复杂性

C、为实现目标而驱动变革　　D、促进干系人参与

15、2023年11月第4批

关于项目的描述，不正确的是（）。

A、项目的需求不复存在，是项目宣告结束的情况之一

B、实现项目目标可能会产生一个或多个可交付成果

C、可交付成果可能会在项目终止后依然存在

D、项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的周期性工作

16、2024年5月第1批

关于项目经理的描述，不正确的是（）。

A、项目经理是发起人、团队成员与其他干系人之间的沟通者

B、项目经理领导项目团队实现项目目标

C、项目经理应该时刻关注行业的最新发展趋势

D、项目经理不可以是临时被委任的外部顾问

17、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和信息流。其中，价值交付组件包括（）。

①战略②项目组合③项目集④项目⑤运营⑥产品⑦市场环境

A、②③④⑤⑥　　B、②③④⑥⑦　　C、①②③④⑤　　D、①②③④⑥

18、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目集和项目组合的描述，不正确的是（）。

A、项目组合是为实现项目目标而组合在一起管理的项目集，子项目组合和运营工作的组合

B、项目集将一个大型复杂项目拆分后形成若干小项目形成的集合

C、项目组合经理通过项目组合的总体投资效果和实现效益来衡量项目组合的成功

D、项目集经理通过协调项目及组件的活动，确保项目集效益按预期实现

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

19、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

迭代型与增量型项目生命周期的特点是（）。

A、需求在交付期间频繁细化，在交付期间实时把变更融入项目

B、需求在交付期间定期细化，定期把变更融入项目

C、需求在开发前确定，尽量限制变更

D、针对最终可交付成果制定可交付计划，在项目结束时一次性交付最终产品

20、2025 年 5 月第 1 批

关于项目经理的职责，描述正确的是（）。

A、领导项目团队实现项目目标和干系人的期望

B、负责制定组织的长期战略目标并协调各部门资源

C、对组织内多个项目组合的最终成果承担管理责任，并独立制定项目集战略

D、监督某个职能部门的日常运营，确保业务高效执行

21、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目、项目集、项目组合的描述，不正确的是（）。

A、项目组合中的项目集或项目不一定存在彼此依赖或直接相关的关联关系

B、大型电网系统所辖项目包括建设输电线路，整合配电和用户端设备等，属于项目集管理

C、项目具有明确的目标且范围在整个生命周期中渐进明晰，应采用敏捷型方法管理项目

D、项目组合的成功通过项目组合的总体投资效果和实现的效益进行衡量

22、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

价值驱动的项目管理知识体系中，项目管理原则包括（）。

①营造协作的项目团队环境 ②促进干系人有效参与 ③聚焦于价值 ④专注于工作过程和能力 ⑤根据环境进行裁剪 ⑥处理采购事宜 ⑦驾驭复杂性

A、①②③④⑤　　B、①②③⑤⑦　　C、①③⑤⑥⑦　　D、②③④⑤⑥

23、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某医疗器械公司正在研发一款新型的医疗诊断设备，该设备需要符合严格的国家和国际医疗设备标准。但相关法规和标准不断更新,如果等产品开发完成后再进行合规性测试，可能会导致产品不符合最新的法规要求，无法通过干系人的验收,该项目适合采用（）的开发方法，项目经理需要具有（）领导风格。

A、适应型　　服务型　　B、适应型　　指导型

C、预测型　　变革型　　D、预测型　　权威型

24、2026 年 5 月第 1 批

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

关于项目经理的影响力范围，下列说法不正确的是（ ）。

A、项目经理可以指导和教育其他专业人员项目管理方法

B、项目经理需要与组织内其他项目经理开展互动协作

C、项目经理应该时刻关注行业的最新发展趋势

D、项目经理离职不需要向职能经理汇报

25、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）属于组织内部事业环境因素。

A、商业数据库　　B、行业标准　　C、市场条件　　D、员工能力

26、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于迭代型与增量型生命周期的特征。

A、在交付期间实时把变更融入项目

B、通过用新信息逐渐细化计划来控制风险和成本

C、关键干系人定期参与

D、分次交付整体项目或产品的各个子集

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为2部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力是（）领导力风格。

A、放任型　　B、交易性　　C、变革性　　D、魅力型

2、根据项目的背景及其目标、干系人、治理和环境的不同应用合适的项目开发方法，使用“合适”的过程来实现预期成果，同时最大化价值、管理成本并提高速度是（）原则。

A、勤勉、尊重和关心他人　　B、营造协作的项目管理团队环境

C、根据环境进行裁剪　　D、为实现目标而驱动变革

3、以下关于各生命周期的说法，错误的是（）。

A、预测型生命周期，需求在开发前预先确定。

B、适应型生命周期需要频繁交付对客户有价值的各个子集。

C、关键干系人定期参与是适应型生命周期的特点。

D、定期把变更融入项目是迭代型与增量型生命周期的特点。

4、以下关于组织结构对项目的影响，说法错误的是（）。

A、在强矩阵中，项目经理的权利是中到高。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、在弱矩阵中，项目经理的资源可用性少。
C、在虚拟的组织结构中，项目经理的资源可用性高
D、在职能型中，项目经理是兼职工作的。

5、以下关于项目集、项目组合、项目的关系，说法错误的是（）。
A、一个项目可以采用三种不同的模式进行管理：独立项目（不包括在项目集或项目组合中）、在项目集内、在项目组合内。
B、项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，目的是为了获得分别管理无法获得的利益。
C、项目和项目集管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集和项目，即“正确地做事”；项目组合管理则注重于开展“正确”的项目集和项目，即“做正确的事”。
D、项目集管理通过选择适当的项目组合或项目，对工作进行优先级排序，并提供所需资源，与组织战略保持一致。

6、以下说法中，错误的是（）。
A、控制型直接管理和控制项目。项目经理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。
B、通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性是 PMO 的职责之一。
C、项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段，这些阶段之间的关系可以顺序、迭代或交叠进行
D、项目管理过程组不同于项目阶段。项目管理过程可分为五个项目管理过程组。

7、以下不属于“勤勉、尊重和关心他人”原则的内容（）。
A、关注组织内部和外部的职责
B、坚持诚信、关心、可信、合规原则
C、秉持整体观，综合考虑财务、社会、技术和可持续的发展环境等因素。
D、项目是由项目团队交付的

8、价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和（）。
A、物流　　B、价值流　　C、信息流　　D、资金流

9、“拥抱适应性和韧性”原则中，应该关注的关键点不包括：（）。
A、适应性是应对不断变化的能力
B、韧性是接受冲击的能力和从挫折或失败中快速恢复的能力
C、聚焦于成果而非某项输出，有助于增强适应性
D、采用结构化变革方法，帮助个人、群体和组织从当前状态过渡到未来的期望状态

10、在敏捷型或适应型项目生命周期中，“每次迭代都是在一个很短的固定时间段内开展工作，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

然后演示所完成的工作成果，有关的干系人和团队基于演示来进行回顾性审查。”属于（）过程组的内容。

A、启动过程组　　B、计划过程组　　C、执行过程组　　D、监控过程组

11、以下（）不是PMO的主要职能。

A、对PMO所辖全部项目的共享资源进行管理

B、识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准

C、指导、辅导、培训和监督

D、利用实物资源，带领团队成员完成项目工作

12、以下说法中，错误的是（）。

A、项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。

B、可交付成果是指在某一过程、阶段或项目完成时，形成的独特并可验证的产品、成果或服务

C、项目的“临时性”是指项目有明确的起点和终点。“临时性”并不一定意味着项目的持续时间短

D、可交付成果也是临时的，项目终止后可交付成果就不存在了

13、下列说法中，错误的是（）。

A、业务价值是从组织运营中获得的可量化的净效益。

B、项目带来的效益可以是有形的、无形的或两者兼而有之。有形效益的例子包括：货币资产、股东权益、公共事业、固定资产、工具、市场份额等。无形效益的例子包括：商誉、声誉、商标、公共利益、战略联盟、品牌认知度等。

C、项目驱动组织进行变更。从业务价值角度看，项目旨在推动组织从一个状态转到另一个状态，从而达成特定目标，获得更高的业务价值

D、项目的启动背景与组织的战略目标以及各个项目的业务价值没什么关联。

14、以下关于PMO的说法中，错误的是（）。

A、PMO的职责范围可大可小，小到提供项目管理支持服务，大到直接管理一个或多个项目

B、控制型PMO不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从，这种类型的PMO对项目的控制程度属于中等

C、PMO的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持，但是没权力给项目经理下指令

D、为了保证项目符合组织的业务目标，PMO有权在每个项目的生命周期中充当重要干系人和关键决策

15、下列关于组织结构的说法中，正确的是（）。

A、职能(集中式)中，项目预算管理人是项目经理。

B、强矩阵结构中，项目管理人员是兼职工作的。

C、均衡矩阵结构中，项目经理的权利是低-中。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、项目导向(复合、混合)结构中，项目预算管理人是职能经理

16、以下属于领导力的是（）。
①关注系统和架构②正确地做事③关注人际关系④激发信任⑤做正确的事⑥维护
A、③④⑤　　B、①②⑥　　C、①②④　　D、④⑤⑥

17、以下关于“勤勉、尊重和关心他人”的原则，说法错误的是（）。
A、关注组织内部和外部的职责
B、坚持诚信、关心、可信、合规原则
C、秉持整体观，综合考虑财务、社会、技术和可持续的发展环境等因素
D、项目是由项目团队交付的

18、以下关于“营造协作的项目管理团队环境”原则，说法错误的是（）。
A、团队共识是一套由项目团队制定的，需要大家做出承诺并共同维护的工作规范。
B、为了最有效地实现项目目标，项目团队在组织文化、项目性质以及所处的运营环境的影响下，会建立自己的团队文化，并对组织结构进行裁剪。
C、担责指有义务开展或完成某件事，可与他人共同履行。
D、多元化的项目团队可以将不同的观点汇集起来，丰富项目环境。项目团队可以由组织内部员工、签约贡献者、志愿者或外部第三方组成。

19、以下关于“促进干系人有效参与”原则，说法错误的是（）。
A、干系人包含会受到或自认为受到组合、项目集和项目决策、活动或成果影响的个人、群体或组织。
B、项目团队通过与干系人互动来为干系人服务
C、干系人的参与可主动地推进价值交付
D、在项目的整个生命周期内，干系人是一成不变的

20、以下关于“聚焦于价值”原则，说法错误的是（）。
A、价值可以在整个项目进行期间、项目结束或完成后实现
B、以成果为导向，可帮助项目团队获得预期收益，从而创造价值
C、在项目执行过程中，如果发现项目或干系人不再与商业需要保持一致，或者项目不可能提供预期的价值，组织可以选择终止项目
D、价值只可以从定性的角度进行定义和衡量

21、以下关于“识别、评估和响应系统交互”的原则，说法错误的是（）。
A、将系统整体性思维应用于项目。系统是一组相互作用且相互依赖的组件，它们作为一个统一的整体发挥作用
B、系统不断变化，需要始终关注内外部环境

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、对系统交互作出响应，可以使项目团队充分利用积极的成果
D、项目团队通过与干系人互动来为干系人服务属于本原则的关键点。

22、以下说法中，错误的是（）。
A、任何项目团队成员都可以表现出领导力行为
B、愿景、创造力、激励、热情、鼓励和同理心，这些特质通常与领导力有关。
C、在混乱无序的环境下，相比协作型，指令型的领导行动力更强，解决问题更清晰、更有推动力
D、对于拥有高度胜任和敬业员工的环境，集中式比授权型更有效

23、以下说法中，错误的是（）。
A、裁剪应该在整个项目进展过程中持续进行
B、裁剪是为了在管理因素的制约下将项目价值最大化，最终实现提高绩效的目标。
C、项目具有独特性，每个项目都处于特定的组织、客户、渠道和环境动态环境中，每个项目都需要裁剪，项目团队应综合判断每个项目的各种独特条件，寻找实现项目的期望成果的最适当的方法。
D、在项目生命周期中，裁剪是一次性的过程

24、以下说法中，错误的是（）。
A、质量通过成果的验收标准来衡量
B、质量包括满足客户明示的或隐含的需求的能力。项目团队需要对项目的产品、服务或成果进行测量，以确定其是否符合验收标准并满足使用要求。
C、质量不仅与项目成果有关，也与生成项目成果的项目方法和活动有关。在关注项目成果质量的同时，也需要对项目活动和过程进行评估。因此质量管理更加关注过程的质量，侧重于在过程中提前发现和预防错误和缺陷的发生。
D、质量包含多个方面和维度，其中可靠性是指是否满足使用要求，是否符合规格？

25、以下说法中，错误的是（）。
A、在识别复杂性时，项目团队需要保持警惕，应用各种方法来降低复杂性的数量及其对项目的影响。
B、不断评估和确定项目的复杂性，使项目团队能够在整个生命周期中，成功找到正确的方法应对复杂情况。
C、复杂性可以控制。
D、系统性思维、复杂的自适应系统、相关的项目经验，可帮助项目团队提升驾驭复杂性的能力。

26、以下说法中，错误的是（）。
A、组织的风险态度、偏好和临界值会影响风险的应对方式
B、项目团队持续反复地识别风险并积极应对，需要关注的要点包括：明确风险的重要性；考虑

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

成本效益；切合项目实际；与干系人达成共识；明确风险责任人。
C、聚焦于成果而非某项输出，有助于增强适应性
D、采用较长的反馈路径有利于帮助提升项目团队的适应性和韧性能力

27、以下说法中，错误的是（）。
A、变革具有挑战性，并非所有干系人都接受变革
B、在短时间内尝试过多的变革会导致变革疲劳，使变革易受抵制
C、项目团队成员和项目经理需要和干系人共同合作，解决抵制变革等相关的问题，提高客户成功采纳或接受变革的可能性。
D、只有在最后一次迭代之后，可交付成果具有了必要和足够的能力，才能被视为完整的系统，这是迭代型的特点。

28、以下（）不属于适应性生命周期的特点。
①需求在开发前预先确定　②分次交付整体项目或产品的各个子集　③尽量限制变更
④关键干系人持续参与 ⑤随着需求和制约因素的显现而控制风险和成本
A、①②③④⑤　　B、①②③④　　C、③④　　D、①②③

29、以下说法中，错误的是（）。
A、项目阶段是项目从开始到结束所经历的一系列阶段，是一组具有逻辑关系的项目活动的集合，通常以一个或多个可交付成果的完成为结束标志。
B、一个过程组的输出通常成为另一个过程组的输入，或者成为项目或项目阶段的可交付成果
C、过程组中的各个过程会在每个阶段按需要重复开展，直到达到该阶段的完工标准。
D、管理项目团队属于监控过程组的内容。

30、以下关于适应性项目的说法，错误的是（）。
A、在采用适应型生命周期的项目上，启动过程通常要在每个迭代期开展。
B、在高度复杂和不确定的项目中，在采用适应型生命周期的项目上，应该让尽可能多的团队成员和干系人参与到规划过程，以便依据广泛的信息开展规划，降低不确定性。
C、在敏捷型或适应型项目生命周期中，监控过程通过维护未完项的清单，对进展和绩效进行跟踪、审查和调整
D、适应性项目范围变更很少，干系人之间有高度共识

31、以下说法中，错误的是（）。
A、适应型项目往往可分解为一系列先后顺序进行的，被称为“迭代期”的阶段。
B、高度适应型项目往往在整个项目生命周期内持续实施所有的项目管理过程组。采用这种方法，工作一旦开始，计划就需根据新情况而改变，需要不断调整和改进项目管理计划的所有要素
C、无论价值是如何交付的(经常地、定期地或在项目结束时),8大绩效域在整个项目期间同时运行。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、价值交付系统描述了项目如何在系统内运作，为组织及其干系人创造价值。价值交付系统包括项目如何创造价值、价值交付组件和业务价值流。

32、2018 年 11 月第 34 题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

可以将组成项目的各个过程归纳为 5 个过程组，启动过程组包括制定项目章程和（34）两个过程。

A、收集需求　　B、识别项目干系人　　C、定义范围　　D、组织项目团队

33、2021 年 5 月第 24 题

关于项目生命周期特征的描述，正确的是（24）。

A、项目生命周期越长，越有利于项目执行

B、风险会随着项目的执行越来越大

C、风险和不确定性在项目开始时最大，并随项目进展而减弱

D、项目生命周期应保持投入人力始终不变

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十三章 项目立项管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 21 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在可行性报告中，“是否存在人力资源不足的问题，是否可以通过社会招聘或培训获得所需人员”属于（21）的内容。

A、技术可行性分析　　B、经济可行性分析

C、社会效益可行性分析　　D、运行环境可行性分析

2、2023 年 5 月第 22 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

不可作为项目评估依据的是（22）。

A、建议书及其批准文件　　B、可行性研究报告　　C、协议文件　　D、项目章程

3、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下关于初步可行性分析的说法中，错误的是（）。

A、初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。

B、经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗略，但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证。

C、初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资源、研究细节方面有较大差异。

D、初步可行性分析是必不可少的。

4、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不属于经济可行性研究的内容？

A、支出分析　　B、收益分析　　C、投资回报分析　　D、人员提升收益

5、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

以下关于可行性研究的说法中，错误的是（）。

A、将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较叫做增量净效益法（有无比较法）

B、可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等

C、投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分，固定资金中又分为设计开发费、设备费、场地费、安装费及项目管理费等

D、初步可行性研究必须用到增量净效益法

6、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不属于项目评估的依据？

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、项目建议书及其批准文件

B、项目可行性研究报告

C、报送组织的申请报告及主管部门的初审意见

D、项目章程

7、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。

A、敏感性分析　　B、支出分析　　C、收益分析　　D、投资回报分析

8、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目评估的依据主要包括：项目建议书及其批准文件、（）报送组织的申请报告及主管部门的初审意见、项目关键建设条件和工程等的协议文件、必需的其他文件和资料等。

A、需求调研报告　　B、绩效测量报告　　C、成本预测报告　　D、项目可行性研究报告

9、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于项目建议书的核心内容。

A、初步可行性研究　　B、项目建设必需的条件

C、项目的市场预测　　D、项目的必要性

10、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目评估指在（）的基础上，由（）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等条件下，进行评价、分析和论证。

A、项目立项申请；项目承建方　　B、项目可行性研究；项目建设方

C、项目立项申请；第三方　　D、项目可行性研究；第三方

11、2024年5月第1批

关于可行性研究的描述，正确的是（）。

A、试验室和中间工厂的试验是初步可行性研究的主要内容

B、详细可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估

C、初步可行性研究与详细可行性研究在占有资源和研究细节方面是相同的

D、辅助研究用于解决项目的核心问题，为判断是否具备必要的技术、实验、人力条件提供支持

12、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目建议书的核心内容不包括（）。

A、项目建设的必需条件

B、项目预期成果的市场预测

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、项目可行性研究认证

D、项目的必要性

13、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目可行性研究的描述，不正确的是( )。

A、初步可行性研究报告必须包含项目的主要投资支出

B、初步的可行性研究报告可作为正式文件，支持项目决策

C、初步可行性研究报告的核心内容不包括项目进度安排

D、初步可行性研究是详细可行性研究的基础

14、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在项目可行性分析的过程中，（ ）属于运行环境可行性分析的内容。

A、项目能否为组织带来技术创新效益

B、设备购置费是否超出预算

C、系统使用的开源协议是否符合项目商业目标

D、用户的管理体制、人员素质及数据资源积累

15、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目评估与决策过程的目的是审查项目可行性研究的可靠性、（）、（）。

A、真实性 客观性　　B、经济性 安全性

C、客观性 安全性　　D、真实性 经济性

16、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目可行性研究的描述，不正确的是（）。

A、初步可行性研究的结果及主要内容基本与详细可行性研究相同。但占有的资源、研究细节方面有较大差

B、可行性研究使用“前后比较法”比传统的“有无比较法”能更准确地反映项目的真实成本和收益

C、经济可行性分析包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等

D、可行性研究是在项目建议书被批准之后，进行多方面的调查研究和技术论证，以最终确定项目是否可行

17、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（ ）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件。

A、项目章程　　B、可行性研究报告

C、项目建议书　　D、项目可行性研究报告

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

18、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

信息系统项目可行性研究过程中，技术可行性分析考虑的因素不包括（）。

A、人力资源的有效性　　B、物资的可用性

C、技术能力的可能性　　D、技术创新效益

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为2部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下说法中，错误的是（）。

A、立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件

B、项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。涉及利用外资的项目，在项目建议书获得批准后，方可开展后续工作。

C、信息系统项目可行性研究可以归纳成以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析、社会效益可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。

D、敏感性分析属于技术可行性分析的内容。

2、以下说法中，错误的是（）。

A、技术可行性分析往往决定了项目的方向。一旦技术人员在评估技术可行性分析时估计错误将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。

B、辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面。

C、初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。

D、初步可行性研究是必不可少的。

3、以下说法中，正确的是（）。

A、项目评估的依据包含变更管理计划

B、项目评估的结果是项目评估报告

C、项目评估可以由建设方进行。

D、在进行社会效益的可行性分析时，对组织内部的效益主要是公共效益、文化效益、环境效益、社会责任感效益、其他收益等。

4、以下说法中，错误的是（）。

A、项目立项管理一般包括项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策。

B、详细可行性研究是不可缺少的。

C、项目建议书应该包括的核心内容有：项目的必要性、项目的市场预测、项目预期成果（如产品方案或服务）的市场预测、项目建设必需的条件。

D、投资估算法是初步可行性研究的方法之一。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

5、需要从用户的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯等方面进行可行性研究，是属于（）的内容。

A、技术可行性研究　　B、经济可行性研究

C、运行环境可行性研究　　D、社会效益可行性分析

6、项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时期的四个阶段。在实际工作中，初步可行性研究和详细可行性研究可以依据项目的规模和繁简程度合二为一，但（）是不可缺少的。

A、详细可行性研究　　B、初步可行性研究　　C、机会可行性研究　　D、辅助功能研究

7、以下（）不是评估大纲的内容？

A、项目概况　　B、项目评估意见　　C、总结和建议　　D、项目管理计划

8、以下关于评估的程序，正确的是（）。

①成立评估小组②开展调查研究③分析与评估④编写、讨论、修改评估报告⑤召开专家论证会⑥评估报告定稿并发布

A、①②③④⑤⑥　　B、①②⑤⑥③④　　C、④⑤⑥①②③　　D、⑥①②③④⑤

9、以下关于详细可行性研究的说法中，错误的是（）。

A、详细可行性研究的原则有：科学性、客观性、公正性

B、详细可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等

C、投资估算法是将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额即为增量成本（效益）。

D、详细可行性研究和初步可行性研究的内容一样，只是详细可行性研究更深入。

10、以下关于项目建议书的说法中，错误的是（）。

A、项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时期的四个阶段。

B、立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件

C、项目建议书一旦批准，就可以启动项目

D、项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据

11、2017年11月第31题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

项目经理小李依据当前技术发展趋势和所掌握的技术能否支撑该项目的开发，进行可行性研究。小李进行的可行性研究属于（31）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、经济可行性分析　　B、技术可行性分析
C、运行环境可行性分析　　D、其他方面的可行性分析

12、2018 年 5 月第 30 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

信息系统可行性研究包括很多方面的内容，（30）中经常会用到敏感性分析。
A、技术可行性分析　　B、经济可行性分析
C、运行环境可行性分析　　D、社会可行性分析

13、2018 年 11 月第 29 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

项目建议书中不包含（29）。
A、产品方案或服务的市场预测　　B、项目建设必需的条件
C、项目的市场预测　　D、风险因素及对策

14、2019 年 5 月第 30 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

小张接到一项任务，要对一个新项目投资及经济效益进行分析，包括支出分析、收益分析、敏感性分析等。请问小张正在进行（30）。
A、技术可行性分析　　B、经济可行性分析
C、运行环境可行性分析　　D、法律可行性分析

15、2019 年 11 月第 21 题

项目可行性研究中，开发总成本一般不包括（21）。
A、行政管理费　　B、销售与分摊费用　　C、财务费用和折旧　　D、运行维护费用

16、2020 年 11 月第 21 题

在信息系统项目的经济可行性分析中，（21）属于非一次性支出。
A、差旅费　　B、培训费　　C、人员工资和福利　　D、设备购置费

17、2020 年 11 月第 22 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

在项目评估过程中，不可以由（22）进行评价，分析和论证。
A、政府主管部门　　B、项目建设单位　　C、银行　　D、第三方评估机构

18、2021 年 11 月第 21 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

（21）往往决定了项目的方向，一旦开发人员估计错误，将会出现严重的后果。
A、技术可行性分析　　B、人员可行性分析　　C、经济可行性分析　　D、社会可行性分析

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十四章　项目整合管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 23 题

作为项目的一种特征或属性，复杂性是指（23）。

①包含多个部分

②不同部分之间存在差异性

③不同部分之间的动态交互作用

④交互作用产生的行为远远大于各部分简单的相加

A、①②③　　B、②③④　　C、①③④　　D、①②③④

2、2023 年 5 月第 24 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在制定项目章程需要的人际关系与团队技能中，（24）有助于干系人就目标、成功标准、高层级需求、项目描述、总体里程碑和其他内容达成一致意见。

A、冲突管理　　B、访谈　　C、会议管理　　D、头脑风暴

3、2023 年 5 月第 25 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（25）属于工作绩效数据。

①关键绩效指标(KPI) ②挣值分析　③进度活动的实际开始日期 ④可交付成果状态

⑤合同绩效信息⑥缺陷的数量

A、①②③④　　B、①③④⑥　　C、②③⑤⑥　　D、③④⑤⑥

4、2023 年 5 月第 26 题

结束项目或阶段过程的主要作用包括（26）。

①存档项目或阶段信息

②利用已有的组织知识，改进项目成果

③对项目工作的可交付成果进行综合管理

④确定项目工作的基础

⑤释放组织团队资源

A、①②⑤　　B、①⑤　　C、①③⑤　　D、①④

5、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下（）不属于整合管理的过程？

A、制定项目章程　　B、指导与管理项目工作　　C、管理项目知识　　D、识别干系人

6、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下（）不是项目章程的内容？

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、项目目的　　B、范围基准　　C、高层级需求　　D、项目退出标准

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

随着新技术的不断涌现，社交网络、多元文化、虚拟团队和新的价值观等的出现，组织和项目所处的环境发生了很大变化。在执行并管理整合时，项目经理需要意识到项目背景和这些新因素，决定如何在项目中最好地利用这些新环境因素，以获得项目成功。这是属于（）。

A、背景层面执行整合　　B、认知层面执行整合

C、过程层面执行整合　　D、管理层面执行整合

8、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

在整合管理中，（）不是裁剪考虑的因素?

A、项目生命周期　　B、知识管理　　C、开发生命周期　　D、监控

9、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

以下（）属于制定项目章程的输入。

①商业需求　②可交付成果　③协议　④经验教训登记册　⑤成本效益分析

A、②③④　　B、①②③　　C、①③⑤　　D、①②④

10、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

（）用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享。

A、信息管理　　B、人际交往　　C、会议　　D、讲故事

11、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

监控项目工作过程中输出的工作绩效报告包含状态报告和（）。

A、审计报告　　B、进展报告　　C、风险报告　　D、质量报告

12、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

下面（）属于项目文件？

A、风险登记册　　B、绩效测量基准　　C、开发方法　　D、生命周期描述

13、2023年11月第4批

项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与（）合作编制。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目的目的、目标和预期收益，以便更有效地分配项目资源。

A、发起机构　　B、评估机构　　C、客户　　D、干系人

14、2023年11月第4批

关于项目整合管理的描述，不正确的是（）。

A、项目整合管理由项目经理负责，项目经理负责整合所有其他知识领域的成果，并掌握

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目总体情况

B、执行项目整合时项目经理承担双重角色

C、项目整合管理的责任可由项目经理授权或转移

D、项目整合是项目经理的一项关键技能

15、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在监控项目工作过程中，当遇到变更请求时，为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动属于（）。

A、纠正措施　　B、评审措施　　C、预防措施　　D、缺陷补救

16、2023年11月第4批

关于项目知识管理的描述，不正确的是（）。

A、项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识过程的输入

B、知识管理最重要的环节是营造相互信任的氛围

C、知识管理需在整个项目期间开展

D、先进的虚拟互动技术最有利于建立知识管理所需的信任关系

17、2024年5月第1批

能够影响“制订项目管理计划”过程的组织过程资产包括（）。

①组织的标准政策

②变更控制程序

③历史项目进度网络图

④特定行业的项目管理知识体系

⑤法律法规和安全标准

⑥历史信息和经验教训知识库

A、①②③⑥　　B、①③⑤⑥　　C、①③④⑥　　D、①②④⑤

18、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目整合管理过程中，“实施已批准的变更”在（）过程中开展。

A、指导与管理项目工作　　B、监控项目工作

C、制订项目管理计划　　D、实施整体变更控制

19、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

监控项目工作过程中，出现偏差时，需使用（）在多个方案中选择要执行的纠正措施和预防措施；需使用（）技术确定最节约成本的纠正措施；需使用（）技术对范围、进度和成本绩效进行综合分析。

A、偏差分析；备选方案分析；成本效益分析

B、备选方案分析；成本效益分析；挣值分析

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、备选方案分析；偏差分析；成本效益分析

D、偏差分析；备选方案分析；挣值分析

20、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目实施整体变更控制的描述不正确的是（）。

A、影响项目基准的变更应由 CCB 和客户审批

B、项目经理对实施变更控制过程承担最终责任

C、CCB 也可以审查配置管理活动，应明确规定 CCB 的角色和职责

D、批准的变更请求都是可用于实施整体变更控制过程的输入文件

21、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目整合管理的描述不正确的是（）。

A、批准的变更请求可能导致修改正式受控的项目文件

B、CCB 通过对变更方案的审查决策，对变更进行管理实施和控制

C、组织的结构文化管理实践和可持续性是影响指导与管理项目工作过程的因素

D、项目管理计划的任何组件都可用作指导与管理项目工作的输入

22、2024 年 5 月第 2 批

结束项目或阶段过程的输入是（）。

A、批准的产品规范　　B、最终产品服务或成果

C、项目最终报告　　D、经验教训知识库

23、2025 年 5 月第 1 批

在项目整合管理过程中，（）不是项目知识管理过程的输出。

A、项目管理计划　　B、问题日志　　C、组织过程资产　　D、经验教训登记册

24、2025 年 5 月第 1 批

关于管理项目知识过程的描述，正确的是（）。

A、项目管理计划的所有组成部分都是管理项目知识的输入

B、项目管理知识应该有明确的范围，确保知识只为本项目服务

C、专家判断不属于项目知识管理的工具与技术

D、选取先进的知识管理工具是知识管理最重要的环节

25、2025 年 5 月第 1 批

项目在实施整体变更控制中，（）必须记录在变更日志中。

A、纠正项目管理计划中的拼写错误

B、风险管理计划中的应对策略

C、经 CCB 批准的需求范围的扩展

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、项目干系人提出但被否决的新功能请求

26、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目章程的描述，不正确的是（）。

A、项目章程中需明确高层级的里程碑计划，但详细资源分配应在后续规划阶段完成

B、项目章程用于建立组织内部的合作关系，确保正确交付合同内容

C、立项管理文件属于项目文件，制定项目章程时项目经理可以根据需要对其变更

D、项目章程可由发起人编制，也可由项目经理与发起机构合作编制

27、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

结束项目时，团队希望通过分析资源投入、团队沟通频率等变量与项目质量之间的关联性，以识别影响结果的主要因素。最适用于此场景的数据分析技术是（）。

A、回归分析　　B、文件分析　　C、趋势分析　　D、偏差分析

28、2025 年 5 月第 2 批

项目经理应尽量熟练掌握所有项目管理知识领域，帮助其将经验、见解、领导力、技术以及商业管理技能运用到项目管理中，体现了项目经理在（）的整合能力。

A、认知层面　　B、知识层面　　C、过程层面　　D、背景层面

29、2025 年 5 月第 2 批

监督是贯穿于整个项目的项目管理活动之一，包括收集、测量和（），以及预测趋势，以便推动（）。

A、分析收集数据　数据分析　　B、分析测量结果　过程改进

C、评估项目绩效　绩效优化　　D、检查项目风险　风险管理

30、2025 年 5 月第 2 批

关于指导与管理项目工作的描述，不正确的是（）。

A、本过程执行项目管理计划中所确定的工作以实现项目目标

B、本过程的主要作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理

C、变更请求在指导与管理项目工作过程中产生、批准并处理

D、项目管理计划的任何组件都可用作指导与管理项目工作的输入

31、2026 年 5 月第 1 批

“实施整体变更控制”的输入不包括（ ）。

A、批准的变更请求　　B、进度基准

C、范围基准　　D、工作绩效报告

32、2026 年 5 月第 1 批

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

在管理项目知识时，（ ）可促进项目干系人之间建立非正式的联系和关系。

A、领导力　　B、积极倾听　　C、人际交往　　D、大局观

33、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不属于项目章程的内容。

A、项目风险　　B、审批要求　　C、退出标准　　D、行业标准

34、2026年5月第2批

在“结束项目或阶段”过程需要参考的组织过程资产包括（），其内容包括经验教训、团队绩效评估和项目评价等。

A、可行性研究报告　　B、项目评估报告

C、项目或阶段收尾指南或要求　　D、配置管理知识库

35、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

变更管理时，为了修正不一致产品或产品组件而进行的有目的的活动被称为（）。

A、缺陷补救　　B、预防措施　　C、问题日志　　D、改进措施

36、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

问题日志文件在（）过程中被首次创建，随着项目进展在整个生命周期随时都需要对其进行监控。

A、监控项目工作　　B、指导与管理项目工作

C、管理项目知识　　D、实施整体变更控制

37、2026年5月第2批

项目管理过程中，会使用并产生项目管理计划和项目文件两大类文件，属于项目文件的是（）。

A、范围基准　　B、开发方法　　C、成本估算　　D、项目生命周期描述

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为2部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下（）不是监控项目工作的工具和技术。

A、趋势分析　　B、偏差分析　　C、挣值分析　　D、蒙特卡洛

2、以下（）不是项目管理计划的内容。

A、项目生命周期描述　　B、开发方法　　C、绩效测量基准　　D、质量测量指标

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

3、（）关注识别问题的主要原因，它可用于识别出现偏差的原因以及项目经理为达成项目目标应重点关注的领域。
A、成本效益分析　　B、根本原因分析　　C、趋势分析　　D、备选方案分析

4、使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标并且帮助组织学习的过程是（）。
A、制定项目章程　　B、管理项目知识　　C、指导与管理项目工作　　D、制定项目管理计划

5、管理项目知识过程输入不包括（）。
A、项目管理计划　　B、范围基准　　C、干系人登记册　　D、项目沟通记录

6、以下（）是结束项目或阶段的输入。
A、可交付成果　　B、核实的可交付成果
C、验收的可交付成果　　D、最终产品、服务或成果

7、以下关于CCB的描述，错误的是（）。
A、CCB必须是全职的
B、CCB是决策机构，不是作业机构
C、CCB是项目的所有者权益代表，负责对变更进行决策
D、CCB由项目所涉及的主要干系人共同组成，但是也可以只有1个人。

8、项目章程的内容不包含（）。
A、项目目的　　B、整体项目风险　　C、项目审批要求　　D、成本预算

9、（）作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。
A、文件分析　　B、回归分析　　C、趋势分析　　D、偏差分析

10、以下（）不属于投票。
A、一致同意　　B、大多数原则　　C、相对多数原则　　D、独裁型决策

11、绩效报告的内容不包含（）。
A、仪表指示图　　B、储备燃尽图　　C、缺陷直方图　　D、关键绩效指标（KPI）

12、（）有助于减少误解并促进沟通和知识分享。
A、积极倾听　　B、引导　　C、领导力　　D、大局观

13、（）用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。
A、头脑风暴　　B、焦点小组　　C、访谈　　D、引导

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、（）是为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。
A、纠正措施　　B、预防措施　　C、缺陷补救　　D、更新

15、马军老师正在进行知识管理，（）工具不可以用。
A、人际交往　　B、工作跟随和跟随指导　　C、知识展会和茶座　　D、SWOT

16、指导与管理项目工作过程的输出不包括（40）。
A、工作绩效数据　　B、批准的变更请求
C、项目管理计划更新　　D、项目文件更新

17、（34）不是制定项目章程的输入。
A、项目工作说明书　　B、立项管理文件　　C、合同或谅解备忘录协议　　D、项目成功标准

18、不属于“整体变更控制”过程输出的是（36）。
①工作绩效报告②项目质量管理计划③变更请求④变更日志更新⑤批准的变更请求
A、①②③　　B、②③④　　C、③④⑤　　D、①③⑤

19、制定项目管理计划的输入不包括（35）。
A、项目章程　　B、其它规划过程的输出　　C、工作绩效　　D、组织过程资产

20、指导与管理项目工作过程的输出包括（36）。
①可交付成果 ②工作绩效数据 ③批准的变更请求 ④项目文件更新
A、①③④　　B、①②④　　C、②③④　　D、①②③

21、以下（）不属于管理项目知识的输入。
A、项目管理计划　　B、可交付成果　　C、干系人登记册　　D、大局观

22、以下（）不属于监控项目工作的工具。
A、根本原因分析　　B、趋势分析　　C、偏差分析　　D、回归分析

23、以下（）不属于管理项目知识的工具。
A、实践社区和特别兴趣小组　　B、知识展会　　C、领导力　　D、头脑风暴

24、以下（）不属于监控项目工作的输入。
A、工作绩效信息　　B、工作绩效数据　　C、协议　　D、成本预测

25、（）通过与干系人直接交谈，了解高层级需求、假设条件、制约因素、审批标准以及

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

其他信息。

A、访谈　　B、头脑风暴　　C、名义小组技术　　D、亲和图

26、对于大型项目，开工会议将在（）时召开。

A、项目启动　　B、项目执行阶段开始时　　C、每个阶段开始时　　D、每次迭代时

27、已完成的故事点、可交付成果状态、进度进展情况、变更请求的数量、缺陷的数量属于（）的内容。

A、绩效数据　　B、绩效信息　　C、绩效报告　　D、质量报告

28、2017年11月第34题

项目经理张工带领团队编制项目管理计划，（34）不属于编制项目管理计划过程的依据。

A、项目章程　　B、事业环境因素　　C、组织过程资产　　D、工作分解结构

29、2017年11月第35题

（35）不属于项目监控工作的成果。

A、进度预测　　B、项目文件更新　　C、工作绩效报告　　D、项目管理计划更新

30、2018年5月第34题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目管理计划的内容不包括（34）。

A、沟通管理计划　　B、项目生命周期

C、资源日历　　D、成本基准

31、2018年11月第35题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目管理计划不包括（35）。

A、绩效信息　　B、开发方法　　C、配置管理计划　　D、生命周期模型

32、2018年11月第36题

为使项目管理团队洞察项目的状况，识别需特别关注的任何方面，项目经理应提供（36）。

A、风险登记册　　B、工作绩效报告　　C、干系人风险承受度　　D、进度管理计划

33、2019年5月第34题

（34）属于编制项目管理计划的输入。

A、项目绩效数据　　B、范围管理计划　　C、项目进度网络图　　D、风险登记册

34、2019年5月第35题

监控项目工作的输出不包括（35）。

A、变更请求　　B、工作绩效信息

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、项目管理计划更新　　D、项目文件更新

35、2019年11月第27题

项目经理向公司管理层汇报项目进展情况时最合适采用（27）。

A、工作绩效数据　　B、工作绩效信息　　C、工作绩效报告　　D、项目管理计划

36、2020年11月第27题

（27）不属于“监控项目工作”过程使用的工具与技术。

A、专家判断　　B、挣值分析　　C、访问控制　　D、会议

37、2020年11月第28题

（28）不属于整体变更控制的成果。

A、批准的变更请求　　B、工作绩效报告　　C、变更日志　　D、项目文件更新

38、2021年5月第28题

（28）是整体变更控制的依据。

①项目管理计划 ②批准的变更请求 ③验收的可交付成果 ④变更请求 ⑤组织过程资产

A、①③④　　B、①②④　　C、②③⑤　　D、①④⑤

39、2021年11月第28题

属于整体变更控制的成果的是（28）。

①变更请求②项目管理计划更新③工作绩效信息④工作绩效报告⑤变更日志⑥项目文件更新

A、①②③　　B、④⑤⑥　　C、②③⑥　　D、②⑤⑥

40、2022年5月第24题

关于项目管理计划的描述，不正确的是（24）。

A、项目管理计划是项目总体计划，它从整体上指导项目工作的有序进行

B、项目管理计划具有统筹作用，包括了项目管理与控制过程的所有文件

C、在项目管理信息系统中，项目管理计划在计划模块中制定和维护

D、项目管理计划可详可略，可由一个或多个部分计划及其他事项组成

41、2022年5月第25题

（25）不是“指导与管理项目执行”过程的成果。

A、可交付成果　　B、工作绩效数据　　C、变更请求　　D、项目管理计划

42、2022年5月第26题

小张作为项目经理负责项目A，因需求方变动需要终止项目，接到通知后，小张采取的应

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

对措施不合适的是（26）。

A、通知项目所有成员即刻停止工作

B、与所有合适的干系人整理项目历史信息和经验教训

C、制定程序，来调查和记录提前终止的原因

D、验收未全部完成的可交付成果

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十五章　项目范围管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 27 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（27）用于确认项目可交付成果的成功完成。

A、业务需求　　B、解决方案需求　　C、质量需求　　D、过渡与就绪需求

2、2023 年 5 月第 28 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于确认范围的描述，不正确的是（28）。

A、确认范围的作用之一是确保验收过程具有客观性

B、确认范围过程通常先于控制质量过程，二者也可同时进行

C、在确认范围时，要检查可交付成果是否有明确的质量标准

D、管理层、客户、项目管理人员在确认范围时的关注点有所不同

3、2023 年 5 月第 29 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于 WBS 的描述，正确的是（29）。

A、WBS 中的各项工作为可交付成果提供服务

B、WBS 的内容一般会超出完成可交付成果的活动范围

C、WBS 中的元素可以由一人或多人负责

D、WBS 应包括分包的工作，但不包括管理工作

4、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下（）不属于范围管理的过程？

A、规划范围管理　　B、收集需求　　C、定义范围　　D、控制资源

5、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

（）含有与需求相关的信息，包括如何确认需求。

A、需求跟踪矩阵　　B、需求文件　　C、质量报告　　D、经验教训登记册

6、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

范围管理中，需要裁剪的考虑因素不包括（）。

A、知识和需求管理　　B、确认和控制　　C、开发方法　　D、WBS 的结构

7、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

范围确认中，（）关心项目的可交付成果是否足够完成产品或服务。

A、项目管理人员　　B、客户　　C、项目团队成员　　D、高层领导

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

8、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）工具旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化。

A、趋势分析　　B、直方图　　C、因果图　　D、甘特图

9、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

适用于规划范围管理的数据分析技术是（）。

A、备选方案分析　　B、成本效益分析　　C、趋势分析　　D、偏差分析

10、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）与主题研讨会结合使用，把主要干系人召集在一起定义产品需求。

A、引导　　B、名义小组　　C、头脑风暴　　D、投票

11、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

由客户或者发起人正式签字批准的文件是（）。

A、核实的可交付成果　　B、工作绩效信息

C、验收的可交付成果　　D、可交付成果

12、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于范围管理的描述，正确的是（）。

A、定义范围管理是为了记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程

B、范围管理计划包含配置管理活动和需求优先级排序过程

C、范围管理计划是非常详细的正式的计划

D、规划范围管理的作用是在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向

13、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）包括收到的变更请求的数量，接受的变更请求的数量或者确认和完成的可交付成果的数量；控制范围过程产生的( )包括收到的变更的分类、识别的范围偏差和原因、偏差对进度和成本的影响，以及对将来范围绩效的预测。

A、工作绩效报告；工作绩效信息　　B、工作绩效数据；工作绩效信息

C、工作绩效信息；工作绩效报告　　D、工作绩效数据；工作绩效报告

14、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目范围说明书包括（）。

①产品范围描述 ②需求跟踪矩阵 ③项目的除外责任 ④干系人登记册

⑤可交付成果 ⑥验收标准

A、①②④⑥　　B、①③⑤⑥　　C、①②③⑤　　D、①②⑤⑥

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

15、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于收集需求管理过程及相关技术的描述，正确的是（）。

A、需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源链接到能满足需求的可交付成果的一种表格

B、原型法是一种结构化的头脑风暴形式，通过投票排列最有用的创意

C、故事板是一种原型技术，是对产品范围的可视化描绘，可以直观显示业务系统的交互方式

D、收集需求管理过程为规划范围管理过程奠定基础，需要反复开展，贯穿于整个项目生命周期。

16、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目范围管理过程的描述不正确的是（）。

A、采用敏捷或适应型生命周期，旨在应对大量变更，需要干系人持续参与项目

B、在预测型项目中，只有通过正式变更控制程序才能变更项目范围基准

C、在预测型项目中，通过多次迭代来开发可交付成果，使用未完成项反映当前需求

D、在适应型或敏捷型生命周期中，在每次迭代开始时都可以定义或批准详细的范围

17、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于确认范围管理过程的叙述，正确的是（）。

A、项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素

B、项目实施单位的管理层主要关注产品或服务范围，客户主要关注项目制约因素

C、确认范围过程的作用是为所要支付的内容提供架构

D、符合验收标准的可交付成果应由项目经理正式签字批准

18、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目范围说明书的描述，不正确的是（）。

A、项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述

B、项目范围说明书应该与项目章程详细程度完全不同，内容不可重叠

C、项目验收的标准也应该记录在项目范围说明书中

D、项目范围说明书应该准确地描述要做和不要做的工作

19、2025 年 5 月第 1 批

在规划范围管理过程中，需要针对（）进行分析。

A、组织过程资产中的历史信息　　B、项目范围说明书中的范围基准

C、风险登记册登记的风险清单　　D、工作绩效数据中记录的绩效指数

20、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目范围管理的目的是（）。

A、确保项目信息及时且恰当地规划、收集、控制和最终处置

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、确保项目做且只做所需的全部工作以成功完成项目

C、识别、获取和管理所需资源以成功完成项目

D、识别、定义、组合项目管理过程中的各个过程和活动

21、2025 年 5 月第 1 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

确认范围过程依据（）过程形成的范围基准和（）过程形成的工作绩效数据和其他信息，对完成的成果进行验证，并将工作绩效信息输入给（）过程。

A、创建 WBS　管理项目知识　结束项目或阶段

B、定义范围　指导与管理项目执行　结束项目或阶段

C、定义范围　管理项目知识　监控项目工作

D、创建 WBS　指导与管理项目执行　监控项目工作

22、2025 年 5 月第 2 批

规划范围管理过程的输出不包括（）。

A、范围管理计划　B、质量管理计划　C、配置管理活动　D、需求管理计划

23、2025 年 5 月第 2 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

某公司承接了一个医疗集团系统升级的项目，涉及多家医疗机构。项目经理在创建 WBS 时，发现各家医疗机构对系统功能需求差异较大，且个别医疗机构的部分需求尚未明确。最适合当前情况的 WBS 分解方式是（）。

A、按项目生命周期阶段分解，每个阶段下再按医疗机构划分

B、采用滚动式规划，先分解已知需求，后续逐步细化未知部分.

C、按主要可交付成果分解，每个成果下再按功能模块细分

D、采用自上而下逐层细化，先按医疗机构分解，再在每个医疗机构下细化功能模块

24、2025 年 5 月第 2 批

在控制范围过程，可更新的主要项目文件是（）。

①需求文件 ②问题日志 ③需求跟踪矩阵 ④经验教训登记册 ⑤绩效测量基准

A、①②③　B、②③⑤　C、③④⑤　D、①③④

25、2025 年 5 月第 2 批

关于收集需求的描述，不正确的是（）。

A、需求包括发起人和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期望

B、让干系人积极参与需求的探索和分解工作，并仔细确定、记录和管理对产品、服务或成果的需求，能直接促进项目成功

C、应该足够详细地挖掘、分析和记录需求，并将其作为范围基准

D、需求是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能力

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

26、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

确认范围的一般步骤不包括（ ）。

A、识别范围确认需要哪些投入　　B、确定需要进行范围时间

C、确定成果正确性　　D、接受的标准和要素

27、2026 年 5 月第 1 批

（ ）不属于“定义范围”过程应用的工具与技术。

A、专家判断　　B、分解　　C、数据分析　　D、决策

28、2026 年 5 月第 1 批

规划范围管理过程的输入不包括()

A、项目章程　　B、开发方法　　C、需求管理计划　　D、质量管理计划

29、2026 年 5 月第 2 批

采用敏捷或适应型生命周期，在一个迭代开始时，团队将努力确定产品未完成项中，哪些优先级高的未完成项需要在下一次迭代中交付。在每次迭代中，都会重复开展的过程包括（）。

1.收集需求　　2.定义范围　　3.规划范围　　4.创建 WBS

A、234　　B、123　　C、134　　D、124

30、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于 WBS 分解过程的描述，正确的是（ ）。

A、完成 WBS 之后，为了保持需求稳定尽量不对其进行修改

B、一个工作单元可以从属于多个上层单元

C、WBS 的编制不需要所有项目干系人的参与，只需要部分干系人参与

D、WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责

31、2026 年 5 月第 2 批

适用于“收集需求”过程的决策技术，不包括（）。

A、思维导图　　B、多标准决策分析

C、独裁型决策制定　　D、投票

32、2026 年 5 月第 2 批

“控制范围”过程中，通常会使用到的项目管理计划组件包括（ ）。

1、绩效测量基准　　2、需求管理计划　　3、变更管理计划

4、需求跟踪矩阵　　5、范围基准　　6、变更请求

A、2456　　B、1346　　C、1235　　D、2346

本章可以做的另一些题目：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、在创建 WBS 的过程中，以下说法错误的是（）。

A、100%原则（包含原则）认为，在 WBS 中，所有下一级的元素之和必须 100%代表上一级的元素。

B、WBS 的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算。

C、WBS 中的元素必须有人负责，而且只有一个人负责。

D、分包出去的工作的 WBS 不需要包含在整个项目中。

2、关于范围确认和质量控制的说法，错误的是（）。

A、确认范围应该贯穿项目的始终。

B、通常情况下，在确认范围前，项目团队需要先进行质量控制工作。

C、验收的可交付成果是范围确认的输入。

D、确认范围的一般步骤包括：①确定需要进行范围确认的时间；②识别范围确认需要哪些投入；③确定范围正式被接受的标准和要素；④确定范围确认会议的组织步骤；⑤组织范围确认会议。

3、要把整个项目工作分解为工作包，通常需要开展如下活动：①识别和分析可交付成果及相关工作；②（）；③自上而下逐层细化分解；④为 WBS 组成部分制定和分配标识编码；⑤核实可交付成果分解的程度是否恰当。

A、确定 WBS 的结构和编排方法　　B、收集需求　　C、指定责任人　　D、范围定义

4、（）是用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。

A、名义小组技术　　B、因果图　　C、偏差分析　　D、挣值分析

5、把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程是（）。

A、创建工作分解结构　　B、收集需求　　C、确认范围　　D、范围控制

6、采用适应型生命周期的项目，使用（）反映当前需求。

A、范围说明书　　B、WBS　　C、WBS 字典　　D、未完成项（包括产品需求和用户故事）

7、以下（）不属于需求管理计划的内容。

A、需求优先级排序过程

B、测量指标及使用这些指标的理由

C、反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵等

D、制定项目范围说明书

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

8、以下（）不是收集需求的输入。
A、范围管理计划　　B、需求管理计划　　C、干系人参与计划　　D、需求跟踪矩阵

9、（）将实际或计划的产品、过程和实践，与其他可比组织的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。
A、标杆对照　　B、类比估算　　C、蒙特卡洛分析　　D、参数估算

10、跟踪需求的内容不包含（）。
A、业务需要、机会、目的和目标　　B、项目目标
C、项目范围和WBS可交付成果　　D、方案设计

11、范围说明书的内容包含（）。
①产品范围描述　②可交付成果　③验收标准　④项目的除外责任
A、①②　　B、③④　　C、①②③　　D、①②③④

12、需求跟踪矩阵不包含（）。
A、需求设计　　B、产品设计　　C、产品开发　　D、测试策略

13、在控制项目范围时，不需要用到（　）。
A、工作绩效报告　　B、需求管理计划　　C、WBS词典　　D、配置管理计划

14、以下（）不是收集需求的工具。
A、标杆对照　　B、名义小组　　C、思维导图　　D、分解

15、以下（）是定义范围的输入？
A、工作分解结构　　B、范围基准　　C、需求文件　　D、验收的可交付成果

16、以下（）不属于收集需求的输入。
A、项目章程　　B、干系人登记册　　C、干系人管理计划　　D、需求文件

17、在进行范围确认时，需要检查的内容不包含（）。
A、可交付成果是否是确定的、可确认的
B、每个可交付成果是否有明确的里程碑，里程碑是否有明确的、可辨别的事件
C、是否有明确的质量标准
D、是否满足项目预算要求

18、从（）中了解干系人的沟通需求和参与程度，以便评估并适应干系人对需求活动的参与程

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

度。
A、需求管理计划　　B、范围管理计划　　C、干系人参与计划　　D、沟通管理计划

19、（）是项目需要满足的行动、过程或其他条件，例如里程碑日期、合同责任、制约因素等。
A、业务需求　　B、解决方案需求　　C、过渡和就绪需求　　D、项目需求

20、在定义范围过程中，（）是一种借助决策矩阵来使用系统分析方法的技术，目的是建立诸如需求、进度、预算和资源等多种标准来完善项目和产品范围。
A、多标准决策分析　　B、亲和图　　C、甘特图　　D、核对单

21、（）可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付产品的用途、特征及其他方面。主要包括：产品分解、需求分析、系统分析、系统工程、价值分析、价值工程等。
A、产品分析　　B、蒙特卡洛分析　　C、敏感性分析　　D、SWOT 分析

22、以下关于范围管理的说法中，错误的是（）。
A、以项目生命周期的各阶段作为分解的第二层。
B、如果采用敏捷或适应型方法，可以将长篇故事分解成用户故事。WBS 可以采用提纲式、组织结构图或能说明层级结构的其他形式。
C、范围基准是经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典，
D、规划包是一个管理控制点，在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较来测量绩效。

23、以下说法中，错误的是（）。
A、验收的可交付成果是指已经完成，并被控制质量过程检查为正确的可交付成果。
B、核实的可交付成果是范围确认的输入。
C、变更请求是范围确认的输出。
D、范围确认属于监控过程组的内容。

24、**2017 年 11 月第 39 题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）***

某公司中标一个企业信息化系统开发项目，合同中该项目包括：人事系统，OA 系统和生产系统。下图为项目经理制作的 WBS，此处项目经理违反了关于 WBS 的（39）原则。

王老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

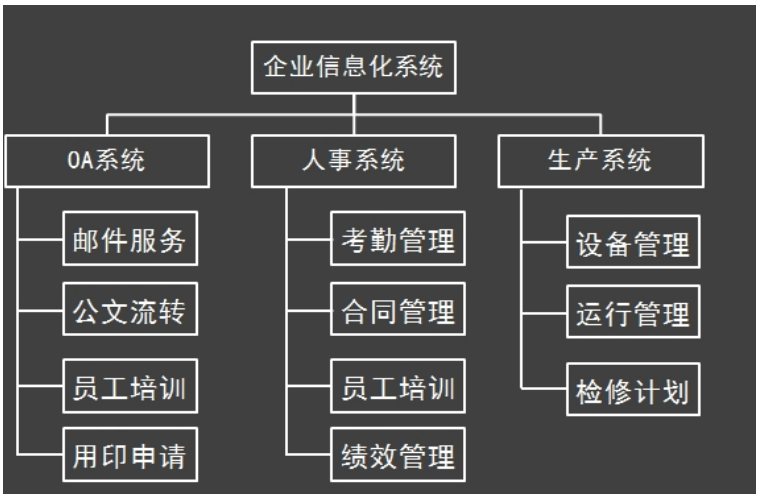

A、WBS 需要考虑将不同的人员的工作分开
B、WBS 中各项工作是为提供可交付成果服务的
C、可以按照系统子系统来逐层分解 WBS
D、一个工作单元只能从属于某个上层单元

25、2018 年 5 月第 39 题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

关于 WBS 的描述，不正确的是（39）。

A、WBS 必须且只能包括 100%的工作
B、WBS 的元素必须指定 1 个或多个负责人
C、WBS 应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认
D、分包出去的工作也应纳入 WBS 中

26、2018 年 5 月第 40 题

（40）属于控制范围的活动。

A、与客户仔细讨论项目范围说明书，并请客户签字
B、当客户提出新的需求时，说服用户放弃新的需求
C、确认项目范围是否覆盖了需要完成的产品或服务进行的所有活动
D、确认每项工作是否有明确的质量标准

27、2018 年 11 月第 41 题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

某公司决定在现有公文处理系统的基础上，新开发一个移动端 APP，便于大家远程办公。项目经理召开工作会议，就工作分解结构提出了如下的建议，其中（41）是不妥当的。

A、项目组所有人员都要参与，任务分解的层次控制在 4 至 6 层之间
B、对目前尚不清楚具体活动的模块可以使用规划包进行分解
C、项目干系人对完成的 WBS 给予确认，并达成共识
D、项目经理负责项目 WBS 分解，外包商负责外包合同 WBS 的分解

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

28、2018 年 11 月第 42 题

（42）是控制范围常用的工具和技术。

A、引导　　B、产品分析　　C、偏差分析　　D、标杆对照

29、2019 年 5 月第 39 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于工作分解结构（WBS）的描述，正确的是（39）。

A、WBS 必须符合项目范围

B、WBS 元素必须由多个人负责

C、WBS 必需控制在 5-8 层

D、WBS 的编制只需要项目团队成员参与

30、2019 年 5 月第 40 题

关于范围控制的描述，正确的是（40）。

A、控制进度是控制范围的一种有效的方式

B、项目执行组织本身发生变化不会引起范围变更

C、范围变更控制必须和其他控制过程综合在一起

D、政府政策的变化不可以成为范围变更的理由

31、2019 年 11 月第 29 题

在项目管理的过程中，确认范围的输入不包括（29）。

A、项目管理计划　　B、工作绩效数据　　C、验收可交付成果　　D、需求跟踪矩阵

32、2019 年 11 月第 30 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

（30）执行的步骤为：分成多个小组，每个小组开展讨论：小组讨论结束后。主持人依次询问每位参与者，请每人提出一个创意，这种询问可以进行很多轮，直至得到足够数量的创意；再由全体参与者对所有创意进行评审和排序。

A、焦点小组　　B、名义小组　　C、引导　　D、头脑风暴

33、2019 年 11 月第 31 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于确认范围和质量控制的描述，不正确的是（31）。

A、确认范围强调可交付成果的接受程度

B、质量控制强调可交付成果的正确性

C、确认范围和质量控制均由组织内部质量部门实施

D、确认范围和质量控制都可以通过检查的方法来进行

34、2020 年 11 月第 29 题

验收的可交付成果，属于项目范围管理中（29）过程的输出。

马老师 购课淘宝铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、定义范围　　B、控制范围　　C、收集需求　　D、确认范围

35、2020 年 11 月第 31 题

在项目范围管理中，企业管理层主要关注（31）。

A、产品的范围　　B、项目范围投入产出的合理性

C、交付成果是否满足质量要求　　D、项目过程的合理性

36、2021 年 5 月第 31 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于确认范围的描述，正确的是（31）。

A、确认范围是在正式验收阶段才执行的过程

B、分解技术是确认范围的主要工具与技术

C、客户主要关心产品范围和可交付成果

D、确认范围强调的是结束项目所要做的流程性工作

37、2021 年 11 月第 29 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

范围管理计划中不包含（29）。

A、确定 WBS 满足项目和职能要求

B、确定所有的工作职责需分配到个人或组织单元

C、确定如何处理项目范围说明书的变更

D、确定并正式验收可交付成果的正确性

38、2021 年 11 月第 31 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

在确认范围过程中，（31）主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响，这些因素是否超过了组织承受范围，是否在投入产出上具有合理性。

A、客户　　B、管理层　　C、项目经理　　D、项目团队成员

39、2022 年 5 月第 28 题

在需求文件中，（28）的需求可作为基准使用。

①可测量和可测试 ②项目经理认可③完整且可跟踪 ④相对独立无依赖

A、①②　　B、①③　　C、③④　　D、②③

40、2022 年 11 月第 25 题

当用户提出新需求时，项目组应在（25）指导下进行项目范围管理。

A、WBS　　B、范围管理计划　　C、项目范围说明书　　D、需求跟踪矩阵

41、2022 年 11 月第 27 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于的 WBS 描述正确的是（27）。

A、WBS 分解得越详细越利于项目的执行

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、WBS 的元素可以几个人同时负责

C、WBS 完成后，就不能对 WBS 进行修改

D、WBS 中下级元素之和等于上级元素

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十六章　项目进度管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

涉及到的计算题全部汇总在本书第6章，不在这里重复列出。

1、2023年5月第30题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于活动排序的描述，不正确的是（30）。

A、在单代号网络图中，每项活动有唯一的活动号，每项活动都标明了活动的持续时间

B、双代号网络图中流入同一节点的活动，均有共同点紧后活动

C、双代号网络图中，任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同

D、滞后量是紧后活动相对于紧前活动需要推迟的时间量，一般用负值表示

2、2023年5月第32题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在控制进度过程的数据分析技术中，（32）可以通过检查项目绩效随时间的变化情况，确定绩效是在改善还是恶化。

A、储备分析　　B、蒙特卡洛分析　　C、趋势分析　　D、假设情景分析

3、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下说法中，错误的是（）。

A、亲和图可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

B、直方图是一种展示数字数据的条形图，可展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。

C、横道图也称为“甘特图”,是展示进度信息的一种图表方式

D、假设情景分析是把单个项目风险和不确定性的其他来源模型化的方法，以评估它们对项目目标的潜在影响。最常见的模拟技术是蒙特卡罗分析

4、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在（）规定可以开展进度活动的可用工作日和工作班次，它把可用于开展进度活动的时间段（按天或更小的时间单位）与不可用的时间段区分开来。

A、项目日历　　B、资源日历　　C、项目团队派工单　　D、物质资源分配单

5、2023年11月第4批

（）不属于项目进度计划的图形表示方式。

A、横道图　　B、矩阵图　　C、项目进度网络图　　D、里程碑图

6、2023年11月第4批

项目进度管理过程中，可用于控制进度过程的数据分析技术包括（）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、蒙特卡洛分析　　B、计划评审技术（PERT）　　C、参数估算　　D、挣值分析

7、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

一位软件工程师在进行软件项目持续时间估算时，按照“代码行”为单位进行估算，采用的估算方法是（）。

A、三点估算　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、专家判断

8、2024年5月第1批

关于定义活动过程的描述，不正确的是（）。

A、定义活动主要由项目经理主导，也需要其他项目团队成员参与

B、定义活动完成后，应形成一份详细的活动清单

C、定义活动输出的里程碑清单是合同要求的强制性的重要时间节点和事件

D、定义活动过程中必须考虑项目的时间限制和预算约束

9、2024年5月第1批

可用于控制进度过程的数据分析技术不包括（）。

A、备选方案分析　　B、偏差分析　　C、迭代燃尽图　　D、趋势分析

10、2024年5月第1批

（）不属于排列活动顺序过程的工具与技术。

A、关键路径法　　B、提前量和滞后量　　C、紧前关系绘图法　　D、箭线图法

11、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

在一个复杂的信息系统项目中，由于资源限制，项目经理发现关键资源(如资深开发人员)经常在不同的项目任务之间被重新分配，这导致项目进度频繁延误和质量波动。为了有效控制资源并减少对进度延迟和成本超支的影响，项目经理优先采取的措施是（）。

A、增加资源储备以应对未来的资源需求波动

B、严格限制资源在项目间的共享，确保资源专注于当前任务

C、实施资源平衡策略，优化不同任务间的资源分配

D、缩减项目范围以匹配可用资源的能力

12、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于进度管理计划的概述,不正确的是（）。

A、进度管理计划既可以是正式的也可以是非正式的，既可以是非常详细的也可以是高度概括的

B、项目管理计划中规定的偏差临界值，可以用于监督进度绩效，通常用偏离基准计划中的参数的某个百分数来表示

C、在采用适应型生命周期时，应指定进度管理计划发布，规划和迭代的固定时间段

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、进度管理计划描述如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围，是项目管理计划的组成部分

13、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于估算活动持续时间过程的工具与技术的描述，不正确的是（）。

A、类比估算是一种精确的估算方法，适用于项目详细信息充分、项目需求明确的情况

B、专家判断依赖于专家的可用性和经验，可能受到主观判断的影响

C、三点估算考虑了估算中的不确定性和风险，有助于界定活动持续时间的近似区间

D、参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术

14、2024 年 5 月第 2 批

某项目经理负责一个软件开发项目，活动和它们之间的依赖关系：

活动 A：需求分析，预计耗时 2 天。

活动 B：设计，依赖于活动 A 的完成，预计耗时 3 天。

活动 C：编码，依赖于活动 B 的完成，预计耗时 5 天。

活动 D：测试，与活动 C 同时开展，但必须在活动 C 完成后才能完全结束，预计耗时 7 天。

活动 E：部署，依赖于活动 C 和 D 的完成，预计耗时 2 天。

根据上述活动和它们的依赖关系，项目工期为（）天。

A、14　　B、12　　C、13　　D、19

15、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某公司的大模型训练项目，活动 A(数据预处理)需清晰和扩充语料，活动 B（分布式训练）需启动 GPU 集群，为缩短周期，项目经理决定在活动 A 开始 2 天后利用部分数据开展活动 B，则活动 A 与 B 的关系可表示为（）。

A、SF-2　　B、SS+2　　C、FS+2　　D、FF-2

16、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目进度管理的各个子过程中，（）过程的目的是识别和记录项目活动之间的关系，（）过程会形成里程碑清单。

A、定义活动　定义活动　　B、定义活动　估算活动持续时间

C、排列活动顺序　定义活动　　D、排列活动顺序　排列活动顺序

17、2025 年 5 月第 1 批

某云服务项目的进度管理规划中，项目经理需要考虑“支持弹性扩展的云计算资源可用性”对项目进度的影响，该项目经理考虑的内容属于（）。

A、组织过程资产　　B、项目管理计划　　C、事业环境因素　　D、进度基准

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

18、2025 年 5 月第 2 批

某项目在执行阶段，项目经理通过进度绩效测量发现关键路径上的活动延迟了两周。项目经理使用关键路径法重新评估剩余工作，并决定采用快速跟进压缩后续活动工期，同时提交了变更请求以调整进度基准。上述控制进度过程的直接输出不包括（）。

A、变更请求　　B、进度预测　　C、工作绩效信息　　D、进度基准更新

19、2025 年 5 月第 2 批

某项目活动 A 的最乐观时间为 9 天，最悲观时间为 21 天，最可能时间为 12 天，客户希望提前 2 天完成该活动。项目经理使用三点估算法计算了该活动的期望持续时间，如果完成的概率符合正态分布，则该活动的期望持续时间和提前 2 天完成概率是（）。

A、11 天　16%　　B、13 天　16%　　C、11 天　32%　　D、13 天　32%

20、2025 年 5 月第 2 批

某企业级信息系统集成项目进入实施阶段后，项目经理发现关键路径上的活动 B 因供应商延期导致实际进度滞后 3 周。此时，客户要求项目必须按原计划交付，且公司高层明确表示无法追加预算。项目经理应优先采取以下哪项措施（）。

A、启动快速跟进策略，将活动 B 与后续活动并行执行

B、重新评估活动 B 的依赖关系，尝试将其从关键路径中移除

C、调整非关键路径上的活动资源，优化整体进度计划

D、对活动 B 实施赶工，增加资源投入以追回延误时间

21、2025 年 5 月第 2 批

某项目经理在定义活动过程中，将工作包分解为具体的活动时，团队提出了以下四种分解方法，其中不符合定义活动最佳实践的是（）。

A、由于某工作包涉及跨部门协作，将其整体作为一项活动，并标注由“多部门共同负责”作为活动属性

B、针对近期需完成的工作包，使用滚动式规划分解到详细的个人任务；对远期工作包仅分解到里程碑

C、在分解过程中，将“客户验收会议”作为一个独立活动，明确其所需的资源和前置条件

D、将每个工作包分解为多个活动，确保每个活动的持续时间不超过两周，以便于进度监控

22、2026 年 5 月第 1 批

下列工具技术中，不属于规划进度管理过程使用的是（ ）。

A、数据分析（假设情景分析、模拟技术）　　B、专家判断

C、数据分析（备选方案分析）　　D、会议

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

23、2026 年 5 月第 1 批

制订进度计划包含多个关键步骤：

①由分配至各个活动的项目人员审查其被分配的活动；

②定义项目里程碑，识别活动并排列活动顺序，估算持续时间，并确定活动的开始和完成日期；

③项目人员确认开始和完成日期与资源日历和其他项目或任务没有冲突，从而确认计划日期的有效性；

④分析进度计划，确定是否存在逻辑关系冲突，以及在批准进度计划并将其作为基准之前是否需要资源平衡，并同步修订和维护项目进度模型，确保进度计划在整个项目期间一直切实可行。

关于制订进度计划的正确步骤排序是（ ）。

A、①→②→③→④　　B、①→③→②→④

C、②→①→③→④　　D、②→③→①→④

24、2026 年 5 月第 2 批

关于进度管理计划的描述，不正确的是（）。

A、进度管理计划为编制、监督和控制项目进度建立准则，并明确活动要求

B、进度管理计划包括控制临界值，用于监督进度绩效

C、进度管理计划应是正式且详细的，且必须经过干系人批准

D、进度管理计划需要规定绩效测量规则，用于绩效测量管理

25、2026 年 5 月第 2 批

在定义项目活动过程中，活动属性不包括( )。

A、资源需求　　B、WBS 标识　　C、WBS 字典　　D、紧前紧后活动

26、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某项目根据项目的规模(功能点数 FP),并依据组织历史生产率数据(人时/PP) 计算项目所需工作量，进而估算项目工期。该项目采用的估算方法是( )。

A、专家判断　　B、三点估算　　C、类比估算　　D、参数估算

27、2026 年 5 月第 2 批

在项目进度管理过程中，下图属于（ ）方法。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

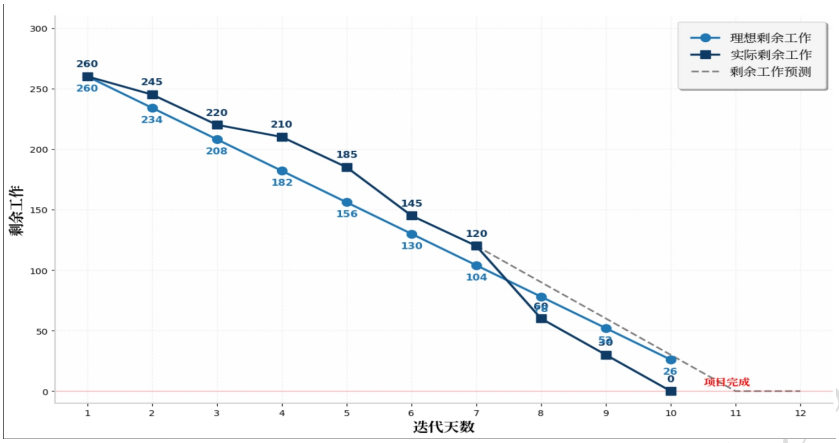

A、方格图　　B、偏差分析　　C、控制图　　D、燃尽图

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于进度管理的描述，错误的是（）。
A、资源平滑技术可以缩短项目的工期
B、资源平衡技术可以让工期延长
C、关键路径上的各活动工期之和是项目能顺利完成项目的最短工期
D、应急储备的工期包含在工期内。

2、以下（）方式可以在最小的成本增加下进行进度压缩。
A、增加资源　　B、并行工作　　C、快速跟进　　D、挣值分析

3、只要还有时间，工作就会不断扩展，直到用完所有的时间，是（）。
A、帕金森定律　　B、拖延症　　C、霍商效应　　D、确认偏见

4、（）不属于制订进度计划过程的工具与技术。
A、假设情景分析　　B、蒙特卡洛　　C、快速跟进　　D、类比估算

5、以下说法，正确的是（）。
A、工作包与活动的关系是多对一，或一对一。
B、参数估算技术耗时较少、成本较低、准确度较差。
C、管理储备的使用，必须经过高层的批准。
D、流入同一节点的活动，均有共同的紧前活动。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

6、以下（）不属于进度管理计划的内容。

A、项目进度模型　　B、计量单位　　C、控制临界值　　D、风险登记册

7、分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型，落实项目执行和监控情况是（）的内容。

A、规划进度管理　　B、活动定义　　C、制订进度计划　　D、定义活动

8、软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货，是（）。

A、强制性依赖关系　　B、选择性依赖关系　　C、外部依赖关系　　D、内部依赖关系

9、（）用于当历史数据不充分时，通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高活动持续时间估算的准确性。

A、三点估算　　B、自下而上估算　　C、参数估算　　D、类比估算

10、（）是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）。

A、假设情景分析　　B、模拟　　C、资源平衡　　D、资源平滑

11、（）指根据进度基准测量、对比和分析进度绩效，如实际开始和完成日期、已完成百分比以及当前工作的剩余持续时间。

A、绩效审查　　B、偏差分析　　C、迭代燃尽图　　D、趋势分析

12、在项目进度管理中，对项目进度压缩是一种常用的方法，其中将正常情况下按照顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展的技术称为（42）。

A、赶工　　B、快速跟进　　C、资源优化　　D、提前量和滞后量

13、进行活动历时压缩时，项目经理可以对关键路径上的活动增加资源，这时必须进一步考虑（43）。

A、其他活动的延迟　　B、是否出现新的关键路径

C、分配给关键路径上其他任务的资源　　D、进度计划中历时最长的任务

14、通过增加资源来压缩进度工期的技术称为（43）。

A、快速跟进　　B、持续时间缓冲　　C、赶工　　D、提前量管理

15、下图中（单位：天）关于活动 H 和活动 I 之间的关系描述正确的是（47）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

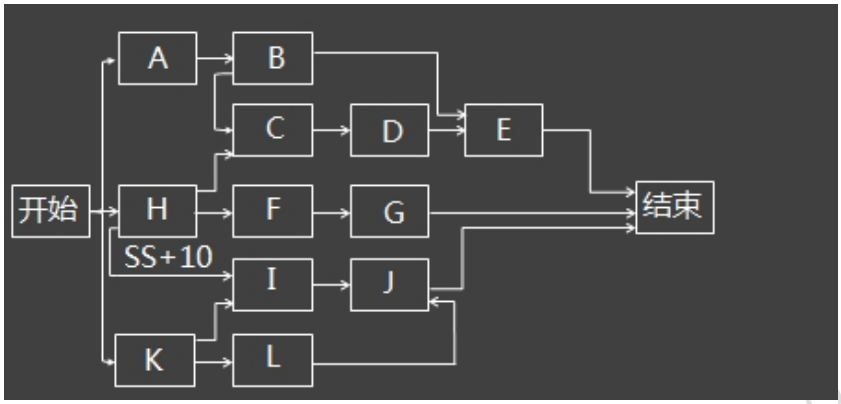

A、活动 H 开始时，开始活动 I　　B、活动 H 完成 10 天后，开始活动 I
C、活动 H 结束时，开始活动 I　　D、活动 H 开始 10 天后，开始活动 I

16、在制定进度计划时，可以采用多种工具与技术，如，关键路径法，资源平衡技术，资源平滑技术等，在以下叙述中，不正确的是（49）。
A、项目的关键路径可能有一条或多条
B、随着项目的开展，关键路径也可能也随着不断变化
C、资源平衡技术往往会导致关键路径延长
D、资源平滑技术往往会改变项目关键路径，导致项目进度延迟

17、关于制定进度计划的工具和技术的描述，不正确的是（48）。
A、总浮动的时间等于本活动的最迟完成时间减去本活动的最早完成时间
B、自由浮动时间等于紧后活动的最早开始时间的最小值减去本活动的最早完成时间
C、资源平滑技术通过缩短项目的关键路径来缩短完工时间
D、关键路径上活动的总浮动时间与自由浮动时间都为 0

18、关于项目进度管理计划的描述,正确的是（43）。
A、项目进度管理计划一旦确定，不能被修改
B、在制定项目进度管理计划时，应该考虑项目章程
C、项目进度管理计划一定要形成正式的文件
D、项目进度管理计划是详细的，不能是高度概括的

19、关于活动和里程碑的描述，不正确是：（43）。
A、活动是实施项目时安排工作的最基本的工作单元
B、一个活动可以属于多个工作包
C、里程碑的持续时间为零
D、里程碑既不消耗资源也不花费成本

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、当前某项目处于进度滞后，成本节约的状态，为了保证项目按时保质完成，后续应优先采取的措施是（46）。

A、赶工，投入更多的资源或增加工作时间

B、降低质控要求，减少问题，减少返工

C、经过甲方同意，减小活动范围或降低活动要求

D、快速跟进，并行施工，缩短关键路径长度

21、关于进度管理的描述，不正确的是（42）。

A、里程碑的持续时间可以为零，也可以不为零

B、活动需要消耗资源和花费成本，里程碑不需要资源和成本

C、活动属性可能随着项目的推进而变化

D、一个项目中可能有几个达到里程碑程度的关键事件

22、关于活动排序的描述，不正确的是（43）。

A、除了首尾两项活动之外，每项活动和每个里程碑都至少有一项紧前活动和一项紧后活动

B、在前导图法中，每项活动有唯一的活动号，每项活动都注明了活动的持续时间

C、在箭线图法中，虚活动可以弥补箭线图在表达活动依赖关系方面的不足

D、内部依赖关系通常是基于具体应用领域的最佳实践或者是基于项目的某些特殊性质而设定

23、关于进度管理的描述，不正确的是（42）。

A、活动是项目工作的最基本的工作单元

B、活动与工作包是一对一或一对多的关系

C、活动具有持续时间，里程碑的持续时间为零

D、活动会占用一定的资源和成本

24、关于进度管理的描述，正确的是（44）。

A、类比估算以过去类似项目的参数值为依据，来估算未来项目的同类参数或指标，因此准确性较高

B、参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性，准确性低，不能用于估算整个项目

C、可对单个活动或整个项目预留应急储备。也可以同时对单个活动和整个项目都预留应急储备

D、管理储备用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险

25、（）不属于编制进度计划所采用的工具和技术。

A、进度网络分析　　B、确定依赖关系　　C、进度压缩　　D、资源平衡

26、（）不是规划项目进度管理的输入。

A、项目范围说明书　　B、WBS 和 WBS 字典　　C、活动清单　　D、项目章程

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

27、（）属于规划项目进度管理的输出。
A、项目管理计划　　B、项目章程　　C、事业环境因素　　D、控制临界值

28、“定义活动”过程的输出不包括（43）。
A、活动清单　　B、范围基准　　C、里程碑清单　　D、活动属性

29、以下（）不是制定进度计划的输出。
A、进度管理计划　　B、进度基准　　C、项目日历　　D、变更请求

30、以下（）不属于估算活动持续时间的输入？
A、进度管理计划　　B、范围基准　　C、里程碑清单　　D、进度预测

31、（）是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。
A、资源平衡　　B、资源平滑　　C、赶工　　D、快速跟进

32、（）基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴。同时还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。
A、敏捷或适应型发布规划　　B、甘特图　　C、时标图　　D、项目日历

33、在进度管理中，裁剪考虑的因素不包括（）。
A、生命周期方法　　B、资源可用性　　C、项目维度　　D、进度计划

34、（）是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。它是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包。
A、滚动式规划　　B、资金限制平衡　　C、提前量与滞后量　　D、进度压缩

35、以下说法中，错误的是（）。
A、应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，应急储备与“已知-未知”风险相关。
B、应急储备可取活动持续时间估算值的某一百分比或某一固定的时间段，亦可把应急储备从各个活动中剥离出来后汇总。
C、应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备，并随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备。
D、管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险，它不包括在进度基准中，也不属于项目总持续时间的一部分。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

36、2020 年 11 月第 34 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

如果一个项目的 SPI=0.75，CPI=0.9，此时项目经理最适合采取（34）方式来控制项目进度。

A、快速跟进　　B、赶工　　C、资源平衡　　D、蒙特卡洛分析

37、2021 年 11 月第 32 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某个程序的两个模块，模块 A 实现设备的运行功能，模块 B 实现设备运行过程中实时监控设备状态数据的功能。则项目计划网络图中，模块 A 和模块 B 的依赖关系可表示为（32）型。

A、F-S　　B、F-F　　C、S-S　　D、S-F

38、2022 年 5 月第 29 题

下表为某项目的 WBS，则此项目的最短工期为（29）月。

工作编号	工作任务	工期
0	X 项目	
1	硬件采购	1 月
2	第三方软件	2 月
3	系统功能	4 月
3.1	设备管理	1 月
3.2	工单管理	1 月
3.3	采购管理	1 月
3.4	库存管理	1 月
4	系统接口	1 月
5	现场实施	1 月

A、3　　B、6　　C、7　　D、9

39、2022 年 5 月第 30 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某项目进度网络图中，活动 A 和 B 之间的依赖关系表示为 SS-8 天，则表明（30）。

A、活动 A 开始 8 天后活动 B 开始　　B、活动 A 开始 8 天前活动 B 开始

C、活动 A 结束 8 天后活动 B 开始　　D、活动 A 结束 8 天前活动 B 开始

马军老师，购课店铺 91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十七章　项目成本管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

涉及到的计算题全部汇总在本书第6章，不在这里重复列出。

1、2023年5月第33题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于成本估算的描述，正确的是（33）。

A、只能用货币单位进行成本估算，不能用人天数或人时数作为计量单位

B、通货膨胀补贴、融资成本不应纳入成本估算

C、参数估算可以针对整个项目，也可针对项目中的某个部分

D、应急储备用于应对项目中不可预知的风险

2、2023年5月第34题

关于控制成本数据分析技术的描述，不正确的是（34）。

A、项目的总计划价值又被称为完工预算(BAC)

B、为实现挣值(EV)所花费的任何成本都应计入实际成本(AC)

C、当项目完工时，进度偏差(SV)可能为零，也可能不为零

D、项目结束时的成本偏差(CV)是完工预算与实际成本之间的差值

3、2023年5月第35题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于成本的描述，不正确的是（35）。

A、投资决策时应尽量考虑沉没成本

B、沉没成本是一种历史成本

C、管理储备不包括在成本基准中

D、管理储备是项目总预算的一部分

4、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

马军老师管理了一个项目，该项目包含3个模块，各模块的成本分别为6、8、9万，其中为了应对风险，马军老师特意预留了2万的管理储备，3万的应急储备，请问马军老师的项目的成本基准是（）。

A、23万　　B、25万　　C、26万　　D、28万

5、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

马军老师正在进行成本估算，发现按三角分布，期望值是30，按β分布，期望值是25，其中乐观值是25，请问悲观值是（）。

A、45　　B、30　　C、20　　D、10

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

6、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

以下（）不属于成本控制的内容？

A、对造成成本基准变更的因素施加影响

B、防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更

C、向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本

D、确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

马军老师准备在大学周围开一个宾馆，他估计该项目投资需要20万，考虑到风险，他预留了10%的管理储备和5%的应急储备，则该项目的总预算为（）。

A、20万　　B、21万　　C、23万　　D、22万

8、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在制定预算的过程中，可以使用以下哪种工具或技术（）。

A、三点估算　　B、类比估算　　C、资金限制平衡　　D、完工尚需绩效指数

9、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

以下说法中，（）是错误的？

A、使用挣值管理技术的项目，可以使用挣值代替绩效测量基准

B、挣值分析将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。

C、挣值分析把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效测量基准。

D、PV的总和有时被称为绩效测量基准(PMB)

10、2023年11月第4批

在进行成本估算时，（）不是直接成本。

A、项目人员的工资　　B、项目所用的材料　　C、电费　　D、分包商的费用

11、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目预算与成本基准之间的差额是（）。

A、应急储备　　B、应付未付的成本　　C、管理储备　　D、应收未收的收入

12、2024年5月第1批

关于成本管理的描述，不正确的是:（）。

A、在项目过程中，不应只关心完成项目活动所需资源的成本，也需考虑项目决策对项目最终产品的使用和维护成本的影响

B、成本估算和成本预算是两个过程，即使是很小的项目，也需要由不同的人员来分别完成，以保证估算和预算过程的客观性和独立性

C、全生命周期成本管理经常与价值工程技术结合使用，用于降低成本，缩短时间，提高

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目可交付成果的质量和绩效，并优化决策过程

D、项目成本管理应当考虑项目干系人的需要，不同的项目干系人可能在不同的时间以不同的方式测算项目的成本

13、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

成本管理计划中通常不会规定( )。

A、准确度　　B、控制临界值　　C、精确度　　D、薪酬结构

14、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于制定预算的描述，不正确的是（）。

A、项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金

B、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

C、制定预算过程的主要作用是确定项目所需资金

D、制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程

15、2024 年 5 月第 2 批

用于估算成本的项目管理计划组件不包括（）。

A、项目章程　　B、范围基准　　C、成本管理计划　　D、质量管理计划

16、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某项目的项目经理在成本控制过程中，发现成本偏差(CV)呈现负值，为了采取有效的纠正措施，优先策略是（）。

A、降低项目质量要求，以实现更高的成本效益

B、识别并减少冗余活动的工作量，以降低成本

C、减少合同交付内容，以减少成本负担

D、增加项目范围，以提高收入来降低成本超支

17、2024 年 5 月第 2 批

在估算成本过程中，( )是该过程的输入，( )是该过程的输出。

A、项目范围说明书、成本管理计划

B、历史信息、项目预算

C、工作分解结构(WBS)、资源需求

D、资源需求清单、估算依据

18、2025 年 5 月第 1 批

制定预算过程的主要输出是（），控制成本过程的主要输出是（）。

A、成本预测　成本估算　　B、成本基准　成本预测

C、成本管理计划　成本基准　　D、成本估算　成本基准

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

19、2025 年 5 月第 1 批

以下工具与技术中，（）不能用于规划成本管理。

A、会议　　B、成本汇总　　C、备选方案分析　　D、专家判断

20、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于项目成本管理过程的相关描述，不正确的是（）。

A、当动用管理储备资助不可预见的工作时，就要把动用的管理储备增加到成本基准中，此时会导致成本基准的变更

B、应急储备是不包含在成本基准内的预算，用来应对那些会影响项目的“已知-未知”风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险

C、预知有些项目可交付成果需要返工，却不知道返工的工作量是多少，可以预留应急储备来应对这些未知数量的返工工作

D、管理储备是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，属于项目总预算和资金需求的一部分，用来应对会影响项目的“未知-未知”风险

21、2025 年 5 月第 2 批

在项目成本管理中，（）是制定预算过程的输入，（）是制定预算过程的输出。

A、风险登记册　　成本预测　　B、项目资金需求　　成本基准

C、协议　　成本基准　　D、成本估算　　变更请求

22、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某项目经理在估算某软件开发活动的成本时，发现该项目模块与历史项目高度相似，但当前项目要求引入 AI 技术，导致开发工作量增加 10%。项目经理参考了历史项目的功能点成本数据，并结合 AI 技术的复杂度系数进行调整，最终得出活动成本估算值。项目经理主要使用了以下哪种技术（）。

A、三点估算　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、储备分析

23、2025 年 5 月第 2 批

某项目的完工预算（BAC）为 560 万元，实际成本（AC）为 200 万元，挣值（EV）为 160 万元。项目经理发现一个已识别的风险发生，需额外支出 20 万元。同时，团队新识别了一个高风险，预计需 30 万元应对，但该风险未在风险登记册中记录。如果按照当前绩效，项目经理重新计算完工估算（EAC）的值是（）。

A、630 万元　　B、730 万元　　C、650 万元　　D、750 万元

24、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

不属于成本管理计划的核心内容的是（ ）。

A、成本的实际支出记录　　B、成本估算的精度要求

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、成本偏差的控制阈值　　D、绩效测量规则

25、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目预算的相关描述，不正确的是（ ）。

A、项目资金通常以均衡的增量的方式投入

B、对于使用挣值管理的项目，成本基准指的是绩效测量基准

C、如果有管理储备,则总资金需求等于成本基准加管理储备

D、汇总各控制账户的成本可得成本基准

26、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

下列正确的描述是（ ）。

A、应急储备属于项目总预算，但不属于成本基准

B、管理储备包含在成本基准之内，用于应对已知—未知风险

C、应急储备用来应对已识别风险，用量可以通过定量分析来确定

D、动用管理储备不需要走变更控制流程

27、2026 年 5 月第 2 批

关于项目成本管理过程的描述，不正确的是（）。

A、项目成本管理包括规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本四个过程

B、对易变性高、范围并未完全明确、经常发生变更的项目，必须要进行详细的成本计算

C、项目经理可根据需要裁剪项目成本管理过程，裁剪时应考虑知识管理、估算和预算、挣值管理、敏捷方法的使用和治理等因素

D、在项目实际进展中，项目成本管理的各过程会相互交叠和相互作用

28、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

“材料、设备、服务、汇率、应急储备、管理储备”这六个因素，在估算成本时，应考虑其中的（）个。

A、4　　B、6　　C、3　　D、5

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、关于成本管理的描述，正确的是（）。

A、管理成本不在成本基准内，但是属于项目总成本的一部分。

B、成本管理的过程依次是：规划成本管理、成本预算、成本估算、成本控制。

C、制定预算时，可以先把成本估算汇总到 WBS 中的工作包，再由工作包汇总至 WBS 的更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、任何项目都需要进行融资。

2、以下（）不是成本控制的输出。
A、工作绩效信息　　B、成本预测　　C、变更请求　　D、成本基线

3、以下关于成本估算和预算的说法中，正确的是（）。
A、成本估算需要考虑管理储备　　B、成本预算需要考虑应急储备
C、成本估算是成本预算的基础　　D、成本基线是成本估算的结果

4、以下（）是错误的。
A、成本基准中包括预计支出及预计债务。项目资金通常以增量的方式投入，并且可能是非均衡的。
B、成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。
C、适用于估算成本过程的决策技术是投票。投票是为达成某种期望结果而对多个未来行动方案进行评估的过程。这些技术可以调动团队成员的参与，提高估算的准确性，并提高对估算结果的责任感。
D、马军老师管理的项目成本超支了，马军老师打算采用挣值分析进行纠偏。

5、以下（）不属于成本估算的工具和技术。
A、备选方案分析　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、SWOT

6、利用一定的时间或资源生产或交付一种产品或服务，而失去利用这些资源生产或交付其他最佳替代品的机会就是（）。
A、机会成本　　B、沉没成本　　C、直接成本　　D、间接成本

7、汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准是（）的作用。
A、规划成本管理　　B、估算成本　　C、制定预算　　D、控制成本

8、以下（）不属于成本管理计划的内容。
A、计量单位　　B、组织程序链接　　C、精确度　　D、成本估算依据

9、（）首先对单个工作包或活动的成本进行最具体、细致的估算，然后把这些细节性成本向上汇总或“滚动”到更高层次，用于后续报告和跟踪。
A、自下而上估算　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、三点估算

10、以下（）不属于成本估算的输入。
A、质量管理计划　　B、范围基准　　C、资源需求　　D、估算依据

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

11、（）有助于进行参数估算或类比估算，历史信息包括各种项目特征（参数），它们用于建立数学模型预测项目总成本。这些数学模型可以是简单的，也可以是复杂的。
A、审核历史信息　　B、数据分析　　C、资金限制平衡　　D、成本汇总

12、以下（）不属于控制成本的内容。
A、对造成成本基准变更的因素施加影响
B、向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本
C、监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差
D、建立一个经批准的成本基准

13、以下关于应急储备、管理储备的说法中，正确的是（）。
A、管理储备就是管理成本。
B、项目总预算等于应急储备+成本基线
C、应急储备的使用不需要再次经过批准
D、管理储备不属于项目总预算的一部分。

14、项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费属于（）。
A、直接成本　　B、间接成本　　C、沉没成本　　D、机会成本

15、不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本属于（50）。
A、固定成本　　B、直接成本　　C、间接成本　　D、沉没成本

16、马军老师正在进行成本估算，他通过考虑估算中的不确定性与风险，使用三种估算值来界定活动成本的近似区间，可以提高单点成本估算的准确性，他用的是（）。
A、三点估算　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、标杆对照

17、马军老师正在进行成本估算，他使用以往类似项目的参数值或属性来估算，他用的是（）。
A、三点估算　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、标杆对照

18、以下说法中，错误的是（）。
A、CPI＞1，成本节约
B、CV＜0，成本超支
C、马军老师第8天工作结束后进行了检查，发现前面有偏差，他按原计划继续进行，属于典型
D、CV＞0，SV＜0,可以采用赶工的纠正措施

19、进行项目估算时，需要根据项目的特点等因素，决定采用何种估算方法。（50）方法的准确

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

性会受到所采用估算模型的成熟度和基础数可靠性的影响。
A、专家判断　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、自下而上估算

20、在进行项目成本估算时，可以使用多种技术和工具，其中（51）相对于其他估算技术来说，成本较低，耗时较少，但准确性也较低。
A、专家判断　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、三点估算

21、投资者赵某可以选择股票和储蓄存款两种投资方式。他于2017年1月1日用2万元购进某股票，一年后亏损了500元，如果当时他选择储蓄存款，一年后将有360元的收益。由此可知，赵某投资股票的机会成本为（50）元。
A、500　　B、360　　C、860　　D、140

22、关于项目成本估算所采用的技术和工具，不正确的是：（51）。
A、成本估算需要采用定量方法，与估算人员的技术和管理经验无关
B、三点估算法涉及到最可能成本、最乐观成本和最悲观成本
C、类比估算相对于其他估算技术，具有成本低、耗时少、准确率低的特点
D、在估算活动成本时，可能会受到质量成本因素的影响

23、关于成本估算相关技术的描述,正确的是（49）。
A、参数估算中会使用到历史数据,因此比类比估算的准确性要高
B、参数估算适合在项目的早期阶段详细信息不足时采用
C、类比估算法通常成本较高、耗时较多
D、类比估算既可以针对整个项目，也可以针对项目中的某个部分

24、关于成本管理计划的描述，不正确的是：（48）。
A、成本管理计划包含在项目管理计划中，或作为其从属分计划
B、成本管理计划可以是正式的，也可以是非正式的
C、成本管理计划可以是非常详细的，也可以是概括性的
D、制定成本管理计划的工作在项目计划阶段的后期进行

25、通过在项目计划中添加强制日期解决资金计划和支出之间的差异，属于（49）。
A、资金储备分析　　B、专家判断　　C、成本汇总　　D、资金限制平衡

26、关于成本预算和成本基推的描述，不正确的是（48）。
A、成本预算是将已批准的项目总的估算成本分摊到项目的各项具体活动和各个具体项目阶段
B、多项目，特别是大项目，可能有多个成本基准
C、根据成本基准来确定总资金需求和阶段性（如季度或年度）资金需求
D、动用管理储备不会影响项目的成本基准

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

27、关于成本估算的描述，不正确的是（47）。
A、成本估算应识别和考虑各种成本计算方案
B、成本估算应考虑项目工期要求和质量要求对成本的影响
C、成本估算时应同时考虑应急储备和管理储备
D、估算依据应清晰、完整地说明估算是如何编制的

28、以下（）不是成本估算的工具。
A、融资　　B、储备分析　　C、三点估算　　D、类比估算

29、以下（）不是成本控制的输入。
A、绩效测量基准　　B、成本基准　　C、项目资金需求　　D、成本预测

30、在规划成本管理过程中，（）包括审查筹资的战略方法，如自筹资金、股权投资、借贷投资等，还可以包括对筹集项目资源的方法（如自制、采购、租用或租赁）的考量。
A、备选方案分析　　B、假设情景分析　　C、面向X的设计　　D、敏感性分析

31、满足以下（）情况时，模型预测最为可靠。
①用来建立模型的历史信息准确②模型中的参数易于量化③模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。
A、①②③　　B、②③　　C、①②　　D、①③

32、成本管理中，裁剪考虑的因素不包括（）。
A、知识管理　　B、估算和预算　　C、治理　　D、成本管理计划

33、2018年5月第58题
（58）不属于制定预算过程的输出。
A、成本基准　　B、范围基准　　C、项目资金需求　　D、更新的活动成本估算

34、2018年11月第58题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*
（58）利用历史数据之间的统计关系和其他变量，来进行项目工作的成本估算。
A、类比估算　　B、参数估算　　C、自下而上估算　　D、三点估算

35、2018年11月第59题
成本预算的输入不包括（59）。
A、项目进度计划　　B、风险登记册　　C、协议　　D、成本基准

36、2018年11月第60题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

控制成本过程输出，不包括（60）。

A、项目资金需求　　B、项目文件更新　　C、工作绩效信息　　D、成本预测

37、2019 年 5 月第 58 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于成本基准的描述，不正确的是（58）。

A、大项目可能有多个成本基准

B、成本基准的变更需要通过变更控制程序

C、成本基准中既包括预计的支出，也包括预计的债务

D、项目预算是成本基准与应急储备之和

38、2019 年 11 月第 35 题

关于成本估算的描述，正确的是（35）。

A、成本估算是在某特定时点，根据已知信息所做出来的成本预测

B、成本估算的准确性随着项目的进展而逐步下降

C、融资成本不应纳入成本估算

D、项目进度发现变化，但范围没有变化，对成本估算不产生影响

39、2019 年 11 月第 36 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于成本管理的描述，不正确的是（36）。

A、成本基准不包括管理储备

B、成本基准中包括预计的支出，但不包括预计的债务

C、管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险

D、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

40、2020 年 11 月第 36 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于成本估算与预算的描述，不正确的是（36）。

A、成本估算的作用是确定完成工作所需的成本数额

B、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

C、成本预算过程的输出是成本基准，是监督和控制项目绩效的依据。

D、项目预算包含应急储备，但不包含管理储备

41、2021 年 5 月第 35 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

项目经理第一次承接移动端 APP 的软件开发项目，在做成本估算时，考虑了最不利的情况，估算出成本为 90 人日，最有利的情况下成本为 45 人日，公司的期望成本为 60 人日。基于贝塔分布的三点估算法，该项目的估算成本为（35）人日。

A、55　　B、50.5　　C、65　　D、62.5

42、2021 年 5 月第 36 题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

关于项目成本预算的描述，不正确的是（36）。

A、范围基准、风险登记册和活动成本估算是制定预算过程的有效输入

B、资源日历中可获得项目资源种类和使用时间，以确定各阶段的资源成本

C、做项目成本预算时，需按照正态分布规律，依时间段分配成本

D、成本基准是经过批准的，包括应急储备，但不包括管理储备

43、2022 年 5 月第 34 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于制定预算的描述，不正确的是（34）。

A、成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算

B、项目总资金需求是根据资金投入计算出的成本预算

C、成本基准中的成本估算与进度活动直接关联

D、项目资金通常以增量而非连续的方式投入

44、2022 年 11 月第 32 题

A 公司承接一报告厅音频系统改造项目，根据过去三次同类项目经验，现场改造需要的成本与现场布点数、服务器数量两个因素有关，具体如表所示。利用线性回归分析建立参数法估算模型（Z=aX+bY+c），依据该模型估算得出本次现场改造的成本为（32）万元。

项目	布点数（X）	服务器数量（Y）	成本（Z）
项目 A	30	2	300
项目 B	50	1	280
项目 C	100	3	590
本项目	80	2	?

A、380　　B、420　　C、450　　D、48

45、2022 年 11 月第 33 题

（33）属于成本基准。**（此题为常规重点考题，建议举一反三）**

①管理储备 ② 应急储备 ③ 材料成本 ④服务费

A、①③④　　B、①②③　　C、①②④　　D、②③④

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十八章　项目质量管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第36题

关于质量的描述，正确的是（36）。

A、功能、性能、价格可作为衡量质量的指标

B、质量与等级相关，等级的高低决定了质量的好坏

C、预防错误的成本通常高于检查并纠正错误的成本

D、项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据

2、2023年5月第37题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（37）过程的作用之一是识别无效过程和导致质量低劣的原因。

A、规划质量　　B、管理质量　　C、检查质量　　D、控制质量

3、2023年5月第38题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于控制质量的描述，不正确的是（38）。

A、控制质量的目的是在用户验收和最终交付之前，测量产品或服务的完整性、合规性和适用性

B、控制质量时，控制图可用于确定一个过程是否稳定

C、在瀑布或预测型项目中，控制质量活动通常由特定团队成员在整个项目生命周期中持续执行

D、质量检查既可以针对单个活动的成果，也可以针对项目的最终产品

4、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在敏捷型项目中，整个项目期间的质量管理由所（）执行；但在传统项目中，质量管理通常是（）成员的职责。

A、所有团队成员　特定团队成员　　B、特定团队成员　所有团队成员

C、所有团队成员　所有团队成员　　D、特定团队成员　特定团队成员

5、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

以下（）不属于质量控制的输入？

A、可交付成果　　B、工作绩效数据　　C、测试与评估文件　　D、质量控制测量结果

6、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

以下（）属于控制质量的作用？

A、识别无效过程

B、使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、提高实现质量目标的可能性

D、确定项目输出是否达到预期目的，这些输出需要满足所有适用标准、要求、法规和规范。

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。

A、因果图　　B、亲和图　　C、甘特图　　D、直方图

8、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

A、矩阵图　　B、直方图　　C、甘特图　　D、亲和图

9、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

以下关于问题解决，说法错误的是（）。

A、问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方法。

B、问题可能在控制质量过程或质量审计中发现，也可能与过程或可交付成果有关。

C、问题解决方法通常包括以下要素：定义问题，识别根本原因，生成可能的解决方案，选择最佳解决方案，执行解决方案，验证解决方案的有效性等。

D、使用非结构化的问题解决方法有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。

10、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不是规划质量管理的工具。

A、流程图　　B、思维导图　　C、矩阵图　　D、散点图

11、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

与项目有关的质量成本（COQ）包含以下一种或多种成本：（）、评估成本、失败成本（内部/外部）。

A、纠错成本　　B、开发成本　　C、测试成本　　D、预防成本

12、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）的作用是识别无效过程和导致质量低劣的原因。

A、规划质量　　B、控制质量　　C、评估质量　　D、管理质量

13、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在执行质量管理相关过程时，质量经理对提交的成果进行了审查，将发现的问题记录并给出了纠正措施建议，该质量经理正在执行（）过程。

A、控制质量　　B、管理质量　　C、规划质量管理　　D、持续改进

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于“管理质量”过程的描述，不正确的是( )。

A、管理质量是把组织的质量政策用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程

B、管理质量是所有人的共同职责，包括项目经理、项目团队、项目发起人、执行组织的管理层

C、管理质量包括所有质量保证活动，与产品设计和过程改进无关

D、管理质量过程需要在整个项目期间开展

15、2024 年 5 月第 1 批

常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具是 PDCA 和（）。

A、流程图　　B、六西格玛　　C、决策树分析　　D、蒙特卡洛模拟

16、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在规划质量管理过程中，确定项目和产品质量标准时的正确做法是( )。

A、使用决策分析识别达到项目目标所需的关键活动

B、使用回归分析展示项目团队成员的技能分布

C、使用流程图分析评估项目成本与质量之间的关系

D、使用因果图监控项目过程中的质量和性能表现

17、2024 年 5 月第 2 批

关于控制质量过程目的的描述，正确的是（）。

A、在用户验收和最终交付之前测试产品或服务的完整性、合规性、适用性

B、识别项目及其可交付成果的质量要求、标准，并描述将如何证明符合质量要求

C、评估项目团队成员的绩效，确保项目输出敏捷、高效且满足管理层期望

D、着眼于项目后评估的过程，旨在高效地执行项目过程，包括遵守和满足标准

18、2024 年 5 月第 2 批

关于项目质量管理的描述,不正确的是（）。

A、质量管理由独立的质量保证团队在项目生命周期的特定阶段执行

B、质量目标是落实质量方针的具体要求，从属于质量方针

C、质量管理是为了实现质量目标而进行的所有质量性质的活动

D、质量方针是由组织最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向

19、2025 年 5 月第 1 批

关于项目质量管理过程的相关描述，不正确的是（）。

A、项目质量管理适用于所有项目，无论项目的可交付成果具有何种特性

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据

C、质量是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的等级分类

D、预防错误的成本通常远低于在检查或使用中发现并纠正错误的成本

20、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目经理想要选取合适的数据表现技术控制质量，当他想要按照来源或组成部分展示缺陷数量时，应采用（）,当他想同步展示计划绩效和实际绩效时应采用（）。

A、直方图、控制图　　B、直方图 散点图

C、散点图　控制图　　D、控制图 直方图

21、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下质量成本项中。属于预防成本的是（），属于内部失成本的是（）。

A、培训费用　报废成本　　B、测试成本 保修工作

C、债务成本　返工费用　　D、返工费用　债务成本

22、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于管理质量相关的描述，正确的是（）。

A、管理质量就是质量保证

B、管理质量的工作属于非一致性成本

C、管理质量与产品设计和过程改进无关

D、识别无效过程是管理质量的作用之一

23、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）过程关注整个项目期间的质量，（）过程关注工作需要达到的质量，（）过程关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受。

A、规划质量管理　控制质量　管理质量

B、管理质量　　规划质量管理　　控制质量

C、规划质量管理　管理质量　控制质量

D、控制质量规划　质量管理　　管理质量

24、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）可以用于对计划绩效和实际绩效进行对比。

A、因果图　　B、散点图　　C、偏差分析　　D、控制图

25、2026 年 5 月第 1 批

关于项目质量管理基础的描述，正确的是（ ）。

A、质量是指产品或服务满足明确需求的程度

B、质量管理按照规划质量管理、管理质量和控制质量过程顺序开展

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、项目质量管理仅关注项目可交付物的质量

D、控制质量过程会产生相关成本，主要是评估成本和内部失败成本

26、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在质量管理工具中，可帮助改进过程并识别可能出现质量缺陷或可以纳入质量检查的地方的工具是（ ）。

A、控制图　　B、直方图　　C、流程图　　D、散点图

27、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某项目团队需要从三个候选技术方案中做出选择。他们从功能性，易用性和成本效益三个方面进行评估，权重分别设置为 0.4，0.3，0.3。通过对方案进行加权评分，最终选择了第二方案。项目团队在管理质量过程中采用的工具与技术是（）。

A、成本效益分析　　B、决策树分析　　C、根本原因分析　　D、多标准决策分析

28、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目质量管理过程中，（）关注工作需要达到的质量，（）关注工作成果与质量要求的比较。

A、管理质量　控制质量　　B、规划质量管理　控制质量

C、控制质量　规划质量管理　　D、控制质量　管理质量

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下说法，不正确的是（）。

A、五星级酒店等级高，肯定可以满足马军老师的质量要求

B、全面质量管理有 4 个核心的特征包括：全员参加的质量管理、全过程的质量管理、全面方法的质量管理和全面结果的质量管理。

C、干系人参与计划是规划质量管理的依据

D、标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

2、以下各选项，正确的是（）。

A、流程图也称过程图，用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。

B、矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的强弱关系。

C、因果图又称“鱼骨图”“why-why 分析图”和“石川图”，可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。

D、直方图是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

3、（）不属于质量管理计划的内容。
A、项目的质量目标　　B、质量角色与职责
C、项目使用的质量工具　　D、质量成本的分类

4、（）不是管理质量的工具。
A、核对单　　B、质量审计　　C、面向 X 的设计　　D、控制图

5、以下（）是不正确的。
A、质量报告可能是图形、数据或定性文件，其中包含的信息可帮助其他过程和部门采取纠正措施，以实现项目质量期望。
B、可基于行业需求和组织模板创建测试与评估文件。它们是控制质量过程的输入，用于评估质量目标的实现情况。这些文件可能包括专门的核对单和详尽的需求跟踪矩阵。
C、核查表有助于以结构化的方式管理控制质量活动。
D、开展控制质量过程的结果是核实的可交付成果，后者又是确认范围过程的一项输入，以便正式验收。

6、（）过程关注工作需要达到的质量，（）则关注管理整个项目期间的质量。在管理质量过程期间，在规划质量管理过程中识别的质量要求成为测试与评估工具，将用于控制质量过程，以确认项目是否达到这些质量要求。（）关注工作成果与质量要求的比较，确保结果可接受。
A、规划质量管理　　管理质量　　控制质量
B、管理质量　　规划质量管理　　控制质量
C、控制质量　　规划质量管理　　管理质量
D、规划质量管理　　控制质量　　管理质量

7、（）在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的强弱关系。
A、矩阵图　　B、思维导图　　C、逻辑数据模型　　D、流程图

8、以下（）不是管理质量的输入。
A、质量控制测量结果　　B、质量测量指标　　C、风险报告　　D、测试与评估文件

9、（）是一种展示两个变量之间关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。
A、散点图　　B、亲和图　　C、面向 X 的设计　　D、问题解决

10、质量控制的输出不包含（）。
A、验收的可交付成果　　B、工作绩效信息　　C、质量控制测量结果　　D、变更请求

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

11、以下关于质量审计的叙述中，不正确的是（48）。

A、质量审计是对具体质量管理活动的结构性评审

B、质量审计可以是事先安排，也可以随机进行

C、质量审计只能由外部审计师进行

D、质量审计可检查已批准的变更请求的实施情况

12、在质量管理中，可以使用（49）判断一个过程是否处于控制状态还是处于失控状态。

A、散点图　　B、运行图　　C、控制图　　D、因果图

13、某电池生产厂商为了保证产品的质量，在每一块电池出厂前做破坏性测试所产生的成本属于（63）。

A、项目开发成本，不属于质量成本　　B、质量成本中的非一致性成本

C、质量成本中的评价成本　　D、质量生产中的内部失败成本

14、关于质量审计目标的描述，不正确的是（64）。

A、强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献

B、识别全部违规做法、差距及不足

C、分享所在组织或行业中类似项目的良好实践

D、积极主动地提供协助，以便确定项目过程是否可控

15、项目质量是应顾客需求进行的，不同顾客有着不同的质量要求，（62）是项目质量管理的主要依据。

A、项目目标　　B、用户需求　　C、项目合同　　D、项目范围

16、（63）不是质量控制的输出。

A、质量控制测量结果　　B、核实的可交付成果

C、批准的变更请求　　D、工作绩效信息

17、某耳机制造商每生产100个耳机就抽取10个进行全面质量检查，此活动（63）。

A、属于质量控制　　B、属于管理质量

C、属于规划质量管理　　D、可以确保生产出的所有耳机质量达标

18、以下（）不属于管理质量的输出。

A、质量报告　　B、测试与评估文件　　C、质量控制测量结果　　D、变更请求

19、以下（）不是管理质量的工具。

A、亲和图　　B、因果图　　C、流程图　　D、控制图

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、以下（）是规划质量的输出。

A、质量测量指标　　B、质量控制测量结果　　C、质量报告　　D、测试与评估文件

21、以下（）不是裁剪需要考虑的因素。

A、政策合规与审计　　B、标准与法规合规性　　C、持续改进　　D、沟通管理

22、在规划质量管理过程中，（）提供了识别、分析和管理需求的方法，以供质量管理计划和质量测量指标借鉴。

A、需求管理计划　　B、需求文件　　C、范围基准　　D、需求跟踪矩阵

23、在规划质量管理过程中，（）是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。

A、成本效益分析　　B、质量成本　　C、备选方案分析　　D、标杆对照

24、（）把组织数据可视化，用业务语言加以描述，不依赖任何特定技术。可用于识别会出现数据完整性或其他问题的地方。

A、逻辑数据模型　　B、流程图　　C、矩阵图　　D、思维导图

25、以下（）不属于质量测量指标的内容。

A、团队离职率　　B、识别的日缺陷数量　　C、每个代码行的错误　　D、测试覆盖度

26、（）属于管理质量的目的。

①通过执行有关产品特定方面的设计准则，设计出最优的成熟产品

②建立信心，相信通过质量保证工具和技术（如质量审计和故障分析）可以使未来输出在完工时满足特定的需求和期望

③确保使用质量过程并确保其使用能够满足项目的质量目标

④提高过程和活动的效率与效果，获得更好的成果和绩效并提高干系人的满意度

A、①②③④　　B、①②③　　C、②③　　D、③④

27、（）可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素以及非增值活动。

A、过程分析　　B、备选方案分析　　C、文件分析　　D、假设条件和制约因素分析

28、2017年11月第64题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

质量成本包括预防不符合要求，为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本，对于质量保证人员而言，其职业生涯过程中往往处于因不产生效益而尴尬的境地，从质量成本角度来看，其原因是因为质量保证工作发生的成本属于（64）。

A、预防成本　　B、外部失败成本　　C、内部失败成本　　D、评价成本

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

29、2017 年 11 月第 65 题

下图是质量控制中常用到的 SIPOC 模型，数字 1/2 部分代表的模型内容为（65）。

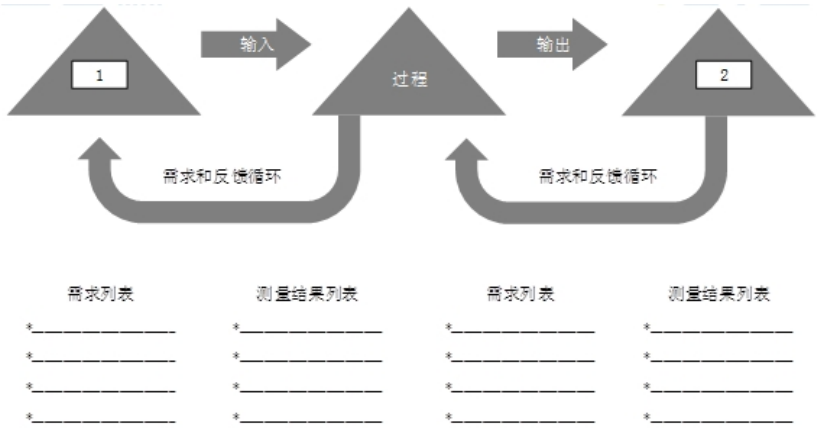

A、建设方　承建方　　B、供应商　客户

C、买方　卖方　　D、生产者　消费者

30、2018 年 5 月第 63 题

规划质量管理的输入不包含（63）。

A、质量测量指标　　B、项目管理计划　　C、需求文件　　D、风险登记册

31、2018 年 11 月第 64 题

质量规划管理过程的事业环境因素不包括（64）。

A、可能影响项目质量的工作条件或运行条件

B、特定应用领域的相关规则、标准和指南

C、可能影响质量期望的文化观念

D、以往阶段或项目的经验教训

32、2018 年 11 月第 66 题

质量控制的输入，不包括（66）。

A、项目管理计划　　B、确认的变更　　C、质量测量指标　　D、工作绩效数据

33、2019 年 5 月第 63 题

根据项目进度基准和成本基准制定质量测量指标，属于（63）阶段的工作内容。

A、质量评价　　B、质量控制　　C、实施质量保证　　D、规划质量管理

34、2019 年 11 月第 40 题

（40）监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更。

A、质量规划　　B、管理质量　　C、质量控制　　D、质量改进

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

35、2020 年 11 月第 38 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

为保证项目实施质量，公司组织项目成员进行了三天专业知识培训。该培训成本属于（38）。

A、内部失败成本　　B、外部失败成本　　C、评估成本　　D、预防成本

36、2020 年 11 月第 40 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于控制质量工具的描述，不正确的是（40）。

A、控制图可以判断某一过程是否处于控制之中

B、统计抽样从总体中抽取一部分相关样本用于检查和测量

C、关联图中一条斜线上的数据点距离越近表示关系越密切

D、质量审计可用于确认已批准的变更请求的实施情况

37、2021 年 5 月第 38 题

（38）不属于“规划质量管理”过程的输出。

A、质量管理计划　　B、质量测量指标

C、需求文件　　D、范围基准更新

38、2021 年 5 月第 39 题

（39）过程的主要作用是确认项目的可交付成果来满足干系人的既定需求。

A、质量规划　　B、管理质量　　C、质量控制　　D、质量过程改进

39、2021 年 11 月第 38 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

规划质量管理的目的是（38）。

A、准备对策，确保符合质量要求

B、建立对未来输出在完工时满足特定需求和期望的信心

C、评估绩效

D、确保项目满足承诺的需求

40、2022 年 5 月第 36 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某公司在教育服务领域持续发展，已有丰富的项目经验，近日新立项的教育服务项目 A 需要规划质量管理，则应采用（36）的方法。

A、成本收益分析法　　B、质量成本法　　C、标杆对照法　　D、实验设计

41、2022 年 11 月第 37 题

在质量控制中，根据控制图七点运行定律，（37）需要接受检查。

马老师 购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

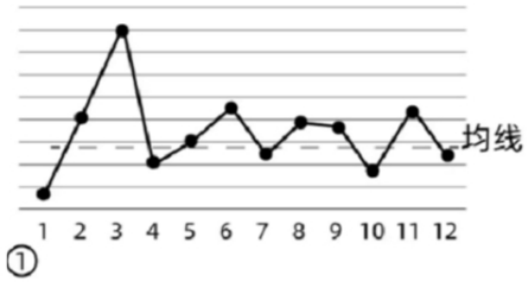

①

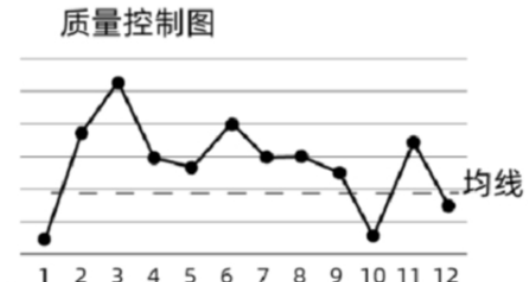

②

A、只有①　　B、只有②　　C、①和②　　D、①和②都没有

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第十九章　项目资源管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第39题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（39）不属于团队章程的内容。

A、团队价值观　　B、资源日历　　C、沟通指南　　D、冲突处理过程

2、2023年5月第40题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于团队管理的描述，不正确的是（40）。

A、滥用惩罚权力可能会导致项目失败，应谨慎使用

B、在赫茨伯格双因素理论中，保健因素的满足可以消除不满，激励因素的满足可以产生满意感

C、奖励权利来自于组织的授权，参照权利来自于管理者自身

D、X理论可以激发员工主动性，Y理论注重加强管理与惩罚

3、2023年5月第41题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（41）不是虚拟团队的优势。

A、更好地利用不在同一地理区域的专家的专业技术

B、提高沟通效率，便于分享知识和经验

C、将在家办公的员工纳入团队

D、节约差旅费用和办公场地费用

4、2023年5月第42题

（42）过程的主要作用是确保所分配的资源可适时、适地用于项目。

A、规划资源　　B、获取资源　　C、估算活动资源　　D、控制资源

5、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

建设高效的项目团队是（）的主要职责之一。

A、项目经理　　B、职能经理　　C、PMO　　D、项目发起人

6、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是指事先确定项目的实物或团队资源。

A、预分派　　B、虚拟团队　　C、集中办公　　D、冲突管理

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

适用于建设团队过程的人际关系与团队技能不包括（）。

A、冲突管理　　B、影响力　　C、团队建设　　D、虚拟团队

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

8、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

（）不是影响资源规划的事业环境因素？

A、组织文化和结构　　B、设施和资源的物理分布

C、现有资源的能力和可用性　　D、物质资源管理政策和程序

9、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于团队建设的说法中，错误的是（）。

A、形成阶段。一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。

B、震荡阶段。团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且怀疑项目经理的能力。

C、规范阶段。随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常以第一称谓称呼团队，如“我们组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。

D、优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历 5 个阶段，而且 5 个阶段可以跳着来。

10、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在 RACI 中，C 是（）。

A、执行　　B、负责　　C、咨询　　D、知情

11、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

控制资源是确保按计划为项目分配（）资源。

A、实物资源　　B、人力资源　　C、团队资源　　D、团队和实物

12、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

哪个（）不能用于评价团队绩效？

A、变更次数　　B、个人能力提升　　C、离职率降低　　D、团队能力提升

13、2023 年 11 月第 4 批

项目管理信息系统包括（）软件，用于监督资源的使用情况，协助确保合适的资源适时、适地用于合适的活动。

A、资源管理或进度计划　　B、CRM 系统　　C、采购系统或智能分析　　D、BOM 系统

14、2023 年 11 月第 4 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）估算方法将以往类似项目的相关信息作为估算未来项目的基础，是一种快速估算方法，

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

适用于项目经理只能识别WBS的几个高层级的情况。

A、类比　　B、基线　　C、自下而上　　D、参数

15、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在获取资源过程中,( )情况下不需要采用预分派。

A、项目需要采购外部资源

B、在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作

C、在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作

D、项目取决于特定人员的专有技能

16、2024年5月第1批

由于每个项目都是独特的，项目经理可以根据需要对项目资源管理过程进行裁剪。裁剪时考虑的因素不包括（）。

A、物理位置　　B、团队管理　　C、沟通技术　　D、生命周期方法

17、2024年5月第2批

（）用于展示团队成员的职责分配和角色。

A、干系人参与度评估矩阵　　B、责任分配矩阵

C、组织分解结构　　D、工作分解结构

18、2024年5月第2批

关于估算活动资源过程的描述不正确的是（）。

A、资源管理计划是估算活动资源过程的输入，定义了识别项目所需不同资源的方法，还定义了量化各活动所需的方法

B、资源日历是估算活动资源过程的输出，识别每种具体资源可用时间和时长

C、资源需求清单详细列出了未完成项目活动所需的各种资源，包括人力资源和物资等

D、历史信息提供以往项目中资源使用的数据和经验教训

19、2025年5月第1批

关于建设团队过程的描述，不正确的是（）。

A、本过程输入的项目文件主要包括团队章程、项目进度计划、资源日历、项目团队派工单

B、团队协作是项目成功的关键因素，而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责

C、团队绩效评价是建设团队过程的输入，同时是管理团队过程的输出

D、适用于本过程的人际关系与团队技能包括:冲突管理、影响力、激励、谈判、团队建设

20、2025年5月第1批

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（）不是估算活动资源的输出。

A、资源日历　　B、估算依据　　C、资源需求　　D、资源分解结构

21、2025 年 5 月第 1 批

（）不是控制资源过程的输入。

A、工作绩效信息　　B、物质资源分配单　　C、问题日志　　D、风险登记册

22、2025 年 5 月第 1 批

以下说法中，错误的是（）。

A、规划资源管理过程用于定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源

B、估算活动资源过程用于估算执行项目所需的团队资源，材料、设备和用品的类型和数量

C、获取资源过程用于获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源

D、建设团队过程用于跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题，以优化项目绩效

23、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）如果得不到满足就会影响员工的精神，导致高缺勤率，低生产率，对工作不满及情绪低落，给员工更多的空间让他负责，让他成为智囊团，参与决策，参与组织的管理会议等，是满足员工()。

A、社会交往的需求　受尊重的需求　　B、社会交往的需求　自我实现的需求

C、自我实现的需求　社会交往的需求　　D、自我实现的需求　受尊重的需求

24、2025 年 5 月第 2 批

能够影响获取资源过程的事业环境因素不包含（）。

A、项目资源的采购政策　　B、有关团队资源的以往经验

C、现有组织资源信息　　D、市场条件和地理位置

25、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于规划资源管理过程的数据表现技术的描述，正确的是（）。

①矩阵型数据表现技术可用于表示高层次角色

②资源分解结构用于规划、管理和控制项目工作，每向下一个层级代表对资源的更详细描述

③运营部门只需找到其所在的组织结构分解（OBS）位置，就能看到自己的全部项目职责

④层次型表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员

⑤如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型

A、②③⑤　　B、①③④　　C、②③④　　D、①③⑤

26、2025 年 5 月第 2 批

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

在管理团队过程的人际关系与团队技能中，项目经理对项目团队的影响力主要体现在（）。
①说服他人
②预测团队成员的行为
③了解并综合考虑各种观点
④收集相关信息，在维护相互信任的关系下，解决问题并达成一致意见
A、②③④　　B、①③④　　C、①②④　　D、①②③

27、2026 年 5 月第 1 批

在控制资源过程中，项目经理发现某实物资源使用效率远低于计划，首先应采取的措施是（ ）。
A、分析资源低效使用的根本原因　　B、调整项目进度计划
C、减少该资源的整体投入量　　D、立即更换该资源的使用人员

28、2026 年 5 月第 1 批

在估算活动资源过程中，可依据( )识别需要资源的活动，依据( )估算资源的可用性。
A、活动清单 资源日历　　B、假设日志 资源需求
C、资源分解结构 资源日历　　D、活动属性 风险登记册

29、2026 年 5 月第 1 批

建设团队过程中，可实现团队高效运行的行为包括（ ）。
①定期进行双向信息同步
②决策前公开讨论分歧
③安排轻松聚餐回避冲突与差异
④让团队成员轮流主持周例会
⑤为活跃气氛领导旁观不参与
A、①②④　　B、②③④　　C、③④⑤　　D、①②③

30、2026 年 5 月第 1 批

关于规划资源管理的描述，正确的是（ ）。
A、资源管理计划的内容包含决策标准和过程
B、资源管理计划不包含团队价值观、会议指南
C、团队章程包含角色与职责
D、团队章程不包含冲突处理过程

31、2026 年 5 月第 2 批

项目资源管理（）过程的输出中，（）记录了团队成员及其在项目中的角色和职责；（）记录了团队成员工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期等信息。
A、建设团队 资源分解结构　　资源日历

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、规划资源管理　　资源日历　　资源分解结构

C、管理团队物质　　资源分配单　　项目团队派工单

D、获取资源　　项目团队派工单　　资源日历

32、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于项目经理的权力，以下（）属于来自于组织授权的权力。

1.参照权力　2.奖励权力　　3.专家权力　　4.职位权力　　5.任免权力

A、1、4　　B、2、4　　C、3、5　　D、1、2

33、2026 年 5 月第 2 批

能够影响“规划资源管理”过程的组织过程资产包括（）。

①资源需求②人力资源政策 ③资源分解结构④物质资源管理程序⑤安保政策

A、②④⑤　　B、①②③　　C、②③④　　D、①③④

34、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

开发团队就前端框架选用方案 A 还是方案 B 争执不下，项目经理宣布“先按现有技术开发原型，两周后的技术评审会再定”。项目经理采取的冲突解决方法是（）。

A、缓和或包容　　B、撤退或回避　　C、妥协或调解　　D、强迫或命令

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于激励理论的说法，错误的是（）。

A、荣誉性的奖励，形象、地位提升，颁发奖章，作为导师培训别人等措施可以让员工满足自我实现的需求。

B、崇尚 X 理论的领导者认为，在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作，对员工应当严格监督、控制和管理；在领导行为上应当实行高度控制和集中管理。

C、激励理论认为：激发力量=目标效价×期望值

D、激励因素与员工的工作本身或工作内容有关的，能促使人们产生工作满意感的一类因素，是高层次的需要，包括成就、承认、工作本身、责任、发展机会等。

2、以下说法，错误的是（）。

A、团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。

B、对于拥有自组织团队的项目，“项目经理”（可能实际上不称为“项目经理”）这一角色主要是为团队创造环境，支持并信任团队可以完成工作。成功的自组织团队通常由通用的专业人才

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

而不是主题专家组成，他们能够不断适应变化的环境并采纳建设性反馈。
C、在大型项目中，可以制定多个层次的 RAM。矩阵型图表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。RAM 的一个例子是 RACI 矩阵
D、项目日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用及可用多久。

3、以下（）不是获取资源过程的输出。
A、物质资源分配单　　B、项目团队派工单　　C、资源日历　　D、项目日历

4、（）不是管理团队的工具和技术。
A、情商　　B、影响　　C、领导力　　D、虚拟团队

5、以下说法中错误的是（）。
A、控制资源是确保按计划为项目分配资源（实物和人力资源），以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。
B、人际关系与团队技能有时被称为“软技能”，属于个人能力。
C、备选方案分析：有助于选择最佳解决方案以纠正资源使用偏差，可将加班和增加团队资源等备选方案与延期交付或阶段性交付比较，以权衡利弊。
D、物质资源分配单是动态的，会因可用性、项目、组织、环境或其他因素而发生变更。

6、跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效是（）的作用。
A、建设团队　　B、管理团队　　C、控制资源　　D、获取资源

7、（）是按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。
A、工作分解结构（WBS）　　B、组织分解结构（OBS）
C、资源分解结构（RBS）　　D、风险分解结构（RBS）

8、（）是指使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力。
A、角色　　B、职权　　C、职责　　D、能力

9、以下（）不属于资源管理计划的内容。
A、识别资源　　B、角色与职责　　C、项目组织图　　D、团队章程

10、以下（）不是估算活动资源的输出。
A、资源日历　　B、资源需求　　C、估算依据　　D、资源分解结构

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

11、（）指事先确定项目的实物或团队资源。

A、预分派　　B、虚拟团队　　C、谈判　　D、多标准决策分析

12、（）记录了团队成员及其在项目中的角色和职责，可包括项目团队名录，还需要把人员姓名插入项目管理计划的其他部分，如项目组织图和进度计划。

A、物质资源分配单　　B、项目团队派工单　　C、资源日历　　D、项目日历

13、（）能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、如何制定决策，以及团队成员如何与他人打交道。

A、个人和团队评估　　B、认可与奖励　　C、集中办公　　D、影响力

14、以下（）不属于控制资源关注的内容。

A、监督资源支出

B、及时识别和处理资源缺乏/剩余情况

C、确保根据计划和项目需求使用并释放资源

D、获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源

15、（）测量、比较和分析计划的资源使用和实际资源使用的不同。分析成本和进度工作绩效信息有助于指出可能影响资源使用的问题。

A、备选方案分析　　B、成本效益分析　　C、绩效审查　　D、趋势分析

16、根据赫茨伯格双因素理论，属于保健因素的（41）。

A、工资薪水　　B、升职机会　　C、领导表扬　　D、先进激励

17、可采用多种形式描述项目的角色和职责。下图所示的描述角色和职责的方式是（51）。



A、层次结构图　　B、RAM 图　　C、文本格式　　D、RACI 图

18、在实施某项目时，由于地域限制，必须建立一个虚拟团队，此时制定（54）就显得更加重要。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、一个可行的沟通计划　　B、一个可行的风险计划
C、一个可行的采购计划　　D、一个可行的质量计划

19、关于责任分配矩阵（RAM）的描述，不正确的是（53）。
A、大型项目中 RAM 可分为多个层
B、针对具体的一项活动可分配多个成员，每个成员承担不同的职责
C、RAM 中用不同的字母表示不同的职责
D、RAM 中每项活动中可以有一个以上成员对任务负责

20、（51）列出了每种资源在可用工作日班次的安排。
A、组织结构图　　B、资源日历　　C、资源分解结构　　D、RACI 图

21、（52）方式可以帮助项目团队成员增进沟通，快速形成凝聚力。
A、集中办公　　B、虚拟团队　　C、在线培训　　D、共享员工

22、（51）最直观的反应了团队成员个人与其承担的工作之间的联系。
A、工作分解结构　　B、组织分解结构　　C、资源分解结构　　D、责任分配矩阵

23、（51）可以反映软件项目中各个不同组件涉及的所有成员和软硬件设备。
A、工作分解结构（WBS）　　B、资源分解结构（RBS）
C、组织分解结构（OBS）　　D、责任分解矩阵（RAM）

24、关于 X 理论和 Y 理论的描述不正确的是（51）。
A、X 理论认为对员工采取强制惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作
B、Y 理论认为应将员工目标和组织目标结合，发挥员工的智慧和能力
C、用 X 理论可以加强管理，用 Y 理论可以激发员工主动性
D、项目初始阶段建议运用 Y 理论，执行阶段建议运用 X 理论

25、( )不属于规划资源管理的工具与技术。
A、OBS　　B、RAM　　C、RBS　　D、SWOT

26、以下（）不是建设团队的输入？
A、团队章程　　B、团队派工单　　C、资源日历　　D、变更请求

27、以下（）不是控制资源的工具。
A、备选方案分析　　B、成本效益分析　　C、谈判　　D、情商

28、以下（）不是获取资源的输出。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、物质资源分配单　　B、项目团队派工单　　C、资源管理计划　　D、更新的进度计划

29、以下（）不属于获取资源的输入。
A、项目进度计划　　B、资源需求　　C、干系人登记册　　D、风险管理计划

30、以下（）不属于控制资源的输入。
A、资源管理计划　　B、项目进度计划　　C、资源分解结构　　D、成本预算

31、在规划资源管理过程中，（）有助于识别对项目所需资源有特别兴趣或影响的那些干系人，以及会影响资源使用偏好的干系人。
A、干系人登记册　　B、干系人参与计划　　C、项目团队派工单　　D、沟通管理计划

32、以下关于责任分配矩阵的说法中，错误的是（）。
A、大项目中，可能有多个RAM
B、RACI是RAM的一个例子
C、RACI中，R是咨询的意思
D、RACI可以非常直观的展示团队成员的职责。

33、在用多标准决策分析进行获取资源时，（）不是针对团队资源独特的因素。
A、经验　　B、知识　　C、态度　　D、可用性

34、在团队建设过程中，（）定义了如何以及何时为项目团队提供培训，以培养不同阶段所需的能力，并根据项目执行期间的任何差异(如有)识别需要的团队建设策略。
A、项目进度计划　　B、资源日历　　C、项目日历　　D、进度管理计划

35、在控制资源过程中，（）有助于项目成本出现差异时确定最佳的纠正措施。
A、备选方案分析　　B、成本效益分析　　C、根本原因分析　　D、趋势分析

36、项目经理应采取有条不紊的步骤来解决问题，正确的步骤是（）。
①识别问题：明确问题
②定义问题：将问题分解为可管理的小问题。
③调查：收集数据。
④分析：找出问题的根本原因。
⑤解决：从众多解决方案中选择最合适的一个。
⑥检查解决方案：确认是否已解决问题。
A、①②③④⑤⑥　　B、④⑤⑥①②③　　C、①②③④⑥⑤　　D、③④⑤①②⑥

37、资源管理中，裁剪的考虑因素不包含（）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、多元化　　B、物理位置　　C、行业特定资源　　D、控制资源

38、2017 年 11 月第 48 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

一般来说，团队发展会经历 5 个阶段。“团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，团队成员的集体荣誉感非常强”是（48）的主要特征。

A、形成阶段　　B、震荡阶段　　C、规范阶段　　D、发挥阶段

39、2017 年 11 月第 49 题

（49）是通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。

A、马斯洛需求层次理论 B、赫茨伯格双因素理论 C、X 理论和 Y 理论 D、期望理论

40、2017 年 11 月第 50 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

项目经理的授权力有多种来源，其中（50）是由于他人对你的认可和敬佩从而愿意模仿和服从你，以及希望自己成为你那样的人而产生的，这是一种人格魅力。

A、职位权力　　B、奖励权力　　C、专家权力　　D、参照权力

41、2018 年 5 月第 48 题

项目资源管理中对团队进行有效的指导和管理，以保证团队可以完成项目任务。关于项目资源管理的描述，正确的是（48）。

A、新团队成员加入到项目团队中，他们的经验水平将会降低项目风险

B、项目资源管理包括规划人力资源管理、组建项目团队、建设项目团队三个过程

C、项目经理对于所有冲突要设法解决或减少，鼓励团队成员良性竞争

D、项目团队中项目经理的管理能力和领导能力二者缺一不可

42、2018 年 5 月第 50 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某项目团队每周组织羽毛球活动，根据马斯洛需求层次理论，该活动满足了项目成员（50）的需求。

A、生理　　B、受尊重　　C、社会交往　　D、自我实现

43、2018 年 11 月第 50 题

有关建设团队的描述，不正确的是：（50）。

A、通过各种活动提高团队成员之间的信任和认同感，增进协作

B、借助管理层和相关干系人的帮助，使项目组获得有效资源支持

C、通过有效手段提高团队成员的知识和技能，实现有效交付

D、通过塑造良好的团队文化，提高个人和团队的生产率

44、2019 年 5 月第 49 题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

关于团队建设和管理的描述，不正确的是（49）。

A、在团队发展的5个阶段中，震荡阶段之后是规范阶段

B、团队发展不一定按5个阶段顺序进行，可能会跳过某个阶段

C、项目经理注重运用奖励权利和惩罚权利，尽量避免使用专家权利

D、成功的冲突管理可以提高生产力，改进工作关系

45、2019年5月第50题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在马斯洛需求层次理论中，位于金字塔结构第3层的是（50）需求。

A、安全　　B、社会交往　　C、受尊重　　D、自我实现

46、2019年11月第48题

领导者的工作主要涉及（48）。

A、确定方向，统一思想，实现目标

B、召集人员，分配任务，激励和鼓舞

C、召集人员，分配任务，实现目标

D、确定方向，统一思想，激励和鼓舞

47、2019年11月第49题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（49）能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。

A、人际关系技能　　B、项目绩效评估　　C、个人和团队评估　　D、冲突管理

48、2020年11月第48题

关于管理者和领导者的描述，不正确的是（48）。

A、领导者的主要工作是确定方向、统一思想、激励和鼓舞

B、管理者负责某件事情的管理或实现某个目标

C、领导者设定目标，管理者率众实现目标

D、项目经理的身份是管理者而非领导者

49、2020年11月第49题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方在一定程度上都满意的方案。这种冲突解决方法称为（49）。

A、妥协/调解　　B、缓和/包容　　C、撤回/回避　　D、合作/解决问题

50、2020年11月第50题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在团队发展的5个阶段中，（50）的特征是：团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。

A、形成阶段　　B、震荡阶段　　C、发挥阶段　　D、规范阶段

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

51、2021 年 5 月第 48 题

关于人力资源管理的描述，不正确的是（48）。

A、项目经理具有领导者和管理者的双重身份

B、冲突不一定是有害的，“一团和气”不一定是高效的集体

C、马斯洛需求层次理论中，受尊重是第三层的需求

D、在团队建设的五个阶段中，可以跳过某些阶段

52、2021 年 11 月第 48 题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

近期，国家多个部委发布相关文件，其中“督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险，支持其他外卖送餐员参加社会保险”。本条信息按照马斯洛的需求层次理论，属于（48）的需求。

A、生理　　B、安全　　C、社会交往　　D、受尊重

53、2021 年 11 月第 49 题

团队成员的离职率降低，是（49）过程的输出。

A、规划人力资源管理　　B、获取资源　　C、建设项目团队　　D、管理项目团队

54、2022 年 11 月第 38 题

（38）是有效领导力的关键要素。

A、尊重和信任　　B、畏惧和顺从　　C、独立和创新　　D、果断和勇敢

55、2022 年 11 月第 39 题

关于组建项目团队的描述，不正确的是（39）。

A、项目经理对团队成员的选择具有直接控制权

B、人力资源不足可能导致项目取消

C、项目经理应在项目管理计划中说明缺少所需人力资源的后果

D、在人员分派谈判中，需要项目经理具备较强的影响他人的能力

56、2022 年 11 月第 40 题

建设项目团队的目标不包括（40）。

A、提高团队成员的知识和技能

B、减少团队成员间的文化差异

C、创建富有凝聚力的团队文化

D、提高团队成员之间的认同感

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十章 项目沟通管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第43题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

有效沟通活动具备的基本属性不包含（43）。

A、沟通目的明确

B、监督并衡量沟通的效果

C、尽量了解沟通接收方，满足其需求和偏好

D、频繁沟通，与沟通方进行全方位接触

2、2023年5月第44题

关于规划沟通的描述，正确的是（44）。

A、应根据需要在整个项目期间定期开展，持续保持其成果适用性

B、确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

C、应尽量采用小组沟通方法来实现沟通管理计划所规定的沟通需求

D、沟通管理计划基于项目范围管理计划制订和更新，与其同等重要

3、2023年5月第45题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目报告的描述，不正确的是（45）。

A、项目报告发布是收集和发布项目信息的行为

B、项目报告应尽量详尽，让所有干系人全面了解项目情况

C、项目信息应发布给众多干系人

D、可以定期或临时准备项目信息并编制项目报告

4、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

视频会议属于（）。

A、互动沟通　　B、拉式沟通　　C、推式沟通　　D、非正式沟通

5、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

（）负责确保完整地接收信息，正确地理解信息，并需要告知已收到或作出适当的回应。

A、接收方　　B、发送方　　C、噪声　　D、媒介

6、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

以下（）不是规划沟通管理的输入?

A、项目章程　　B、资源管理计划　　C、需求文件　　D、干系人参与度评估矩阵

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

马军老师在给大家讲课过程中，告诉大家10大管理的论文非常重要，要大家不要去想押题，必须全面学习，大家也及时收到了消息，很多学员认可了马军老师的观点，但是他不去执行，目前是处于（ ）。

A、已转化为积极的行动　　B、已收到　　C、已理解　　D、已认可

8、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

（）是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。

A、规划沟通　　B、管理沟通　　C、监督沟通　　D、规划干系人管理

9、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

推式沟通主要是向特定接收方发送或发布信息，但不能确保信息被理解。在以下选项中，哪个最符合推式沟通的特点（）。

A、通过视频会议进行的实时讨论　　B、通过电子邮件发送的工作报告

C、通过社交媒体平台发布的信息　　D、通过电话进行的即时信息交流

10、2023年11月第4批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

（）不属于书面沟通的5C原则。

A、简洁的表述(concise)

B、可以证明的结论(certification)

C、连贯的思维逻辑(coherent)

D、清晰的目的和表述(clarity)

11、2023年11月第4批

项目经理需在项目生命周期的（）,针对项目干系人多样性的信息需求，制订有效的沟通管理计划。应该在（）期间，定期审查本过程的成果并做必要修改，以确保其持续适用。

A、前期、项目后期　　B、早期、整个项目

C、中期、项目后期　　D、整个周期、项目中期

12、2023年11月第4批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

在管理沟通过程中，某项目经理认为所谓的激烈的权力游戏、控制战术和冲突管理与自己的工作毫无关联，则他缺少人际关系交往中的（）。

A、文化意识　　B、积极倾听　　C、政策意识　　D、人际交往

13、2024年5月第1批

项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、分发、（）和处理项目信息所需的过程。

A、存储　　B、分析　　C、接收　　D、分享

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、2024 年 5 月第 1 批

“监督沟通”过程采用的措施不包括（）。

A、整理经验教训、开展团队观察

B、审查问题日志、评估变更

C、开展客户满意度调查

D、识别和确定沟通需求

15、2024 年 5 月第 1 批

在一个大型信息系统项目中，项目经理发现尽管已经建立了沟通机制，但团队间的沟通依然不顺畅，项目风险不断上升。项目经理应优先采取的措施是（）。

A、监督沟通活动执行情况，审查并优化现有沟通机制

B、引入新的沟通工具，提高信息传递效率

C、增加每周的团队会议次数，强制团队成员交流

D、对团队成员进行沟通技巧培训，提升沟通质量

16、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于管理沟通过程中工作绩效报告的描述，不正确的是（）。

A、工作绩效报告通过分析绩效测量结果得出，能够提供关于项目工作绩效的信息

B、工作绩效报告的典型示例包括状态报告、进展报告，是管理沟通过程的输出

C、工作绩效报告可以包含挣值图表、缺陷直方图、合同绩效以及风险概述信息

D、工作绩效报告可以表现为有助于制定决策和采取行动的仪表指示图

17、2024 年 5 月第 2 批

不能用于规划沟通管理过程的人际关系与团队技能是（）。

A、冲突管理　　B、政策意识　　C、文化意识　　D、沟通风格评估

18、2024 年 5 月第 2 批

适用于管理沟通过程的沟通技能不包括( )。

A、数据挖掘　　B、沟通胜任力　　C、反馈　　D、演示

19、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

有效的沟通活动需具备的属性包括（），预防理解和沟通的错误。

①沟通目的的明确

②简洁的表述，慎用控制语句

③尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好

④监督并衡量沟通的效果

A、①③④　　B、②③④　　C、①②③　　D、①②④

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

20、2025 年 5 月第 1 批

（）是管理沟通过程的输出，其将被纳入（）中进行管理。

A、项目沟通记录　项目文件　　B、风险报告　项目文件

C、工作绩效报告　项目管理计划　　D、资源管理计划　项目管理计划

21、2025 年 5 月第 2 批

监督沟通过程的输入不包含（）。

A、已开展的沟通的信息　　B、计划沟通的实际开展情况

C、关于已开展的沟通类型和数量的数据　　D、项目早期的经验教训

22、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下沟通方法中，属于推式沟通的是（）。

①新闻稿②报告③门户网站④电子邮件⑤电子在线课程⑥公众号

A、①③④⑤　　B、②③⑤⑥　　C、①②④⑥　　D、①②③④

23、2025 年 5 月第 2 批

关于沟通管理的描述，不正确的是（）。

A、沟通是指用各种可能的方式来发送或接收信息

B、管理沟通过程是确保满足项目及其干系人的信息需求

C、项目经理的绝大多数时间都用于与团队成员和其他干系人的沟通

D、项目沟通管理由制定策略和执行必要活动两部分组成

24、2026 年 5 月第 1 批

关于沟通管理的描述，不正确的是（ ）。

A、沟通管理计划应随着项目的推移定期审查和更新

B、信息传递出现误解通常发生在解码环节

C、减少项目外部甚至组织外部的干系人参与项目会议

D、监督沟通过程可能引发对沟通管理计划的变更

25、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

管理沟通的主要作用是（ ）。

A、按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程

B、促成项目团队与干系人之间的有效信息流动

C、及时向干系人提供相关信息

D、引导干系人有效参与项目

26、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某项目即将启动，项目经理小王希望能争取到开发部经理小李的大力支持。午餐时小王邀

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

请小李一起去外部就餐。就餐时，小李承诺至少派两名核心骨干加入项目。这种沟通方式属于（）。

A、层级沟通　　B、正式沟通　　C、非官方沟通　　D、外部沟通

27、2026 年 5 月第 2 批

某项目团队要求项目成员每周五 17:00 前向项目经理发送项目周报，该要求应在（）中。

A、沟通管理计划　　B、项目沟通记录　　C、资源管理计划　　D、干系人管理计划

28、2026 年 5 月第 2 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

监督沟通时，可应用（ ）数据表现技术，了解与沟通活动效果有关的信息，从沟通进行必要调整。

A、干系人立方体　　B、凸显模型　　C、权力利益方格　　D、干系人参与度评估矩阵

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下说法，错误的是（）。

A、项目沟通记录主要包括：绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及干系人需要的其他信息。

B、沟通记录是管理沟通的输出。

C、项目报告发布是收集和发布项目信息的行为，是管理沟通的工具。

D、写作风格可以达成共识、克服障碍(如小组缺乏活力),以及维持小组成员兴趣和热情。

2、以下说法，错误的是（）。

A、层级沟通是指干系人或干系人群体会根据内部职权的不同，采取向上(针对高层)、向下(针对团队成员)和横向(针对同级项目经理或其他人员)等不同的沟通方式，保证有效沟通。

B、影响沟通技术的选择的因素包括：信息需求的紧迫性、技术的可用性与可靠性等。

C、干系人参与计划是管理沟通过程的输出。

D、质量报告是管理沟通过程的输入。

3、“我以我心照明月，奈何明月照沟渠”，可以理解为沟通模型里的（）出了问题。

A、编码　　B、解码　　C、噪音　　D、媒介

4、马军老师是某项目的项目经理，小刘是项目的配置经理、小王是项目的配置项负责人、小赵是项目的配置管理员，老张是项目的架构设计师，另外，项目还有 10 名成员，现在又通过谈判增加了 1 个风险管理负责人；通过虚拟团队加了 1 名变更管理负责人，1 名软件测试员；现在，项目的沟通渠道，增加了（）条？

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、48　　B、3　　C、6　　D、84

5、以下说法，错误的是（）。
A、马军老师作为项目经理，每天给所有项目干系人通过邮件的方式汇报项目工作。
B、马军老师通过演示，取得了更好的沟通效果
C、马军老师在进行沟通的时候，会进行沟通渠道的选择
D、干系人的沟通需求属于沟通管理计划的内容。

6、以下（）不属于沟通的5C原则里的内容。
A、正确的语法和拼写　　B、简洁的表述　　C、清晰的目的和表述　　D、积极倾听

7、（）过程包含如下作用：①及时向干系人提供相关信息；②引导干系人有效参与项目；③编制书面沟通计划。
A、规划沟通管理　　B、管理沟通　　C、监督沟通　　D、干系人管理

8、（）用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。常用于不支持项目的干系人。
A、沟通风格评估　　B、政策意识　　C、文化意识　　D、干系人参与度评估矩阵

9、以下（）不属于沟通管理计划的内容。
A、干系人的沟通需求
B、接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望
C、用于传递信息的方法或技术
D、项目沟通记录

10、（）用于选择适当的语态、句子结构，以及使用适当的词汇。
A、写作风格　　B、媒介选择　　C、发送方-接收方模型　　D、演示

11、（）是经过裁剪的沟通技能的组合，有助于明确关键信息的目的、建立有效关系、实现信息共享和采取领导行为。
A、沟通胜任力　　B、反馈　　C、非口头技能　　D、演示

12、关于管理沟通的工具，不正确的是（55）。
A、沟通模型的各要素会影响沟通的效率和效果
B、管理沟通过程中要确保已创建并发布的信息能够被接受和理解
C、项目经理在项目进行中，应定期或不定期进行绩效评估
D、为了方便快捷地进行沟通，项目进行过程中需选择固定的沟通渠道

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

13、以下（）不是规划沟通管理的输入。

A、干系人参与计划　　B、干系人登记册　　C、沟通管理计划　　D、资源管理计划

14、以下（）不是管理沟通的输入。

A、变更日志　　B、问题日志　　C、质量报告　　D、项目沟通记录

15、（）不是管理沟通的工具？

A、干系人参与度评估矩阵　　B、沟通方法　　C、项目报告　　D、政策意识

16、在规划沟通管理过程中，（）显示了个体干系人当前和期望参与度之间的差距。

A、干系人参与度评估矩阵　　B、沟通风格评估　　C、政策意识　　D、文化意识

17、在管理沟通过程中，（）运用反馈循环，为互动和参与提供机会，并清除妨碍有效沟通的障碍。

A、发送方-接收方模型　　B、媒介选择　　C、写作风格　　D、引导

18、（）主要包括：绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及干系人需要的其他信息。

A、项目沟通记录　　B、项目报告　　C、沟通管理计划　　D、质量报告

19、（）是干系人或干系人群体会根据内部职权的不同，采取向上(针对高层)、向下(针对团队成员)和横向(针对同级项目经理或其他人员)等不同的沟通方式，保证有效沟通。

A、层级沟通　　B、官方沟通　　C、非官方沟通　　D、书面与口头沟通

20、以下（）不属于沟通模型中的状态？

A、已发送　　B、已撤回　　C、已收到　　D、已认可

21、在进行沟通管理中，（）不是裁剪考虑的因素？

A、干系人　　B、物理地点　　C、语言　　D、资源管理

22、沟通模型中，（）是把信息还原成有意义的思想或想法。

A、编码　　B、解码　　C、媒介　　D、噪声

23、2017年11月第41题

沟通的基本模型用于显示信息如何在双方之间被发送和被接收，日常与人交往发生的误解，通常在（41）环节发生。

A、编码　　B、解码　　C、媒介　　D、信息

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

24、2017年11月第42题

你正在组织项目沟通协调会，参加会议的人数为12人，沟通渠道有（42）条。

A、66　　B、72　　C、96　　D、132

25、2018年5月第42题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

在项目沟通过程中，会使用各种沟通方法。电子邮件沟通属于（42）。

A、实时沟通　　B、推式沟通　　C、拉式沟通　　D、情境式沟通

26、2018年11月第43题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

项目经理通过微信群告知项目组成员每天早上9：00在会议室召开5分钟站立会议，讨论项目进展和当日工作，并要求每个组员对上述内容进行确认回复，十分钟后他收到了所有回复信息。其中，微信群属沟通模型中的（43）关键要素。

A、编码　　B、解码　　C、噪声　　D、媒介

27、2019年5月第42题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

对于信息量很大或受众很多的情况，建议采用（42）沟通方式。

A、拉式　　B、推式　　C、互动　　D、面对面

28、2019年11月第42题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

备忘录、报告、日志、新闻稿等沟通方式属于（42）。

A、推式沟通　　B、互动沟通　　C、拉式沟通　　D、非正式沟通

29、2020年11月第41题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

A公司任命黄总为新项目的项目经理，黄总任命小张为开发经理，并在公司内部调集10人组成项目团队，则该项目团队内的沟通渠道共（41）条。

A、45　　B、55　　C、66　　D、78

30、2020年11月第42题

（42）不属于沟通管理过程的工具与技术。

A、标杆对照　　B、信息管理系统　　C、沟通方法　　D、项目报告

31、2021年5月第41题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

（41）属于拉式沟通方法。

A、电子邮件　　B、经验教训数据库　　C、视频会议　　D、备忘录

32、2021年5月第42题

关于沟通管理过程的描述，正确的是（42）。

A、控制沟通是为了促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、项目管理中出现的任何问题都可以通过沟通来解决

C、管理沟通是识别和记录与干系人有效沟通的方式

D、项目经理大多数的时间都用于与团队成员和其他干系人沟通

33、2021 年 11 月第 41 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

工程师小王作为项目干系人之一，主动去访问项目相关的知识库，这种沟通属于（41）。

A、互动沟通　　B、拉式沟通　　C、推式沟通　　D、集中式沟通

34、2021 年 11 月第 42 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（42）的目的是随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化。

A、规划沟通管理　　B、管理沟通　　C、控制沟通　　D、改进沟通

35、2022 年 5 月第 42 题

某项目沟通渠道为 66，则该项目干系人为（42）人。

A、9　　B、10　　C、11　　D、12

36、2022 年 5 月第 43 题

在项目沟通管理过程中，（43）是“管理沟通”过程的作用。

A、确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化

B、促进项目干系人之间实现有效率且有效果的沟通

C、识别与记录与干系人最有效率且最有效果的沟通方式

D、针对问题和关键绩效指标的沟通，可引发修正措施

37、2022 年 11 月第 43 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目经理在（43）过程中，发现参加会议的主要领导无法出席，项目组原定的周一的项目例会，改为周二召开。

A、实施整体变更控制　　B、规划沟通管理　　C、管理沟通　　D、控制沟通

马军老师 购课后请联系 91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十一章 项目风险管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 46 题

关于识别风险的描述，不正确的是（46）。

A、可使用类似项目信息的核查单替代所需的风险识别

B、在风险管理计划中应规定识别风险的迭代频率和迭代参与程度

C、从组织外部采购商品和服务可能引发新的项目风险

D、使用 SWOT 分析法可以拓宽项目识别风险的范围

2、2023 年 5 月第 47 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于风险分析的技术，不正确的是（47）。

A、概率影响矩阵适用于两个以上的参数对风险进行分类的情况

B、蒙特卡洛分析，是使用模型模拟大量单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响

C、敏感性分析，是将项目结果变化与定量风险分析模型中的要素变化之间建立联系的方法

D、影响图是不确定条件下进行决策的图形辅助工具

3、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方属于（）策略。

A、减轻　　B、规避　　C、上报　　D、转移

4、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不是定量风险分析的工具和技术。

A、气泡图　　B、期望货币值　　C、蒙特卡洛　　D、敏感性分析

5、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于气泡图的说法中，错误的是（）。

A、气泡图能显示三维数据

B、在气泡图中，把每个风险都绘制成一个气泡，并用 X 轴值、Y 轴值和气泡大小来表示风险的 3 个参数。

C、气泡图中，可以用 X 轴代表可监测性，Y 轴代表邻近性，影响值则以气泡大小表示。

D、气泡图是识别风险的工具

6、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

敏感性分析的结果通常用（）来表示。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

马老师 购课店铺91xmgl.taobao.com

A、气泡图　　B、龙卷风图　　C、SWOT　　D、概率影响矩阵

7、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

以下关于风险管理的过程排序，正确的是（）。

①规划风险管理　②识别风险　③实施定性风险分析　④实施定量风险分析

⑤规划风险应对　⑥实施风险应对　⑦监督风险

A、①②③④⑤⑥⑦　　B、①②⑤⑥⑦③④

C、⑥⑦③④①②⑤　　D、③④①②⑤⑥⑦

8、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在定量风险分析中，使用模型来（）单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。（）通常采用蒙特卡洛分析。

A、模拟　　B、敏感性分析　　C、PERT　　D、EMV

9、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

风险报告第 1 次在（）输出。

A、识别风险　　B、规划风险管理　　C、定性风险分析　　D、定量风险分析

10、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

（）过程是对风险进行优先级排序。

A、实施定性风险分析　　B、实施定量风险分析　　C、风险识别　　D、规划风险应对

11、2023 年 11 月第 4 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

整体项目风险应对策略不包括（）。

A、开拓　　B、接受　　C、上报　　D、转移或分享

12、2024 年 5 月第 1 批

在项目执行过程中，项目经理发现项目进展顺利，但某些潜在风险因素仍然存在。为了确保项目能够顺利完成，项目经理应采取（）措施，有效地监督这些风险。

A、定期进行风险审查会议，并更新风险登记册

B、减少项目开支，以降低潜在风险的影响

C、分析风险因素对项目的潜在影响，并调整项目计划

D、增加项目预算，以应对可能出现的风险

13、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在一个大型项目实施过程中，项目经理发现项目风险已经发生，并且对项目进度和成本产生了显著影响。为了准确评估风险对项目目标的影响程度，项目经理应该采取的定量风险分析技术是（）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、风险分类　　B、风险数据质量评估　　C、风险概率和影响评估　　D、敏感性分析

14、2024 年 5 月第 1 批

关于规划风险管理过程的描述，不正确的是（）。

A、规划风险管理在项目实施阶段开始，并在项目执行期间持续进行

B、规划风险管理是定义如何实施项目风险管理活动的过程

C、规划风险管理的主要作用是确保风险管理的水平、方法和可见度与项目风险程度相匹配

D、干系人分析法可用于规划风险管理过程

15、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于规划风险应对过程的概述，不正确的是（）。

A、如果选定的策略并不完全有效，需要制定应急计划，识别采取风险应对措施后仍然存在的未被完全消除的次生风险

B、风险应对方案可以用结构化的决策技术来选择最适当的应对策略，为每个风险选择最可能有效的策略或策略组合

C、对于大型或复杂的项目，可能需要以数学优化模型或实际方案分析为基础，进行备选风险应对策略经济分析

D、风险应对方案应在当前项目背景下现实可行，获得全体干系人同意，并由一名责任人具体负责

16、2024 年 5 月第 2 批

适用于识别风险过程的数据分析技术是（）。

A、核查单　　B、头脑风暴　　C、访谈　　D、SWOT 技术

17、2024 年 5 月第 2 批

关于项目风险管理过程的描述，不正确的是( )。

A、实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程，需要在整个项目期间开展

B、在项目实际进展中，项目风险管理过程中的各个过程会相互交叠，相互作用

C、敏捷或适应型方法管理的项目，在每个迭代期间应该识别、分析和管理风险

D、影响风险规划管理过程的组织过程资产是组织或关键干系人设定的整体风险的临界值

18、2025 年 5 月第 1 批

项目风险管理的首要目标是（）。

A、减轻威胁或强化机会　　B、关注高概率风险

C、将所有风险转移给第三方　　D、消除所有项目风险

19、2025 年 5 月第 1 批

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

在定量风险分析中，“预期货币价值（EMV）的计算公式是（）。

A、路径净值/风险概率　　B、Σ（风险概率 X 收益）

C、风险概率 X 路径净值　　D、Σ（风险概率×路径净值）

20、2025 年 5 月第 1 批

（）不是规划风险管理过程的输入。

A、风险登记册　　B、干系人登记册　　C、项目管理计划　　D、组织的风险政策

21、2025 年 5 月第 1 批

某信息系统开发项目中，技术负责人被指定为“核心算法性能不足”风险的责任人，需优化算法。但该负责人忙于其他任务，迟迟未行动。项目经理适宜采取的措施是（），以推动其实施风险应对。

A、与技术负责人协商调整其绩效考核指标，将算法优化纳入 KPI

B、暂停负责人其他任务，强制其优先处理风险

C、要求团队其他成员接手算法优化工作

D、直接将该风险升级汇报给发起人，从发起人处申请风险应对方案

22、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）可用于评估风险管理过程的有效性。

A、储备分析　　B、技术绩效分析　　C、风险报告　　D、风险审计

23、2025 年 5 月第 2 批

适用于识别风险过程的数据收集技术主要包括（）。

①头脑风暴　②访谈　③核查单　④专家判断　⑤文件分析

A、③④⑤　　B、①③④　　C、②④⑤　　D、①②③

24、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

用较简单的流程，进行更多次测试选用更可靠的卖方属于（）风险应对策略。延长进度计划或缩小范围属于（）风险应对策略。

A、减轻 减轻　　B、减轻 规避　　C、转移 减轻　　D、接受 规避

25、2025 年 5 月第 2 批

关于项目风险管理过程的描述，不正确的是（）。

A、规划风险应对过程会定义如何实施项目风险管理活动

B、实施定性风险分析过程会对风险进行优先级排序

C、识别风险过程会识别单个项目风险以及整体项目风险的来源

D、实施风险应对过程会执行商定的风险应对计划

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

26、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

风险管理计划内容不包括（ ）。

A、干系人风险偏好　　B、已识别的项目风险清单

C、风险责任人职责　　D、风险概率和影响

27、2026 年 5 月第 1 批

实施定性风险分析和定量风险分析，正确的是（ ）。

A、对风险进行优先级排序时要综合考虑风险的紧迫性、潜伏期等特征

B、定量风险分析主要用于确定风险优先级排序

C、定量风险分析是每个项目都必须执行的过程

D、定性风险分析必须建立在定量风险分析的基础上

28、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某项目计划采用人脸识别算法实现登录功能，评估发现该算法技术不成熟，存在较大技术失效风险。项目经理改用用户名口令＋短信验证码的登录方案，项目经理采用的风险应对策略是（ ）。

A、接受　　B、减轻　　C、转移　　D、规避

29、2026 年 5 月第 2 批

每个软件项目都有其独特性，因此必要时，可以对项目风险管理过程进行裁剪。裁剪结果将被记录在（）中，裁剪时应考虑的主要因素包括项目规模、项目复杂性、项目重要性和（）。

A、风险管理计划 开发方法　　B、风险登记表 开发方法

C、风险登记表 风险可预测性　　D、风险管理计划 风险可预测性

30、2026 年 5 月第 2 批

在（）的过程中，项目团队应用（）方法，从“项目可能延误”这一问题出发，不断探讨哪些威胁可能导致该问题，直到挖出技术评估不足、能力建设缺失等深层原因。

A、规划风险管理 假设条件和制约因素分析　　B、监督风险　假设条件和制约因素分析

C、实施风险应对 根本原因分析　　D、识别风险　根本原因分析

31、2026 年 5 月第 2 批

“监督风险”过程中，采用项目执行期间生成的绩效信息，是为了确定（）。

①是否按计划执行商定的风险应对措施

②是否出现新的单个项目风险

③成本或进度应急储备是否需要修改

④风险应对策略是否需要制定

⑤整体项目风险级别是否已改变

A、345　　B、123　　C、234　　D、235

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

32、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某公司承接智慧城市项目，资金不足且缺乏 AI 技术，于是与政府平台、AI 企业、运营商成立合资公司，合作完成项目。该项目采取的风险应对策略是（ ）。

A、减轻　　B、分享　　C、规避　　D、开拓

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于实施风险应对的说法，错误的是（）。

A、实施风险应对是执行商定的风险应对计划的过程。本过程的主要作用：①确保按计划执行商定的风险应对措施；②管理整体项目风险入口、最小化单个项目威胁，以及最大化单个项目机会。

B、实施风险应对可能导致项目团队派工单的更新

C、风险登记册、风险报告是实施风险应对的输入

D、SWOT 是实施风险应对的工具

2、马军老师正在进行整体项目风险应对策略的制定，针对“整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值”的情况，可以选择（）策略。

A、规避　　B、开拓　　C、转移或分享　　D、减轻或提高

3、以下风险参数中，（）指标是风险在多长时间后会影响一项或多项项目目标。

A、紧迫性　　B、邻近性　　C、连通性　　D、密切度

4、以下关于风险管理的内容，错误的是（）。

A、通常借助风险分解结构（RBS）来构建风险类别。风险分解结构是潜在风险来源的层级展现。

B、应在风险管理计划中记录项目关键干系人的风险偏好。他们的风险偏好会影响规划风险管理过程的细节。

C、核查单简单易用，而且可能穷尽所有风险。

D、提示清单是关于可能引发项目风险来源的风险类别的预设清单。在采用风险识别技术时，提示清单可作为框架用于协助项目团队形成想法。

5、以下说法，不正确的是（）。

A、并非所有项目都需要实施定量风险分析。项目风险管理计划会规定是否需要使用定量风险分析。

B、敏感性分析：有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、风险登记册提供关于整体项目风险的信息，以及关于已识别的单个项目风险的概述信息。
D、风险概率和影响评估、风险分类、层级图、风险数据质量评估都是定性风险分析的工具。

6、以下，（）不是风险的特性。
A、风险事件的随机性　　B、风险的相对性　　C、风险的可变性　　D、风险的必然性

7、为处理整体项目风险以及应对单个项目风险而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动，是（）过程的作用。
A、规划风险应对　　B、实施风险应对　　C、实施定性风险分析　　D、实施定量风险分析

8、以下（）不属于风险管理计划的内容。
A、风险管理策略　　B、干系人风险偏好　　C、风险概率和影响　　D、风险登记册

9、在采用风险识别技术时，（）可作为框架用于协助项目团队形成想法。可以用风险分解结构底层的风险类别作为（），来识别单个项目风险。
A、提示清单　　B、文件分析　　C、核查单　　D、假设条件和制约因素分析

10、以下（）不属于完成风险识别后，风险登记册的内容。
A、已识别风险的清单　　B、潜在风险责任人
C、潜在风险应对措施清单　　D、整体项目风险的来源

11、如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用（）策略。
A、上报　　B、规避　　C、转移　　D、减轻

12、（）策略将特定机会的出现概率提高到 100 确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。
A、开拓　　B、提高　　C、分享　　D、接受

13、（）是把应对策略将导致的风险影响级别变更除以策略的实施成本所得到的比率，就代表了应对策略的成本有效性。比率越高，有效性就越高。
A、备选方案分析　　B、成本收益分析　　C、多标准决策分析　　D、决策树分析

14、在进行监督风险时，（）是把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。
A、技术绩效分析　　B、储备分析　　C、风险审计　　D、风险审查会

15、公司任命小李作为项目 A 的项目经理，由于小李不能计划所有不测事件，它设立了一个应急储备，包括处理已知或未知风险的事件，资金或资源。这属于（64）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、风险回避，用应急储备避免风险的发生
B、风险接受，用应急储备接受风险的发生
C、风险转移，因为应急储备使项目成本提高
D、不当风险规划，因为应识别并虑及所有风险

16、风险相关的项目文件随着定量风险分析产生的信息而更新。（68）不是在定量风险分析过程中产生的。
A、风险评级和分值　　B、量化风险优先级清单
C、项目的概率分析　　D、实现成本和时间目标的概率

17、（67）属于定量风险分析的工具和技术。
A、概率和影响矩阵　　B、风险数据质量评估
C、风险概率和影响评估　　D、敏感性分析

18、某系统集成项目在进展到一半的时候识别到一个已知风险，项目经理启用应急储备来应对该风险，则（67）。
A、进度基准改变，成本基准不变　　B、进度基准不变，成本基准改变
C、进度和成本基准都不改变　　D、进度和成本基准都应改变

19、（66）是评估风险数据对风险管理有用程度的一种技术，用来考察人们对风险的理解程度和风险数据的准确性、质量、可靠性、完整性。
A、定量风险分析　　B、风险概率和影响评估
C、风险紧迫性评估　　D、风险数据质量评估

20、风险应对措施必须与（67）相匹配。
A、风险类型　　B、风险收益　　C、风险的重要性　　D、风险预算

21、在某个采用敏捷开发模式的软件开发项目中，针对可能无法按时完成任务的风险，根据任务的难易程度对任务所需人力和时间做出如下分析，则该活动属于风险管理过程中的（66）。

任务编号	最短完成时间	最短时间所需人力	最长完成时间	最长时间所需人力	备注
1	10天	3人	15天	3人	
2	5天	2人	10天	1人	
3	8天	1人	10天	1人	
4	4天	1人	6天	1人	
5	10天	2人	20周	3人	此功能作为缓冲项，可后续迭代完成

马军老师，购课加微91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、定量风险评估　　B、定性风险评估　　C、识别风险　　D、规划风险应对

22、以下（）不是实施风险应对的输入。
A、风险管理计划　　B、风险报告　　C、风险登记册　　D、变更请求

23、以下（）不是识别风险的工具？
A、假设条件和制约因素分析　　B、SWOT分析　　C、文件分析　　D、干系人分析

24、以下（）不是定性风险分析的工具?
A、层级图　　B、气泡图　　C、概率影响矩阵图　　D、影响图

25、（）不是监督风险的输入？
A、绩效报告　　B、绩效数据　　C、绩效信息　　D、问题日志

26、在风险识别过程中，（）规定了哪些个人或小组可能参与项目的风险识别工作，还会详细说明哪些个人适合扮演风险责任人角色。
A、干系人登记册　　B、干系人参与计划　　C、项目团队派工单　　D、资源管理计划

27、开展（）来探索假设条件和制约因素的有效性，确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁；通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。
A、假设条件和制约因素分析　　B、根本原因分析　　C、趋势分析　　D、蒙特卡洛

28、()：风险与其他单个项目风险存在关联的程度大小。如果风险与多个其他风险存在关联，（）就高。
A、连通性　　B、邻近性　　C、潜伏期　　D、战略影响力

29、以下关于定量风险分析的说法中，错误的是（）。
A、并非所有项目都需要实施定量风险分析。
B、能否开展稳健的定量分析取决于是否有单个项目风险和其他不确定性来源的高质量数据，以及与范围、进度和成本相关的扎实的项目基线。
C、定量分析适用于大型或复杂的项目，具有战略重要性的项目，合同要求进行定量分析的项目和主要干系人要求进行定量分析的项目。
D、风险数据质量评估是定量风险分析的工具。

30、在风险管理的裁剪考虑因素中，（）是指由高水平创新、新技术采用、界面或外部依赖关系导致的项目复杂性提高，是否要求采用更稳健的风险管理方法?或者项目是否简单到只需用简化的风险管理过程?

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、项目规模　　B、项目复杂性　　C、项目重要性　　D、开发方法

31、2017 年 11 月第 45 题

风险可以从不同的角度，根据不同的标准来进行分类，百年不遇的暴雨属于（45）。

A、不可预测风险　　B、可预测风险　　C、已知风险　　D、技术风险

32、2017 年 11 月第 46 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

在风险识别时，可以用到多种工具和技术，其中，（46）指的是从项目的优势、机会和威胁出发，对项目进行考察，从而更全面地考虑风险。

A、头脑风暴法　　B、因果图　　C、SWOT 分析法　　D、专家判断法

33、2017 年 11 月第 47 题

某项目有 40%的概率获利 10 万元，30%的概率会亏损 8 万元，30%的概率既不获利也不亏损，该项目的预期货币价值分析（EMV）是（47）。

A、0 元　　B、1.6 万元　　C、2 万元　　D、6.4 万元

34、2018 年 5 月第 45 题

人们对风险事件都有一定的承受能力，当（45）时，人们愿意承担的风险越大。

A、项目活动投入的越多　　B、项目的收益越大

C、个人、组织拥有的资源越少　　D、组织中高级别管理人员相对较少

35、2018 年 11 月第 46 题

关于项目风险管理的描述，不正确的是：（46）。

A、纯粹风险和人为风险在一定条件下可以相互转化

B、项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会

C、风险大多数随着项目的进展而不断变化，不确定性会逐渐减小

D、风险后果包括后果发生的频率、收益或损失大小

36、2018 年 11 月第 48 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

A 公司刚刚中标一个大型系统集成项目，其中一台设备计划从国外采购，近期汇率波动明显，A 公司准备与客户协商使用国产设备进行替代，这是采用了（48）风险应对策略。

A、回避　　B、转移　　C、减轻　　D、接受

37、2019 年 5 月第 45 题

关于项目风险的描述，不正确的是（45）。

A、已知风险与未知风险都可以进行管理

B、风险既有可能对项目产生正面的影响，也有可能产生负面的影响

C、同样的风险对于不同的主体有不同的影响

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、收益越大，人们愿意承担的风险也就越大

38、2019年5月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某信息系统建设项目中，为防范系统宕机风险，项目经理建议采购服务器时均配置冗余电源和冗余风扇。项目经理采用的风险应对策略为（47）。

A、减轻　　B、转移　　C、规避　　D、消除

39、2019年11月第45题

关于风险的描述，正确的是（45）。

A、不能带来机会、无获利可能的风险叫投机风险

B、根据经验可以预见其发生，但不可预见其后果的风险叫做已知风险

C、地震、百年不遇的暴雨等属于不可预测的风险

D、风险是零和游戏，有人受损就有人获利

40、2019年11月第46题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于风险识别的描述，不正确的是（46）。

A、应鼓励所有项目参与人员识别风险

B、风险登记册的内容可能包括潜在应对措施清单

C、定量风险分析不是必须的

D、识别风险是一次性工作

41、2019年11月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（47）检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。

A、风险再评估　　B、风险审计　　C、偏差和趋势分析　　D、技术绩效测量

42、2020年11月第45题

关于项目风险的描述，不正确的是（45）。

A、风险具有随机性、相对性、可变性

B、项目收益越大，人们愿意承担的风险越大

C、项目投入越多，人们愿意承担的风险越大

D、风险按照影响范围可分为局部风险和总体风险

43、2020年11月第47题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（47）不属于定性风险分析的技术。

A、风险数据质量评估　B、概率和影响矩阵　C、风险紧迫性评估　D、预期货币价值分析

44、2020年11月第66题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

某公司主营产品有甲、乙、丙、丁四种。按照历史数据预测，下半年的市场需求总量可以有 10 万件、15 万件和 20 万件三种情况，对应的概率分别为 50%，30%，20%，不同情况下各产品带来的市场收益（单位：万元）如表所示，为了追求利润最大化，该公司应该生产（66）。

产品	需求量为 10 万件	需求量为 15 万件	需求量为 20 万件
甲	-25	35	70
乙	-20	30	65
丙	-10	25	55
丁	10	15	40

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、丁

45、2021 年 5 月第 45 题

关于风险的描述，不正确的是（45）。

A、具有不确定性的事件不一定是风险

B、项目风险既包括对项目目标的威胁，也包括促进项目目标的机会

C、风险是零和游戏，有风险受益者，同时也有风险受害者

D、在项目中应规避投机风险向纯粹风险的转化

46、2021 年 5 月第 47 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在项目定量风险分析技术中，（47）需用一个模型，将详细规定的各项不确定性换算为它们对项目目标所产生的潜在影响。

A、蒙特卡洛技术　　B、概率影响分析　　C、帕累托分析　　D、SWOT 分析法

47、2022 年 5 月第 46 题

关于风险的描述不正确的是（46）。

A、具有不确定性的事件或活动也不一定是风险

B、风险包括对目标的威胁，也包括促进目标的机会

C、项目投入越大，可接受的风险越小

D、因火灾造成停工引发的成本属于直接风险

48、2022 年 5 月第 48 题

关于风险的描述，正确的是（48）。

A、风险审计可以在日常项目审查中进行，也可以单独召开风险审计会议

B、蒙特卡洛分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响

C、制定有效的风险应对策略需要风险量化分析

D、建立应急储备，安排资金和资源应对风险是常见的问题风险策略

49、2022 年 11 月第 46 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

关于风险的描述，不正确的（46）。

A、已知风险为其后果可以预见的风险

B、随机性、相对性、可变性都是风险的属性

C、按可预测性划分为可预测风险和不可预测风险两种

D、项目管理人员必须避免投机风险转化为纯粹风险

50、2022 年 11 月第 47 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

可用于风险识别的工具与技术是（47）。

A、决策树　　B、SWOT　　C、概率影响矩阵　　D、波士顿矩阵

51、2022 年 11 月第 48 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

应对可能对项目目标存在消极影响和威胁的风险，不宜采用的策略是（48）。

A、提高　　B、回避　　C、转移　　D、接受

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十二章 项目采购管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第49题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某公司准备采购一批设备，附加技术服务。在供方选择时应优先选择（49）。

①相同预算技术得分最高的 ②设备成本和服务成本最低的 ③能够在预算范围内完成相关工作的 ④服务人员资质最强的

A、①② B、③④ C、①③ D、②④

2、2023年5月第50题

关于实施采购的描述，正确的是（50）。

A、复杂且高风险的采购在授予卖方合同前要由组织授权管理者审批

B、采购管理计划中应包含清晰且详细的采购目标、需求及成果

C、实施采购过程主要作用是确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求

D、实施采购过程的输出包括卖方履行的工作绩效达成情况

3、2023年5月第51题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

订立项目分包合同需满足以（51）条件。

①经过买方认可

②分包方不能与买方有隶属或连带关系

③分包部分必须是项目非主体工作

④分包方必须满足相应的资质条件

⑤不能转包整个项目

⑥分包方再次分包需经买方同意

A、①②③⑥ B、①②④⑥ C、②③⑤⑥ D、①③④⑤

4、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

关闭合同属于（）的内容。

A、规划采购管理 B、实施采购 C、控制采购 D、沟通管理

5、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

确定合格供方属于（）。

A、规划采购 B、实施采购 C、控制采购 D、识别干系人

6、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

一般的采购步骤为：①准备采购工作说明书(SOW)或工作大纲(TOR);②准备高层级的成本估算，制定预算；③发布招标广告；④确定合格卖方的名单；⑤准备并发布招标文件；⑥由卖

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

方准备并提交建议书；⑦对建议书开展技术（包括质量）评估；⑧对建议书开展成本评估；⑨准备最终的综合评估报告（包括质量及成本）,选出中标建议书；⑩结束谈判，买方和卖方签署合同。其正确的是排序是（）。

A、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩　　B、⑤⑥⑦⑧⑨⑩①②③④

C、①②③④⑦⑧⑨⑩⑤⑥　　D、⑧⑨⑩①⑤⑥⑦②③④

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

项目（）对规划采购管理过程中的采购策略制定有重要影响。在制订采购管理计划时所做出的决定也会影响项目（）。

A、质量计划　　B、进度计划　　C、风险计划　　D、范围计划

8、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

如果工作性质清楚，但范围不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同，则使用（）。

A、工料合同　　B、总价合同　　C、总承包合同　　D、单价合同

9、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

采购设备的验收标准是在（）文件里。

A、采购工作说明书　　B、采购管理计划　　C、招标文件　　D、投标文件

10、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是解决所有索赔和争议的首选方法。

A、申诉　　B、谈判　　C、起诉　　D、替代争议解决方法(ADR)

11、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于实施采购的工具与技术。

A、自制外购分析　　B、数据分析　　C、人际关系与团队技能　　D、广告

12、2024年5月第1批

关于采购合同的描述，不正确的是（）。

A、项目经理应确保采购合同的变更管理遵循组织的变更管理流程，以确保合同变更的合规性和有效性

B、项目经理无需对采购合同进行定期审查，因为合同条款一旦确定就不会发生变化

C、采购合同应明确规定项目的验收标准和方法，以确保交付成果符合项目要求

D、合同中的违约责任条款是为了在发生违约情况时，双方能够依据合同条款进行纠纷解决

13、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

在确定项目合同类型时，如果工作性质清楚，但工作量不是很清楚，而且工作不复杂，又需要快速签订合同。这种情况下建议使用（）。

A、成本加激励费用合同　　B、总价合同　　C、成本补偿合同　　D、工料合同

14、2024 年 5 月第 1 批

在控制采购过程中，项目经理发现某些供应商提供的产品存在质量问题，并且这些问题可能导致项目延期。项目经理应（）。

A、立即终止与存在问题的供应商合作，并寻找新的供应商

B、自行决定采取补救措施，如增加项目预算或延长项目工期，以弥补供应商的问题

C、首先与供应商沟通，了解问题的原因，并尝试解决或减轻其对项目的影响

D、通知高层领导，并等待高层领导的决策后再采取行动

15、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目合同管理概述，不正确的（）。

A、经过买方认可，项目主体工作在签订分包合同时可以使用总价合同

B、按照项目范围划分，合同分为项目总承包合同、单项承包合同、项目分包合同

C、项目合同采用总价合同时，买方必须准确定义要购买的产品或服务

D、合同双方如签订工料合同，则买方来承担中等程度的成本风险，卖方承担单价风险

16、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

采购文档是采购时用于达成法律协议的各种书面文书，不包括（）。

A、供方选择标准　　B、资金筹措方案　　C、采购工作说明书　　D、招标文件

17、2024 年 5 月第 2 批

关于项目采购管理的描述，不正确的是（）。

A、对于项目非标准化的采购需求，应使用最低成本法

B、选择供方，在选择供方时应有适当理由才使用唯一来源法，且应将其视为特殊情况

C、项目进度计划会影响规划采购管理过程中，采购策略的制定

D、项目章程是规划采购管理过程的输入文件

18、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

签订成本加激励费用合同时，若目标成本为 90 万元，目标费用 2 万元，相对目标成本节余或超支部分的分摊按比例为 60/40（即如结余，买方分享 60%，卖方分享 40%；如超支，买方承担 60%，卖方承担 40%)。项目执行后实际成本为 100 万元，则买方最终需支付的金额是（）。

A、108 万元　　B、96 万元　　C、98 万元　　D、102 万元

19、2025 年 5 月第 1 批

项目采购管理中，“自制或外购决策”属于（）过程的输出，“选定的卖方”属于（）过程

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

的输出。

A、实施采购　规划采购管理　　B、规划采购管理　实施采购

C、实施采购　控制采购　　D、规划采购管理　规划采购管理

20、2025 年 5 月第 1 批

在实施采购过程中，用于获取卖方正式应答的文件是（），包括信息邀请书、报价邀请书。

A、采购工作说明书　　B、合同　　C、采购管理计划　　D、招标文件

21、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）合同适用于卖方履约期将跨越几年时间，或将以不同货币支付价款；基于卖方的实际成本，按照 80：20 的比例分担，（分享）超过（低于）目标成本的部分应选用（）合同。

A、总价加经济价格调整　　成本加激励费用

B、总价加激励费用　　成本加奖励费用

C、总价加激励费用　　成本加激励费用

D、总价加经济价格调整　　成本加奖励费用

22、2025 年 5 月第 2 批

关于采购管理的描述，正确的是（）。

①控制采购的活动包括关闭合同

②控制采购的质量是采购系统可靠性的关键决定因素

③如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，替代争议解决方法（ADR）是解决所有索赔和争议的首选方法

④绩效审查可用于编制关于成本绩效的完工估算，以确定绩效在改善还是恶化

⑤市场条件是能够影响控制采购过程的事业环境因素

A、①④⑤　　B、①②⑤　　C、②④⑤　　D、②③④

23、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

采用（ ）买方的成本风险最低，采用（ ）买方的成本风险最大。

A、成本补偿合同 工料合同　　B、工料合同 成本补偿合同

C、固定总价合同 成本补偿合同　　D、成本补偿合同 固定总价合同

24、2026 年 5 月第 1 批

在项目采购管理中，“实施采购”过程的主要作用是（）。

A、明确采购方法，识别潜在卖方，制定采购管理计划与工作说明书

B、监督合同绩效，实施变更并关闭合同

C、确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求

D、选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

25、2026 年 5 月第 1 批

关于项目采购的描述，不正确的是（）。

A、在决定大批量采购之前，可以采用试用采购，同时适用多个候选卖方，采购少量的可交付成果和工作产品

B、采购管理过程涉及完整的规划采购、实施采购和控制采购全过程，不能裁剪

C、项目中可以适用主要服务协议(MSA)来管理项目整体协作关系，而把变化大的工作写入附录或补充文件

D、在复杂项目中，可能需要同时管理多个合同，不同合同的生命周期可在项目生命周期的任何阶段开始与结束

26、2026 年 5 月第 2 批

控制采购过程的工作内容不包括( )。

A、管理各个供应商之间的沟通　　B、关闭采购合同

C、明确采购工作说明书内容　　D、向供应商支付首笔款项

27、2026 年 5 月第 2 批

关于规划采购管理过程的描述，不正确的是( )。

A、完成制订采购管理计划后应尽早确定与采购有关的角色和职责

B、在制订采购管理计划时所做出的决定也会影响项目进度计划

C、规划采购管理过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展

D、规划采购管理过程确定是否从项目外部获取货物和服务

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于索赔的说法，错误的是（）。

A、合同索赔是指在项目合同的履行过程中，由于当事人一方未能履行合同所规定的义务而导致另一方遭受损失时，受损失方向过失方提出赔偿的权利要求。

B、按索赔的目的分类，可分为工期索赔和费用索赔。

C、项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的有理性、索赔依据的有效性和索赔计算的正确性。

D、当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 30 天以内，向监理工程师正式提出索赔意向通知。

2、以下关于合同的说法中，错误的是（）。

A、合同管理包括：合同的签订管理、合同的履行管理、合同的变更管理、合同的档案管理和

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

合同违约索赔管理。
B、如果工作范围尚不清楚，则使用成本补偿合同
C、成本加激励费用合同为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），买方再凭自己的主观感觉给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定奖励费用，并且卖方通常无权申诉。
D、总价加经济价格调整合同：如果卖方履约要跨越相当长的周期（数年），就应该使用总价加经济价格调整合同。如果买方和卖方之间要维持多种长期关系，也可以采用这种合同类型。它是一种特殊的总价合同，允许根据条件变化（例如，通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低等），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。

3、以下关于采购的说法中，错误的是（）。
A、审计是对采购过程的结构化审查。应该在采购合同中明确规定与审计有关的权利和义务。买卖双方的项目经理都应该关注审计结果，以便对项目进行必要的调整。
B、买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。关于正式关闭采购的要求，通常已在合同条款和条件中规定，包括在采购管理计划中。
C、采购档案是控制采购的输入。
D、招标文件可以是信息邀请书、报价邀请书、建议邀请书，或其他适当的采购文件。

4、以下关于规划采购的说法中，正确的是（）。
A、供方选择分析是规划采购的工具。
B、自制/外购决策是规划采购的工具。
C、规划采购时，不需要考虑合同类型。
D、采购工作说明书是规划采购的输入。

5、以下说法中，正确的是（）。
A、控制采购是卖方的工作，买方不需要。
B、因为地震导致的工期和费用损失，都可以索赔
C、在解决合同争议的方法中，其优先顺序为谈判（协商）、调解、仲裁、诉讼。
D、马军老师想用 100 万之内把项目做完，打算和卖方签署工料合同。

6、以下（）不是规划采购管理的输入。
A、风险登记册　　B、干系人登记册　　C、资源需求　　D、采购策略

7、以下关于采购工作说明书 SOW 的说法中，错误的是（）。
A、SOW 通过明确项目应该完成的工作来确定项目范围
B、工作说明书的内容包括：规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。
C、工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

供此类产品、服务或成果。
D、在采购过程中，应根据需要对工作说明书进行修订，直到它成为所签协议的一部分。

8、如果需要卖方提供关于拟采购货物和服务的更多信息，则使用（）。
A、信息邀请书（RFI） B、报价邀请书（RFQ） C、建议邀请书（RFP） D、供方选择标准

9、（）是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。
A、广告 B、投标人会议 C、建议书评估 D、谈判

10、以下（）不属于控制采购的输出。
A、采购关闭 B、质量报告 C、预审合格卖方清单更新 D、采购档案

11、（）合同一般适用于经验丰富、技术实力雄厚且组织管理协调能力强的卖方，这样有利于发挥卖方的专业优势，保证项目的质量和进度，提高投资效益。
A、项目总承包合同 B、项目单项承包合同 C、项目分包合同 D、总价合同

12、在不能很快编写出准确工作说明书的情况下，经常使用（）来增加人员、聘请专家以及寻求其他外部支持。这类合同在金额小、工期短、不复杂的项目上可以有效使用，但在金额大、工期长的复杂项目上不适用。
A、工料合同 B、成本加奖励费用合同 C、成本加激励费用合同 D、成本加固定费用合同

13、（）是整个合同管理的基础，项目管理团队使用其对合同文件和记录进行管理。
A、合同签订管理 B、合同履行管理 C、合同档案管理 D、合同变更管理

14、马军老师正在进行供方选择分析，（）适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况。买方会确定短名单，然后根据可信度、相关资质、经验、专业知识、专长领域和参考资料选择最佳的投标人。
A、最低成本 B、仅凭资质 C、基于质量或技术方案得分 D、唯一来源

15、以下（）不是规划采购的输出。
A、自制或外购分析 B、自制或外购决策 C、采购工作说明书 D、供方选择标准

16、马军老师现在正在进行合同选择，他发现项目工作范围非常清楚，他会选择（）合同。
A、总价合同 B、工料合同 C、成本补偿合同 D、总承包合同

17、采购过程需要进行控制，以发现采购计划与实施采购过程中的偏差。以下关于采购控制叙述中，不正确的是（60）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、控制采购过程中是买方需要做的，卖方不需要控制采购
B、控制采购是管理采购的关系，监督合同执行情况，并根据需要实施的变更和采取纠正措施的过程
C、控制采购过程中可通过绩效评估，预测卖方未来项目执行能力
D、控制采购需要进行财务管理工作

18、小王作为某项目的项目经理，决定采用投标人会议的方式选择卖方。以下做法中，正确的是（59）。
A、限制参会者提问的次数，防止少数人问太多问题
B、防止参会者私下提问
C、小王不需要参加投标人会议，只需采购管理员参与即可
D、设法获得每个参会者的机密信息

19、“自制/外购”分析过程中，（58）时,项目不应从外部进行采购。
A、自制成本高于外购　　B、与其他项目有资源冲突
C、项目需要保密　　D、技术人员能力不足

20、关于采购谈判的描述,不正确的是（59）。
A、采购谈判过程中以买卖双方签署文件为结束标志
B、项目经理应是合同的主谈人
C、项目团队可以列席谈判
D、合同文本的最终版本应反映所达成的协议

21、关于控制采购过程的工具和技术的描述，不正确的是（59）。
A、合同变更控制系统应当与整体变更控制系统整合起来
B、检查与审计的作用是验证卖方工作过程或可交付成果对合同的遵守程度
C、绩效审查的目标在于发现履约情况的好坏
D、诉诸法律是解决所有索赔和争议的首选方法

22、关于采购谈判的描述，不正确的是（58）。
A、采购谈判过程以买卖双方签署文件为结束标志。
B、项目经理可以不是合同的主谈人
C、合同谈判期间项目管理团队必须就项目的管理要求进行澄清
D、对于简单的采购事项，只需要卖方的接受而不用漫长的谈判

23、合同索赔是合同管理的一项重要内容，合同索赔流程的正确步骤是（58）。
1.发出索赔通知书 2.监理工程师答复 3.提交索赔材料 4.索赔认可 5.提交索赔报告
A、12354　　B、21354　　C、13245　　D、32145

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

24、对于提供长期（一般为3年）涉外人力资源外包服务的软件企业，面对金融汇率波动较大和区域人力资源成本攀升速度较快的情况，应与客户签订（59）类合同。
A、固定总价合同　　B、成本补偿合同　　C、工料合同　　D、总价加经济价格调整合同

25、某项目需要在半年内完成，目前项目范围不清楚，所需资源类型可以确定，这种情况下，最好签订（56）。
A、总价合同　　B、成本补偿合同　　C、工料合同　　D、采购单合同

26、关于合同变更管理的描述，不正确的是（57）。
A、任何合同变更都需以法律事实为依据
B、不涉及成本、进度的合同变更无需提交书面申清
C、监理单位（或变更控制委员会）负责审批合同变更申请
D、对于任何合同变更的评估都应该有变更影响分析

27、关于合同类型的描述，不正确的是（55）。
A、总承包合同有利于技术力量较强、经验丰富的大承包商发挥专业优势
B、分包合同中的工程可以进行二次分包且必须经发包人同意
C、单项工程承包合同有利于吸引较多的承包人参与投标竞争
D、总价合同适用于工程量不太大且能精确计算、风险不大的项目。

28、关于合同的描述不正确的是（55）。
A、总价合同能使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商。
B、在成本补偿合同中，承包人承担了项目的大部分风险。
C、成本补偿合同和工料合同都是开口合同。
D、在工料合同中，为防止成本失控，可以规定最高价值和时间限制。

29、签订了采购合同后，我们下一步需要做（）。
A、编制采购管理计划　　B、控制采购　　C、采购审计　　D、供方选择分析

30、以下（）不是规划采购管理的输出。
A、采购工作说明书　　B、独立成本估算　　C、供方选择标准　　D、卖方建议书

31、以下（）不是控制采购的输出。
A、采购关闭　　B、更新的采购文档　　C、工作绩效信息　　D、审计

32、在规划采购管理过程中，（）包括关于哪些资源需要采购或租赁的信息，以及任何可能影响采购的假设条件或制约因素。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、资源管理计划　　B、范围管理计划　　C、质量管理计划　　D、范围基准

33、以下（）不属于采购策略的内容。
A、交付方法　　B、验收标准　　C、协议类型　　D、采购阶段

34、在控制采购过程中，（）是对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效。其中包括确定工作包提前或落后于进度计划、超出或低于预算，以及是否存在资源或质量问题。
A、绩效审查　　B、挣值分析　　C、趋势分析　　D、根本原因分析

35、以下关于采购关闭的说法，错误的是（）。
A、买方通常通过其授权的采购管理员，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知。
B、关于正式关闭采购的要求，通常已在合同条款和条件中规定，包括在采购管理计划中。
C、项目管理团队应该在关闭采购之前批准所有的可交付成果。
D、采购关闭属于结束采购过程的内容。

36、（）是卖方为响应采购文件包而编制的，其中包含的基本信息将被评估团队用于选定一个或多个投标人(卖方)。如果卖方将提交价格建议书，最好要求他们将价格建议书与技术建议书分开。
A、卖方建议书　　B、招标文件　　C、采购策略　　D、采购工作说明书

37、在采购管理中，（）不是裁剪考虑的因素。
A、采购的复杂性　　B、物理地点　　C、治理和法规环境　　D、成本

38、2017年11月第54题

在采购规划过程中，需要考虑组织过程资产等一系列因素，以下（54）不属于采购规划时需要考虑的。

A、项目管理计划　B、风险登记册　　C、采购工作说明书　　D、干系人登记册

39、2017年11月第55题

项目外包是承接项目可能采取的方式，但只有（55）是允许的。

A、部分外包　　B、整体外包　　C、主体外包　　D、层层转包

40、2019年5月第54题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

根据供方选择标准，选择最合适的供方属于（53）阶段的工作。

A、规划采购　　B、实施采购　　C、控制采购　　D、结束采购

41、2018年11月第55题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

关于合同违约索赔的描述，不正确的是：（55）。

A、项目索赔事件中，监理工程师和政府建设主管机构承担调解责任，经济合同仲裁委员会承担调解或仲裁责任

B、合同索赔遵循的原则包括：索赔的有理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性

C、对于属于买方的原因造成拖延工期，只需给卖方延长工期，不应给予费用补偿

D、《民法通则》、《合同法》中与合同纠纷相关条款，可以作为工程索赔的法律依据

42、2019 年 5 月第 28 题

合同法对合同索赔流程有严格的规定，索赔方以书面通知书的形式在索赔事项发生后的 28 天内，向监理工程师正式提出索赔意向；在索赔通知书发出后 28 天内向监理工程师提出索赔报告及有关资料；监理工程师收到索赔报告有关资料后，于（28）内给予答复。

A、15 天　　B、15 个工作日　　C、28 天　　D、28 个工作日

43、2019 年 5 月第 54 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

在确定项目合同类型时，如果项目工作范围很明确且风险不大，建议使用（54）。

A、总价合同　　B、工料合同　　C、成本补偿合同　　D、成本加激励费用合同

44、2019 年 11 月第 55 题

在 CPIF 合同下，A 公司是卖方，B 公司是买方，合同的实际成本大于目标成本，A 公司得到的付款总数是（55）。

A、目标成本+目标费用-B 公司应担负的成本超支

B、目标成本+目标费用+A 公司应担负的成本超支

C、目标成本+目标费用-A 公司应担负的成本超支

D、目标成本+目标费用+B 公司应担负的成本超支

45、2020 年 11 月第 55 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

（55）为卖方报销履行合同工作所发生的一切合法成本（即成本实报实销），买方再给卖方支付一笔利润，完全由买方根据自己对卖方绩效的主观判断来决定，并且卖方通常无权申诉。

A、总价加激励费用合同　　B、总价加经济价格调整合同

C、成本加固定费用合同　　D、成本加奖励费用合同

46、2021 年 5 月第 55 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

成本加激励费用合同下，实际成本大于目标成本，卖方可得的付款总数为（55）。

A、目标成本+目标费用-买方应负担的成本超支

B、目标成本+目标费用+买方应负担的成本超支

C、目标成本+目标费用+卖方应负担的成本超支

D、目标成本+目标费用-卖方应负担的成本超支

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

47、2021 年 11 月第 55 题

在处理索赔的过程中，需要以合同为依据，合同解释非常重要。（55）原则不属于合同解释的原则。

A、整体解释　　B、适用法律　　C、实时纠偏　　D、公平诚信

48、2022 年 5 月第 54 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（54）场景适宜签署成本补偿合同。

①工作范围尚不清楚　　②买方承担成本风险

③购买标准产品且数量不大　④买卖双方已建立稳定的合作关系

⑤项目设计已具备详细的细节　⑥工期短且不复杂的项目

A、①⑤⑥　　B、①②④　　C、②③⑤　　D、③④⑥

49、2022 年 11 月第 54 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

买方为卖方报销履行合同工作中的所发生的的成本，完全由买方主观判断卖方的绩效来决定奖励费用，双方签订的是（54）。

A、成本加奖励合同　　B、成本加固定费用合同

C、成本加激励合同　　D、总价加激励合同

50、2022 年 11 月第 55 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

合同管理包括（55）、合同履约管理、合同变更管理、（55）。

A、合同签订管理、合同档案管理　　B、合同规划管理、合同档案管理

C、合同签订管理、合同补充管理　　D、合同规划管理、合同补充管理

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十三章 项目干系人管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 52 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在以下干系人参与度矩阵中，需要授权管理职责并引导其积极参与项目执行的干系人是（52）。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1			○●		
干系人 2			●	○	
干系人 3			●		○

注：○表示期望参与水平，●表示实际参与水平

A、干系人 1　　B、干系人 2　　C、干系人 3　　D、干系人 2 和干系人 3

2、2023 年 5 月第 53 题

（53）不属于识别干系人的输入。

A、立项管理文件　　B、变更日志和问题日志

C、沟通管理计划　　D、项目干系人登记册

3、2023 年 5 月第 54 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

“通过与干系人进行沟通协作以满足其需求与期望,处理问题促进其合理参与”属于（54）过程的工作。

A、识别干系人　　B、规划干系人参与

C、管理干系人参与　　D、监督干系人参与

4、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是通过干系人的权力、紧迫性、合法性对干系人进行分类。

A、凸显模型　　B、权力利益方格　　C、干系人立方体　　D、影响方向

5、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

以下（）不属于组织过程资产。

A、组织文化

B、组织的社交媒体、道德和安全政策及程序

C、组织的问题、风险、变更

D、数据管理政策及程序

6、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（）用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。

A、思维导图　B、干系人参与度评估矩阵　C、根本原因分析　D、优先级排序或分级

7、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于干系人参与度评估矩阵，以下说法，错误的是（）。

A、干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。

B、C 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平（期望的）

C、支持型是指了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果

D、应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引干系人参与项目。

8、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

以下（）不是规划干系人管理的输入？

A、资源管理计划　B、风险管理计划　C、干系人登记册　D、干系人参与计划

9、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不属于监督干系人参与的工具和技术?

A、备选方案分析　B、会议　C、根本原因分析　D、紧迫性评估

10、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果，属于（）。

A、识别干系人　B、规划干系人　C、管理干系人　D、监督干系人

11、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

干系人参与度评估矩阵不能用于（）过程?

A、识别干系人　B、监督干系人　C、监督沟通　D、规划沟通

12、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不是干系人登记册的内容？

A、身份信息　B、评估信息　C、干系人分类　D、干系人参与计划

13、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）是方格模型的改良形式，把方格中的要素组合成三维模型，项目经理和团队可据此分析干系人并引导干系人参与项目。作为一个多维模型，它将干系人视为一个多维实体，便于分析，从而有助于沟通策略的制定。

A、干系人立方体　B、凸显模型　C、影响方向　D、权力利益方格

14、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

某项目经理在编制干系人管理计划时，绘制的如下表格叫做（）。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人1	C			D	
干系人2			C	D	
干系人3				D C	

A、干系人参与度评估矩阵　　B、凸显模型　　C、干系人立方体　　D、RACI

15、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某个人积极参与项目以确保项目成功，在干系人参与度评估矩阵属于（）。

A、领导　　B、支持　　C、中立　　D、抵制

16、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

适用于监督干系人参与过程的数据表现技术是（）。

A、沟通技能　　B、根本原因分析　　C、干系人参与度评估矩阵　　D、干系人分析技术

17、2023年11月第4批

识别项目干系人管理过程在（）可以重复开展。

①每个阶段开始时

②项目出现重大变化时

③进行可行性研究时

④组织出现重大变化时

⑤编制项目章程时

A、③④⑤　　B、①②③　　C、②③④　　D、①②④

18、2024年5月第1批

关于干系人参与计划的描述，不正确的是（）。

A、干系人参与计划是项目管理计划的组成部分

B、干系人参与计划基于项目的需要和干系人的期望而制定

C、干系人参与计划是识别干系人过程的输出

D、干系人参与计划制订了干系人有效参与和执行项目决策的策略和行动

19、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目经理根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法，则该项目经理正在执行( )过程。

A、识别干系人　　B、规划干系人参与　　C、管理干系人参与　　D、监督干系人参与

20、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

监督干系人参与时,( ) 用于确定干系人群体和个人在项目任何特定时间的状态。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、根本原因分析　　B、优先级排序　　C、职责分配矩阵　　D、干系人分析

21、2024 年 5 月第 2 批

关于管理干系人参与过程，正确的是（）。

A、干系人参与计划必须是正式的、详细的项目文件，以确保满足项目的需要

B、规划干系人参与过程是管理干系人参与过程的前置流程，不受管理干系人参与过程的影响

C、管理干系人参与过程的输出包括变更请求、组织过程资产、事业环境因素

D、管理干系人参与过程的主要作用是尽可能提高干系人的支持度、降低抵制程度

22、2024 年 5 月第 2 批

关于项目干系人管理的描述，正确的是（）。

A、识别干系人过程的输出文件包括干系人登记册、工作绩效信息、变更请求

B、监管机构、环保人士、媒体与项目关联程度低，不需要纳入干系人管理

C、识别干系人参与的过程需要在整个项目期间定期开展

D、干系人参与计划是规划干系人参与过程的输入文件

23、2024 年 5 月第 2 批

关于识别干系人过程的描述，不正确的是（）。

A、干系人登记册是识别干系人过程的主要输出，记录与识别关系人的信息

B、变更日志、问题日志、需求文件可以作为识别干系人过程的输入

C、对干系人进行分类的方法，包括权力利益方格、因果图、回归分析、凸显模型等

D、识别干系人的主要作用是使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注

24、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）工具用于比较干系人当前参与水平与期望参与水平。

A、权力/利益矩阵　　B、概率和影响矩阵

C、干系人参与度评估矩阵　　D、职责分配矩阵

25、2025 年 5 月第 1 批

（）不属于监督干系人参与的过程的输出。

A、干系人登记册　　B、风险登记册　　C、项目沟通记录　　D、变更请求

26、2025 年 5 月第 1 批

某小型内部项目团队仅 5 人，干系人集中在同一部门。项目经理应优先考虑（）。

A、简化沟通计划与文档复杂度　　B、完全取消干系人优先级排序

C、忽略干系人参与度评估矩阵　　D、减少干系人识别步骤

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

27、2025 年 5 月第 2 批

关于管理干系人参与过程的描述，正确的是（）。

A、管理干系人参与的活动包括预测，澄清和解决干系人可能在未来引发的问题

B、管理干系人参与的主要作用是维持或提升干系人参与活动的效率和效果

C、管理干系人参与有助于干系人明确了解项目的目的、目标、收益和风险

D、沟通管理计划可作为管理干系人参与过程输入，被纳入项目文件进行管理

28、2025 年 5 月第 2 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

（）适用于复杂的干系人大型群体，或在干系人群体内部存在复杂的关系网络，可用于确定已识别干系人的相对重要性。

A、优先级排序　　B、影响方向　　C、权利利益方格　　D、凸显模型

29、2025 年 5 月第 2 批

关于项目干系人管理的发展趋势和新兴实践的描述，不正确的是（）。

A、确保团队都涉及引导干系人参与的活动

B、关注干系人有效参与的正面与负面价值

C、视受项目影响最大的干系人为合作伙伴

D、在限定范围内识别项目的所有干系人

30、2026 年 5 月第 1 批

“监督干系人参与”主要工作（ ）。

A、适当的技术和方法与干系人沟通形成沟通记录

B、基于干系人参与状态，分析偏差并采取纠正措施

C、识别新增的项目干系人，更新干系人登记册

D、制定具体的干系人参与策略和计划

31、2026 年 5 月第 1 批

可作为“识别干系人”过程输入的项目文件不包括（ ）。

A、问题日志　　B、变更日志　　C、需求文件　　D、干系人登记册

32、2026 年 5 月第 1 批

规划干系人参与过程的输入不包括（ ）。

A、干系人登记册　　B、项目管理计划

C、干系人参与计划　　D、事业环境因素

33、2026 年 5 月第 2 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

（）适用于在干系人群体内存在复杂网络关系时使用;（）适用于小型项目、干系人与项目的关系简单且稳定的项目。

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、权力影响方格　凸显模型　　B、权力利益方格　优先级排序

C、干系人立方体　凸显模型　　D、凸显模型　　权力影响方格

34、2026年5月第2批

关于项目干系人管理的描述，不正确的是（）。

A、项目进入不同生命周期时应开展项目干系人识别与排序

B、项目经理和团队的管理干系人的能力决定着项目的成败

C、项目干系人会对项目产生积极或消极的影响

D、首次识别干系人需要在项目章程批准之后尽快开展

35、2026年5月第2批

“管理干系人参与”过程用到的项目管理计划组件不包括（）。

A、风险管理计划　　B、风险管理计划　　C、进度计划　　D、变更管理计划

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为2部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于识别干系人的说法中，不正确的是（）。

A、识别干系人属于启动过程组的内容。

B、干系人参与计划是识别干系人的输入

C、干系人立方体是识别干系人的工具

D、识别干系人时，影响方向中的向下是指客户等干系人。

2、以下关于规划干系人的说法中，不正确的是（）。

A、干系人参与度评估矩阵是规划干系人的工具

B、干系人登记册、进度计划都是规划干系人的输入

C、规划干系人的输出是干系人参与计划，该计划必须一次确定，不再更新。

D、应该对干系人需求以及干系人本身进行优先级排序或分级。具有最大利益和最高影响的干系人，通常应该排在优先级清单的最前面。

3、以下关于管理干系人参与的说法中，不正确的是（）。

A、管理干系人参与是通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望、处理问题，并促进干系人合理参与的过程。本过程的主要作用是，尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。

B、适用于管理干系人参与过程的人际关系与团队技能主要包括：冲突管理、文化意识、政策意识等。

C、基本规则不可以用于管理干系人参与过程

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、问题日志、干系人登记册有可能会在本过程更新。

4、以下关于监督干系人参与的说法中，不正确的是（）。
A、监督干系人参与是监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。本过程的主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。
B、备选方案分析是监督干系人参与的工具。
C、多标准决策分析是监督干系人参与的工具。
D、监督干系人参与过程不会导致资源管理计划的更新。

5、以下说法，错误的是（）。
A、权力利益方格、权力影响方格，或作用影响方格是基于干系人的职权级别（权力）、对项目成果的关心程度（利益）、对项目成果的影响能力（影响），或改变项目计划或执行的能力，每一种方格都可用于对干系人进行分类。
B、凸显模型是通过评估干系人的权力（职权级别或对项目成果的影响能力）、紧迫性（因时间约束或干系人对项目成果有重大利益诉求而导致需立即加以关注）和合法性（参与适当性），对干系人进行分类。
C、开展根本原因分析，确定干系人参与未达预期效果的根本原因。
D、政策意识有助于项目经理和团队通过考虑文化差异和干系人需求，来实现有效沟通。

6、以下（）不是干系人登记册的内容。
A、身份信息　　B、评估信息　　C、干系人分类　　D、干系人参与计划

7、在监督干系人参与过程中，（）用于确保发送给干系人的信息被接收和理解。
A、反馈　　B、演示　　C、文化意识　　D、政策意识

8、（）是头脑风暴的改良形式，让个人参与者有时间在小组创意讨论开始前单独思考问题。信息可通过面对面小组会议收集，或在由技术支持的虚拟环境中收集。
A、头脑写作　　B、问卷和调查　　C、干系人分析　　D、文件分析

9、以下（）不是管理干系人参与过程的活动。
A、通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目
B、在适当的项目阶段引导干系人参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺
C、通过谈判和沟通的方式管理干系人期望
D、澄清和解决已识别的问题等

10、马军老师正作为项目经理在管理一个警务信息化项目建设，根据权力利益方格，以下（）干系人，马军老师可以采用令其满意的策略。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、分管信息化的副厅长　　B、分管治安的副厅长　　C、乙方团队成员　　D、乙方主管领导

11、马军老师作为专家参与了某项目的评审工作，在该活动中，马军老师是该项目（）方向的干系人。
A、向上　　B、向下　　C、向外　　D、横向

12、关于干系人管理的描述。不正确的是（56）。
A、干系人分析在项目立项时进行，以便尽早了解干系人对项目的影响
B、识别干系人的方法包含组织相关会议、专家判断、干系人分析等
C、干系人分析是系统地收集干系人各种定性和定量信息的一种方法
D、典型的项目干系人包含客户、用户、高层领导、项目团队和社会成员等

13、下图干系人权利和利益的描述，不正确的是（56）。

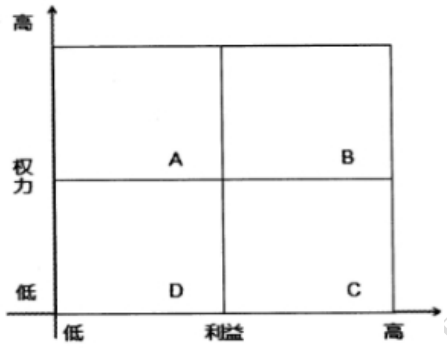

A、项目经理的主管领导就是A区的干系人，要“令其满意”
B、项目客户是B区的干系人，要“重点管理、及时报告”
C、对于C区的干系人，要“随时告知”
D、对于D区干系人，花费最少的精力监督即可

14、根据干系人权力/利益方格分析，某手机厂商对于其品牌的忠实粉丝及未来潜在用户，应该采取的管理方式是（55）。
A、随时告知　　B、重点管理　　C、监督　　D、令其满意

15、张主任是某集成项目的关健客户，对项目的验收有一票否决权，但他对项目的的进度似乎不太关心，对于张主任应该采取的管理策略是（55）。
A、重点管理　　B、监督　　C、令其满意　　D、随时告知

16、关于干系人管理的描述不正确的是（54）。
A、干系人管理是领导、控制干系人，使其参与项目。
B、干系人对项目的影响通常在项目启动阶段最大。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、应在项目的初期制定项目计划之前识别干系人。
D、需要在项目的不同阶段对干系人之间的关系施加不同的影响。

17、以下（）不是识别干系人的输入？
A、干系人参与计划　　B、干系人登记册　　C、沟通管理计划　　D、采购文档

18、以下（）不是监督干系人参与的工具？
A、假设条件和制约因素分析　　B、多标准决策分析　　C、备选方案分析　　D、干系人分析

19、在通过识别干系人过程明确最初的干系人群体之后，就应该编制第一版的干系人参与计划，然后定期更新干系人参与计划，以反映干系人群体的变化。会触发该计划更新的情况主要包括：（）。
①项目新阶段开始
②组织结构或行业内部发生变化
③新的个人或群体成为干系人，现有干系人不再是干系人群体的成员，或特定干系人对项目成功的重要性发生变化
④当其他项目过程(如变更管理、风险管理或问题管理)的输出导致需要重新审查干系人参与策略等。
A、①②③④　　B、①②　　C、③④　　D、①②③

20、在进行规划干系人管理时，（）将干系人分析的结果与其他被视为具备引领级的组织或项目的信息进行比较。
A、标杆对照　　B、假设条件和制约因素分析　　C、根本原因分析　　D、思维导图

21、在管理干系人参与过程中，（）用于获得支持或达成关于支持项目工作或成果的协议，并解决团队内部或团队与其他干系人之间的冲突。
A、谈判　　B、冲突管理　　C、观察和交谈　　D、政策意识

22、在监督干系人参与过程中，（）是在干系人参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估应对偏差的各种备选方案。
A、备选方案分析　　B、根本原因分析　　C、干系人分析　　D、多标准决策分析

23、马军老师正在进行项目的干系人管理，他在裁剪时，不需要考虑（）。
A、干系人多样性　　B、干系人关系的复杂性　　C、沟通技术　　D、资源

24、2018年5月第43题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

在了解和管理干系人期望时，可以采用多种分类方法对干系人进行分类管理。其中（43）方法是根据干系人主动参与项目的程度以及改变项目计划或执行的能力进行分组。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、权力/利益方格　　B、权力/影响方格　　C、影响/作用方格　　D、凸显模型

25、2018年5月第44题

A公司承接了某银行网上银行系统的建设项目，包括应用软件开发、软硬件集成适配、系统运维等多项工作内容。针对该项目，不正确的是（44）。

A、该项目的干系人包括客户、公司高层领导、项目成员以及网上银行用户

B、干系人管理工作应由该项目成员分工负责

C、干系人管理有助于为项目赢得更多的资源

D、通常来说，干系人对项目的影响能力在项目启动阶段最大，随着项目的进展逐渐减弱

26、2019年5月第43题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在进行项目干系人分析时，经常用到权利/利益分析法。对下图中甲区域的项目干系人应该采取的策略是（43）。

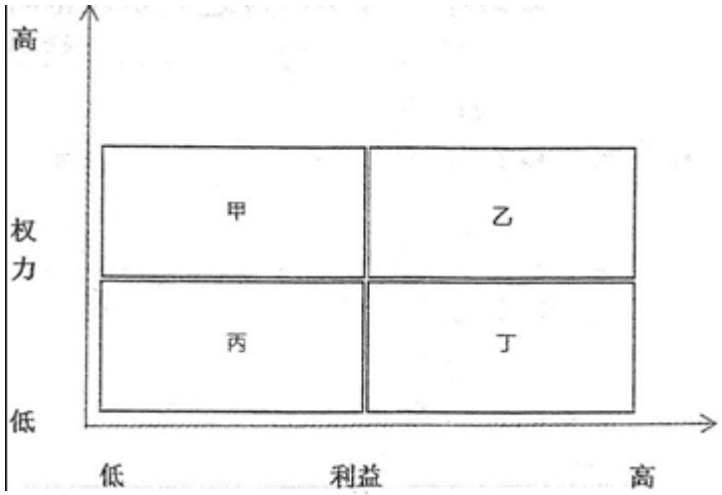

A、随时告知　　B、令其满意　　C、花较少的精力　　D、重点管理

27、2019年5月第44题

某大型环保信息系统工程建设项目，项目发起人与项目经理一起识别出如下3类项目干系人：甲方信息系统管理人员、项目组主要技术人员、监理方，并准备针对他们编制干系人管理计划。对此，您的建议是（44）。

A、重新识别干系人　　B、编制干系人管理计划

C、召开干系人管理沟通会议　　D、编制项目进度计划

28、2019年11月第43题

关于项目干系人的描述，正确的是（43）。

A、项目干系人是从项目活动中获利的个人、群体或组织

B、自认为受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织也是干系人

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、干系人分析是在项目计划阶段实施的工作，在其他阶段不涉及

D、干系人之间的关系不是干系人分析的工作内容

29、2019年11月第44题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

在权利/利益方格中，针对“权力小，对项目结果关注度高”的干系人，应该采取的措施是（44）。

A、重点管理　　B、花最少的精力监督　　C、令其满意　　D、随时告知

30、2020年11月第43题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某手机应用上线后，收到老年用户的多起投诉：界面繁琐，字体太小，使用不方便。这反映了项目组在（43）工作中在在不足。

A、变更控制　　B、识别干系人　　C、质量控制　　D、团队建设

31、2020年11月第44题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

根据干系人管理的权力/利益方格，对于项目建设方主管领导应该（44）。

A、令其满意　　B、重点管理　　C、监督　　D、随时告知

32、2021年5月第43题

关于项目干系人管理的描述，不正确的是（43）。

A、项目成员的家属也可能成为项目干系人

B、整个项目周期中项目干系人都可能发生增减变化

C、规划干系人管理应由项目经理在项目规划阶段完成

D、应把干系人满意度作为一个关键的项目目标来管理

33、2021年5月第44题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

根据干系人的权力、紧迫度和合法性对干系人进行分类的是（44）。

A、凸显模型　　B、影响/作用方格　　C、权利/利益方格　　D、权利/影响方格

34、2021年11月第43题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

干系人管理的活动按时间顺序排列正确的是：（43）。

①管理干系人期望，确保目标实现　　② 查看项目章程和采购文件

③识别干系人及其相关信息　　④ 制定干系人管理计划

A、②③④①　　B、②④①③　　C、③④②①　　D、③①②④

35、2021年11月第44题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

根据干系人分类模型。“高利益-低权利”的干系人对项目最不可能的一种态度是（44）。

A、支持　　B、中立　　C、抵制　　D、领导

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

36、2022 年 5 月第 44 题

关于项目干系人管理的描述，不正确的是（44）。

A、应把干系人满意度作为一个关键项目目标来进行管理

B、规划干系人是一个反复的过程，应由项目经理定期开展

C、项目干系人管理包含项目需求管理、沟通管理和人力资源管理

D、建立沟通管理计划是为管理干系人的期望提供指导和信息

37、2022 年 11 月第 44 题*（此题为常规重点考题，建议背一反三）*

干系人对项目的影响能力通常在项目（44）阶段最大。

A、启动　　B、规划　　C、执行　　D、收尾

38、2022 年 11 月第 45 题*（此题为常规重点考题，建议背一反三）*

项目管理过程中，针对低权利、高利益类的干系人应（45）。

A、将项目的相关事项信息随时告知对方

B、重点解决其提出的主要需求，争取其支持

C、判断其对项目产生的影响，实施令其满意的行动策略

D、避免其对项目产生负面影响，不需过多进行干预

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十四章 项目绩效域

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第55题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（55）不属于规划绩效域的预期目标。

A、项目以有条理、协调一致的方式推进

B、对项目状况充分了解,支持决策

C、应用系统的方法交付项目成果

D、可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

2、2023年5月第56题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目工作绩效域目标和工作内容的描述,不正确的是（56）。

A、使干系人接受项目可交付物和成果,并对其满意

B、使项目团队保持专注，并使项目活动顺利进行

C、通过持续学习和过程改进，提高团队能力

D、涉及大量的沟通工作，与干系人绩效域关联

3、2023年5月第58题

项目不确定性的应对方法包括（58）。

①听取专家分析和专项市场分析

②提高组织和团队的适应性能力

③建立项目关键绩效指标

④权衡项目多种因素选择最佳方案

⑤应用系统的方法交付项目成果

⑥对潜在的不确定性估算发生概率

A、①②③⑤　　B、①③④⑥　　C、①③⑤⑥　　D、①②④⑥

4、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）指出，对某一事物进行度量时会对其行为产生影响，因此需要谨慎制定度量指标。

A、霍桑效应　　B、虚荣指标　　C、士气低落　　D、确认偏见

5、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

以下（）不是概率估算的相关因素。

A、具有一定区间的点估算　　B、置信程度

C、概率分布　　D、管理储备

6、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

马乐老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

（）通过一些方式打造高绩效项目团队。

A、项目经理　　B、项目经理和团队　　C、项目团队　　D、质量管理人员

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

有效的度量指标具有SMART特征，其中T是指（）。

A、具体的　　B、可实现的　　C、具有相关性　　D、具有及时性

8、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用（）方法。

A、预测型　　B、适应型　　C、混合型　　D、敏捷型

9、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，则更适合采用（）方法。

A、预测型　　B、适应型　　C、混合型　　D、敏捷型

10、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不是度量绩效域需要重点关注的内容。

A、制定有效的度量指标　　B、度量内容及相应指标

C、度量陷阱　　D、风险

11、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不是交付绩效域需要重点关注的内容。

A、价值的交付　　B、可交付物　　C、质量　　D、范围

12、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

以下（）不属于预测性度量指标。

A、ETC　　B、EAC　　C、TCPI　　D、净推荐值

13、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

价值的度量指标包含（）。

①成本效益比 ②计划收益交付与实际收益交付的对比③投资回报率(ROI) ④净现值(NPV)

A、①②③④　　B、①②③　　C、②③④　　D、③④

14、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

新访问者的数量比网站的页面访问量更加有用，这是（）的举例。

A、虚荣指标　　B、误用度量指标　　C、确认偏见　　D、相关性与因果关系混淆

15、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

处理基于系统的复杂性的方法主要包括（）。

①解耦　②模拟　③多样性　④平衡

A、①②　B、③④　C、①③　D、②④

16、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）属于有效执行交付绩效域需要重点关注的内容。

A、质量　B、风险　C、进度　D、成本

17、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不属于规划绩效域的内容？

A、项目过程　B、度量指标　C、规划的影响因素　D、项目估算

18、2023年11月第4批

规划绩效域中，可以应用（）检查项目是否以有条理、协调一致的方式推进。

A、绩效偏差　B、规划的详尽程度　C、规划的充分性　D、规划的整体性

19、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在交付绩效域，为了有效执行项目交付工作，项目经理需要重点关注的内容包括：()。

①可交付物 ②价值的交付 ③质量 ④规划 ⑤预算

A、②③④　B、①②③　C、①②③④⑤　D、①②④

20、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

高风险的产品需要大量的前期规划和严格的流程来降低风险，可采用（）开发方法。新药开发项目可能会进行（）,临床前建议、第1阶段临床试验结果、第2阶段临床试验结果、第3阶段临床试验结果、注册和上市，按照顺序进行交付。

A、混合型　多次交付　B、混合型　定期交付

C、预测型　多次交付　D、适应型　持续交付

21、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）可以度量项目的生产率，可以对照计划跟踪已完成的工作量，显示剩余工作的数量或已减少的风险的数量。

A、仪表盘　B、燃烧图　C、气泡图　D、任务板

22、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在制定预算的过程中，项目的总成本为100万，项目团队把预算确定为95万，这种估算为()。

A、概率估算　B、确定性估算　C、粗略量级估算　D、自下而上估算

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

23、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

有效执行规划绩效域，能够达到的目标不包括（）。

A、项目以有条理、协调一致的方式推进

B、可以根据新出现的和不断变化的需求进行调整

C、对实物资源进行了有效管理

D、以系统的方法交付项目成果

24、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

交付绩效域的绩效要点包括（）。

①质量 ②成本 ③风险 ④可交付物 ⑤价值的交付

A、①②③ B、②③④ C、①④⑤ D、②④⑤

25、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

探索各种选项，权衡包括时间与成本、风险与进度等多种因素，舍弃无效或次优的替代方案，这种不确定性应对方法是( )。

A、增加韧性 B、为多种结果做好准备 C、收集信息 D、集合设计

26、2024 年 5 月第 2 批

在一个信息化系统开发项目中，（）属于有效的项目绩效度量指标。

A、系统可用性百分比 B、项目文档的总页数

C、开发进度报告更新频率 D、项目经理加班工时

27、2024 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在项目工作绩效域，管理实物资源的主要目标不包括（）。

A、促进安全的工作环境 B、杜绝报废和浪费

C、消除材料等待时间 D、减少现场的材料搬运和储存

28、2024 年 5 月第 2 批

下列关于建设团队的说法，不正确的是（）。

A、团队成员对成果的主人翁意识越强，表现就越好

B、出现问题能够定位责任，体现高绩效项目团队，韧性强

C、所有团队成员都应展现出相应的领导力和人际关系技能

D、团队成员相互协作与合作，有助于产生多样化的想法，获得更好成果。

29、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

不确定性绩效域相关的定义中，（）是对意外变化快速适应和应对的能力。

A、韧性 B、模糊性 C、风险 D、复杂性

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

30、2025年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在项目整个生命周期过程中，为了有效执行规划绩效域、需要对工作投入、持续时间、成本、人员和实物资源进行估算，在估算时一般可以采用（）估算办法。

①绝对估算和相对估算 ②精准度和准确度估算 ③确定性估算和概率估算 ④基于工作流估算 ⑤对不确定性的调整估算

A、②③④⑤ B、①②③④ C、①②④⑤ D、①③④⑤

31、2025年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在项目整个生命周期过程中，有效执行项目工作绩效域可以实现预期目标，主要包含（）。

①对采购进行了有效管理

②干系人认同项目目标

③干系人适当的沟通和参与

④通过持续学习和过程改进提高了团队能力

⑤对演变情况进行详细说明

⑥有效处理了变更

A、③④⑤⑥ B、②④⑤⑥ C、①②③④ D、①③④⑥

32、2026年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

有效执行度量绩效域可以实现的预期目标包括（ ）。

①对项目状况充分理解

②对需求有清晰的理解

③及时采取行动

④能够基于预测和评估作出决策

⑤预定时间实现项目收益

A、①②③ B、①③④ C、②③④ D、③④⑤

33、2026年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目规划绩效域的描述，不正确的是（ ）。

A、开发方法会影响如何规划、规划多少及何时实施规划

B、准确度是指估算的正确性，准确度越低，估算值的潜在区间就越大

C、规划绩效域需要在项目早期有效执行，并重点关注项目估算、资源规划、项目绩效和处理的变更

D、项目开始时，与项目和产品范围、干系人、需求、风险和其他情况相关的信息较少，估算往往有较大的区间，随着项目进展，估算区间会逐步缩小

34、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于开发方法和生命周期绩效域与其他绩效域的相互作用的描述，不正确的是（）。

A、采用适应型方法时，更侧重服务型领导风格，团队常呈现自我管理特征

在线老师：购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、预测型生命周期会提前完成规划，项目过程中不再进行规划调整与更新

C、如果交付物存在与监管要求相关的大量风险，可选择预测型方法，强化测试、文档及流程管控

D、若可交付物存在大量与干系人验收相关的风险，可选用迭代方法，先发布最小可行产品以获取反馈

35、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目工作绩效域的绩效要点包括（）。

①专注于工作过程和能力

②项目估算

③处理采购事宜

④度量指标和一致性

⑤管理沟通和参与

⑥项目制约因素

A、①②③　　B、②④⑥　　C、④⑤⑥　　D、①③⑤

本章可以做的另一些题目：

本块题目为我按新教材写的模拟题，大家可以选择性的做。模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、有效执行干系人绩效域可以实现的预期目标不包含（）。

A、与干系人建立高效的工作关系

B、干系人认同项目目标

C、支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益

D、建立高绩效团队

2、以下说法中，错误的是（）。

A、自我意识是进行现实的自我评估的能力，它包括了解自己的情绪、目标、动机、优势和劣势。

B、社交意识涉及体现同理心以及理解并考虑他人的感受的能力，包括读懂非语言暗示和肢体语言的能力。

C、批判性思维是训练有素、合乎理性、遵从逻辑、基于证据的思维，包括概念想象力、洞察力、直觉、反思性思维和元认知（“思考之上的思考”和“认知之上的认知”），它需要项目团队成员具备开放思维和客观分析问题的能力。

D、多次交付是按固定的交付计划进行，例如每月或每两个月交付一次。

3、以下说法中，错误的是（）。

A、在充分了解范围和需求的情况下，项目团队以前完成的工作且能够提前规划的项目适合采用预测型方法；创新程度高或项目团队没有做过的项目更适合采用适应型方法。

B、可交付物的范围稳定且变化小时，适合采用预测型方法；如果范围会有许多变更，则适应型

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

方法会更适合。
C、在项目整个生命周期过程中，采用适应型方法时需要干系人大量参与，某些干系人(例如产品负责人)在确定工作及其优先级方面发挥着重要作用。
D、精确度是指估算的正确性。

4、有效的度量指标具有SMART特点，其中不包含（）。
A、具体的　　B、有意义的　　C、可实现的　　D、有价值的

5、以下说法中，错误的是（）。
A、仪表盘是以电子方式收集信息并生成描述状态的图表，允许对数据进行深入分析，用于提供高层级的概要信息，对于超出既定临界值的任何度量指标，辅助使用文本进行解释。
B、大型可见图表(BVC)也称为信息发射源，是一种可见的实物展示工具，可向组织内成员提供度量信息和结果，支持及时的知识共享。
C、霍桑效应是指应尽量摆脱偏见。人们倾向于寻找并看到支持原有观点的信息，可能会导致对数据作出错误解释。
D、燃烧图(包括燃起图或燃尽图)。燃起图可以对照计划，跟踪已完成的工作量，燃尽图可以显示剩余工作(例如采用适应型方法的项目中的故事点)的数量或已减少的风险的数量。

6、干系人主要参与的项目工作，下面描述不正确的是（ ）。
A、参与并制定规划
B、确定项目可交付物和项目成果的验收和质量标准
C、为项目团队定义需求和范围，并对其进行优先级排序
D、需要随时关注项目进展情况及绩效的测量

7、为了建立高效的工作关系，项目经理和项目团队对干系人绩效域的执行效果检查的指标正确的是（）。
A、干系人相关问题和风险
B、干系人满意度
C、干系人参与的连续性
D、适应变化的能力

8、为了有效执行团队绩效域，项目经理需要重点关注的内容不包含的是（ ）。
A、项目开发方法及生命周期　　B、项目团队文化
C、高绩效项目团队　　D、领导力技能

9、在项目开始时确立了明确的愿景，之后在项目进行过程中在最初已知需求基础上，按照用户反馈、环境或意外事件来不断完善、说明、更改或替换，这是如下哪种开发方法（）。
A、预测性方法　　B、混合型方法　　C、迭代型方法　　D、适应型方法

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

10、下列关于开发方法的选择错误的是（ ）。
A、对于有多层级、严格汇报结构、官僚作风浓厚的组织常适合采用预测型方法；
B、预测型方法更适合项目团队自管理的组织；
C、创新程度高或项目团队没有做过的项目更适合采用适应型方法；
D、有些大型项目一般采用预测型方法进行规划，但其中一些组件则可以增量型方法开发和交付。

11、下列说明错误的是（）。
A、确定度量指标、基准和临界值，以及确定测试和评估方法及流程是度量绩效域的重要工作。
B、为了有效执行不确定性绩效域，项目经理需要重点关注风险、模糊性、复杂性、不确定性的应对方法；
C、为了有效执行交付绩效域，项目经理需要重点关注价值的交付、可交付物、质量。
D、交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率，项目可以一次性交付、多次交付、定期交付和持续交付。

12、一旦识别了干系人，项目经理和项目团队就需要尽力去了解干系人的感受、情绪、信念和价值观，分析每个干系人对项目的立场和持有的观点。这是属于（）的内容。
A、理解和分析　　B、优先级排序　　C、参与　　D、识别

13、（）是指出现问题或故障时，高绩效项目团队可以快速恢复。
A、韧性　　B、赋能　　C、认可　　D、适应性

14、解决冲突的方法不包括（）。
A、尊重、开诚布公地进行沟通　　B、聚焦于问题
C、聚焦于过去　　D、共同寻找备选方案

15、（）是通过确定周期和产量来制定的，周期是一个产品经过一个完整过程的总消耗时间，产量是指可以在给定时间内完成一个完整过程的产品数，这两个数字可以提供完成指定工作量所需的估算值。
A、基于工作流的估算　　B、对不确定性的调整估算
C、确定性估算和概率估算　　D、绝对估算和相对估算

16、（）是指通过价值流图来测量增值活动和非增值活动之间的比率，用以识别是否存在非增值的冗余活动。
A、精益生产法　　B、召开回顾会议　　C、价值导向审查　　D、TQM

17、管理实物资源的目标不包括（）。
A、减少或消除现场的材料搬运和储存　　B、消除材料等待时间

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、最小化报废和浪费　　D、提高团队绩效

18、以下关于需求的要求，错误的是（）。
A、清晰　　B、简洁　　C、可核实　　D、冗余

19、以下（）指标属于提前指标。
A、待办事项列表中正在进展的事项的数量
B、已完成的可交付物的数量
C、进度偏差或成本偏差
D、所消耗资源的数量

20、绩效度量指标包含（）。
A、缺陷来源　　B、可靠性　　C、识别的缺陷数量　　D、已解决的缺陷数量

21、针对成本基准，常见的度量指标不包括（）。
A、与计划成本相比的实际成本　　B、成本偏差　　C、成本绩效指数　　D、净现值

22、处理基于过程的复杂性的方法不包括（）。
A、迭代　　B、参与　　C、故障保护　　D、平衡

23、以下（）不是8大绩效域的内容？
A、团队绩效域　　B、干系人绩效域　　C、规划绩效域　　D、成本绩效域

24、以下（）不是干系人绩效域的目标？
A、与干系人建立高效的工作关系
B、干系人认同项目目标
C、支持项目的干系人提高了满意度，并从中收益
D、共享责任

25、以下（）不是团队绩效域的目标?
A、共享责任
B、建立高绩效团队
C、所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能
D、干系人认同项目目标

26、以下（）不是开发方法和生命周期绩效域的预期目标？
A、开发方法与项目可交付物相符合
B、将项目交付与干系人价值紧密关联

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、反对项目的干系人没有对项目产生负面影响
D、项目生命周期由促进交付节奏的项目阶段和产生项目交付物所需的开发方法组成

27、以下（）不是规划绩效域的预测目标。
A、项目以有条理、协调一致的方式推进
B、应用系统的方法交付项目成果
C、对演变情况进行详细说明
D、将项目交付与干系人价值紧密关联

28、以下（）不是项目工作绩效域的预测目标？
A、高效且有效的项目绩效
B、适合项目和环境的项目过程
C、对实物资源进行了有效管理
D、项目以有条理、协调一致的方式推进

29、以下（）不是交付绩效域的预期目标？
A、项目有助于实现业务目标和战略
B、项目实现了预期成果
C、有效处理了变更
D、在预定时间内实现了项目收益

30、以下（）不是度量绩效域的预期目标?
A、对项目状况充分理解
B、数据充分，可支持决策
C、及时采取行动，确保项目最佳绩效
D、在预定时间内实现了项目收益

31、以下（）不属于不确定绩效域的预测目标？
A、了解项目的运行环境，包括技术、社会、政治、市场和经济环境等
B、对项目状况充分理解
C、能够利用机会改进项目的绩效和成果
D、有效利用成本和进度储备，与项目目标保持一致等

32、关于冲突管理，错误的是（）。
A、尊重、开诚布公地进行沟通
B、聚焦于问题，对事不对人
C、聚焦于现在和当下，不需要关注远方和未来
D、共同寻找备选方案

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

33、关于情商的示意图中，空缺部位应该是（）。



A、自我意识　　B、自我管理　　C、社交意识　　D、社交技能

34、以下（）是良好的愿景的特征。
①用强有力的词句或简短的描述对项目做出概括描述
②描述可实现的最佳成果
③在项目团队成员脑海中形成一幅共同的、有凝聚力的画面
④激发人们对实现成果的热情
A、①②③　　B、①②③④　　C、②③④　　D、①②④

35、以下（）情形建议选用预测性生命周期模型。
①创新程度高或项目团队没有做过的项目
②需求易于定义的项目
③对于容易适应变更的可交付物
④高风险、前期需要大量规划的项目
A、①③④　　B、②④　　C、①②③④　　D、①②③

36、新药开发项目可能会进行（）：临床前建议、第1阶段临床试验结果、第2阶段临床试验结果、第3阶段临床试验结果、注册和上市。
A、一次性交付　　B、多次交付　　C、定期交付　　D、持续交付

37、影响估算的4个方面的因素不包括（）。
A、区间　　B、准确度　　C、精确度　　D、元认知

38、以下说法中，错误的是（）。

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com



A、项目开始时，与项目和产品范围、干系人、需求、风险和其他情况相关的信息较少，估算往往有较大的区间，随着项目进展，估算区间会逐步缩小。
B、准确度与区间相关，准确度越低，估算值的潜在区间就越大。项目开始时的估算准确度将低于项目进展中的估算准确度。
C、信心会随经验的增长而增加，处理以前的类似项目的经验有助于提高信心，面对新的和不断演变的技术，估算的信心会降低。
D、图中，准确度高但精确度低

39、假如与以前工作的点数相对比后，某项工作被分配了64个故事点，如果知道以前1个故事点的工期，于是可以得出新工作的工期，这是（）。
A、基于工作流的估算　　B、对不确定性的调整估算
C、确定性估算和概率估算　　D、绝对估算和相对估算

40、从计算机模拟中得出的概率估算有3个相关因素，这3个因素共同构成了一个可描述概率估算的完整的度量指标，其中不包含（）。
A、具有一定区间　　B、置信程度　　C、概率分布　　D、期望值

41、（）是指引导说出、产生或唤起干系人的需求，包括记录相关需求并征得干系人同意。
A、需求启发　　B、不断演变和发现的需求　　C、管理需求　　D、定义范围和管理变更

42、以下说法中，错误的是（）。
A、提前期越短，表明过程越有效，项目团队工作越高效。
B、周期时间越短，表明项目团队工作越高效，如果工作时间相对稳定，则可以据此更好地预测未来的工作进展速度。
C、可通过计算增值时间和非增值活动时间二者的比率进行衡量，这一比率越低，表明过程效率越高。
D、队列大小与事项进入队列的比率和队列中工作事项的完成率成正比

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

43、针对进度基准，常见的度量指标有（）。

①开始日期和完成日期 ②人力投入和持续时间 ③进度偏差(SV) ④进度绩效指数(SPI) ⑤净现值

A、①②③④⑤ B、①②③④ C、②③④⑤ D、①②③⑤

44、以下说法中，错误的是（）。

A、净推荐值用于度量干系人(通常是客户)愿意向他人推荐产品或服务的程度，它的测量范围为-100～100。

B、情绪图用于跟踪重要的干系人(包括项目团队成员)的情绪或反应。

C、离职率高可能表明士气低落。

D、情绪图具有客观性，还可以通过问卷调查来度量项目团队的士气

45、以下说法中，错误的是（）。

A、完工尚需绩效指数(TCPI)用于估算达到特定的管理目标所需的成本绩效，TCPI表示完成剩余工作所需的成本与剩余预算的比率

B、回归分析通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果建立数学或统计关系，可以用来推断未来的绩效

C、产量分析。这种分析方法可评估在固定时间范围内已完成事项的数量。采用适应型方法的项目使用产量度量指标来评估项目进展情况，并估算可能的完成日期。

D、完工偏差(VAC)用于预测预算赤字或盈余金额，它表示为完工预算(BAC)和完工尚需估算(ETC)之差

46、解决情景模糊性的方案不包括（）。

A、渐进明细 B、实验 C、原型法 D、解耦

47、开发方法的选择受多种因素的影响，其中不包含（）。

A、产品、服务或成果 B、项目 C、组织 D、价值

48、在规划绩效域中，（）可以用来检查“高效且有效的项目绩效”这个预期目标。

A、状态报告 B、过程的适应性 C、沟通有效性 D、资源利用率

49、在交付绩效域中，（）可以用来检查“项目实现了预期成果”这个预期目标。

A、目标一致性 B、项目完成度 C、项目收益 D、干系人满意度

马军老师，购课店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十五章 配置与变更管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第59题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在配置审计的工作中，（59）不属于功能配置审计验证的内容。

A、要交付的配置项是否存在

B、配置项的开发已圆满完成

C、配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

D、配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

2、2023年5月第60题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目变更管理的描述，不正确的是（60）。

A、项目范围(工作)和产品范围(工作)定义的过失或者疏忽不属于变更的原因

B、项目规模小、与其他项目的关联度越小时，变更的提出和处理过程可在操作上力求简便、高效

C、变更管理的实质是根据项目情况不断调整项目方向和资源配置，最大程度满足项目需求

D、在项目变更过程控制中，需要对进度变更控制、成本变更控制和合同变更控制等进行重点关注

3、2023年5月第61题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

文档的规范化管理主要体现在（61）方面。

①文档书写规范 ②文档质量级别 ③图表编号规则 ④文档目录编写标准⑤文档管理制度 ⑥文档安全标准

A、①②③④ B、②③④⑤ C、③④⑤⑥ D、①③④⑤

4、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题

版本发布前的准备工作包括：①进行相关的回退分析；②备份版本发布所涉及的存储过程、函数等其他数据的存储及回退管理；③备份配置数据，包括数据备份的方式；④备份在线生产平台接口、应用、工作流等版本；⑤启动回退机制的触发条件；⑥对变更回退的机制职责的说明，如通知相关部门，确定需要回退的关联系统和回退时间点等。正确的排序是（）。

A、①②③④⑤⑥ B、②③④⑤⑥① C、②③④①⑤⑥ D、①⑤⑥②③④

5、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下属于物理配置审计的是（）。

A、配置项的开发已圆满完成

B、配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

C、配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的等

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、要交付的配置项是否存在

6、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于文档的说法中，错误的是（）。

A、对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。

B、产品文档描述开发过程的产物，基本的产品文档包括：培训手册、参考于册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。

C、工作文档（3级文档）：适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。

D、文档书写规范是在管理信息系统的开发过程中用到很多的图表，对这些图表进行有规则地编号，可以方便图表的查找。

7、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于配置管理的说法中，错误的是（）。

A、所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向项目经理、CCB及相关人员开放。

B、可将配置项状态分为“草稿”“正式”和“修改”三种

C、由于我们不能保证新版本一定比旧版本“好”,所以不能抛弃旧版本。

D、配置库可以分开发库、受控库、产品库、备份库4种类型。

8、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下说法中，错误的是（）。

A、配置状态报告就是要在某个特定的时刻观察当时的配置状态，也就是要对静态的配置项取个瞬时的“照片”。

B、配置管理计划是CMO编写完成的。

C、配置项识别是识别所有信息系统组件的关键配置，以及各配置项间的关系和配置文档等结构识别。

D、配置项控制即对配置项和基线的变更控制，包括：标识和记录变更申请、分析和评价变更、批准或否决申请、实现、验证和发布已修改的配置项等任务。

9、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于文档的说法中，错误的是（）。

A、管理文档记录项目管理的信息

B、培训文档、使用手册属于产品文档

C、文档质量分为最低限度文档、内部文档、工作文档、正式文档

D、开发团队的职责定义、项目计划、项目阶段报告、配置管理计划属于开发文档。

10、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

以下（）不是变更管理负责人的职责。

A、实施变更　　B、负责变更管理过程的监控

C、管理变更的日程安排　　D、变更实施完成之后的回顾和关闭

11、2023年11月第4批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

功能配置审计内容包含（）。

①交付配置项是否存在

②配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征

③配置项中是否包含了所有必须的项目

④配置项的开发已圆满完成

⑤配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

A、②④⑤　　B、①③④　　C、①②④⑤　　D、②③④

12、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。不属于开发文档的是（）。

A、软件集成计划　　B、安全和测试信息　　C、配置管理计划　　D、可行性研究报告

13、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于配置审计的描述，不正确的是（）。

A、审计软件即使发现不一致的情况，也不允许自动更新配置库或配置管理数据库，必须由有关负责人调查后再进行更新

B、配置审计也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计

C、功能配置审计是审计配置项的完整性，物理配置审计是审计配置项的一致性

D、验证配置项的开发已圆满完成属于功能配置审计

14、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

监控变更管理过程是（）的职责。

A、质量经理　　B、变更经理　　C、变更请求者　　D、变更实施者

15、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目配置管理的描述不正确的是（）。

A、配置项负责人需要定期开展项目所有配置的审计

B、配置管理相关角色包括变更控制委员会，配置管理员，配置项负责人

C、配置经理负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动

D、建立和维护配置管理系统是配置管理员的职责之一。

16、2025年5月第1批

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

变更管理的实质是根据项目推进过程中越来越丰富的项目认知，不断调整项目努力方向和资源配置，最大程度地满足项目需求，一般来说，项目的变更控制主要关注（）的控制和（）的控制。

A、变更申请 变更过程　　B、变更工具 变更申请

C、变更申请 CCB　　D、变更工具 CCB

17、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。配置管理计划属于（），需求规格说明属于（）。

A、产品文档　管理文档　　B、管理文档　管理文档

C、产品文档　开发文档　　D、管理文档　开发文档

18、2025 年 5 月第 2 批

某公司承接一个轨道交通乘客播放系统项目，下表是项目中为部分配置项定义的标识符，表中关于标识符的定义存在（）错误。

序号	配置项	备注	标识符
1	服务器	既做为视频服务器，又作为邮件服务器	PIS-VIDE0-001 PIS-MAIL-001
2	网络交换机	网络交换机	PIS-SW-001
3	DeviceInfo V1.0.java	设备管理源代码 1.0 版	PIS-Dev-Code-001
4	DeviceInfo V1.1.java	设备管理源代码 1.1 版	PIS-Dev-Code-001
5	DeviceInfo V1.3.java	设备管理源代码 1.3 版	PIS-Dev-DB-001
6	DeviceInfo V1.2.java	设备管理源代码 1.2 版	PIS-User-DB-002

A、0　　B、3　　C、1　　D、2

19、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

下列关于配置管理的相关描述，不正确的是（ ）。

A、识别所有配置项都应按照相关规定统一编号

B、配置管理过程中，由 CCB 负责建立和管理基线

C、可以快速准确地查找到配置项的任何版本

D、配置项的状态分为草稿、正式和修改三种

20、2026 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

以下内容，不属于配置管理活动的是（ ）。

A、配置状态报告　　B、配置审计　　C、编制项目章程　　D、配置项控制

21、2026年5月第2批（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于项目文档管理的描述，不正确的是（）。

A、对信息系统开发项目而言，其文档一般分为开发文档、产品文档和管理文档

B、文档的借阅需要依据权限并做好记录

C、培训手册和用户指南属于开发文档

D、项目阶段报告和项目进度变更记录属于管理文档

22、2026年5月第2批

配置状态报告的主要内容不包括（ ）。

A、每个变更申请的状态和已批准的修改实施状态

B、每个基线的当前和过去版本，及各版本的比较

C、配置管理和变更管理之间的接口控制

D、受控配置项的每个后续版本和状态

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为2部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于基线的说法中，错误的是（）。

A、基线通常对应于项目过程中的里程碑,一个项目可以有多个基线，也可以只有一个基线。

B、基线中的配置项被“冻结”了，不能再被任何人随意修改。对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。

C、交付给用户使用的基线一般称为发行基线,内部过程使用的基线一般称为构造基线。

D、一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文档以及相应的可执行代码、构造文档和用户文档构成一条基线。产品的一个测试版本不可以看做一个基线。

2、以下说法中，错误的是（）。

A、受控库也称为主库，包含当前的基线以及对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。

B、配置管理负责人也称配置经理，负责管理和决策整个项目生命周期中的配置活动。

C、配置项负责人确保所负责的配置项的准确和真实：①记录所负责配置项的所有变更；②维护配置项之间的关系；③调查审计中发现的配置项差异，完成差异报告；④遵从配置管理过程；⑤参与配置管理过程评估。

D、配置项识别由配置项负责人负责实施。

91过软考教育学院 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

3、以下关于配置项控制的说法中，错误的是（）。

A、CCB 组织修改相关的配置项，并在相应的文档、程序代码或配置管理数据中记录变更信息。

B、CCB 把关于每个变更申请的批准、否决或推迟的决定通知受此处置意见影响的每个干系人。

C、程序员将欲修改的代码段从受控库中检出（Check out）,放入自己的开发库中进行修改。代码被检出后即被“锁定”,以保证同一段代码只能同时被一个程序员修改，如果甲正对其修改，乙就无法 Check out。

D、配置管理员将变更后的配置项纳入基线。配置管理员将变更内容和结果通知相关人员，并做好记录。

4、负责整个变更过程方案的结果是（）的职责。

A、变更管理负责人　　B、变更请求者　　C、变更实施者　　D、变更顾问委员会

5、变更初审的目的不包括（）。

A、对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的

B、格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分

C、在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识等。

D、评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距，并促使解决。

6、在信息系统的开发项目中需加以控制的配置项可以分为基线配置项和非基线配置项两类，基线配置项可能包括所有的设计文档和（）等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理，基本原则是：基线配置项向开发人员开放读取的权限；非基线配置项向项目经理、CCB 及相关人员开放。

A、源程序　　B、项目管理计划　　C、进度管理计划　　D、成本管理计划

7、配置管理回顾及改进活动不包括（）。

A、对本次配置管理回顾进行准备

B、召开配置管理回顾会议

C、根据会议结论，制订并提交服务改进计划

D、制定配置管理计划

8、以下关于文档的相关内容，错误的是（）。

A、对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。

B、管理文档描述开发过程本身，基本的开发文档包括：可行性研究报告和项目任务书、需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明。

C、最低限度文档（1 级文档）：适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。

D、文挡的管理制度须根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

9、配置项的状态可分为草稿、（62）、修改三种，下图体现了配置项的状态变化。

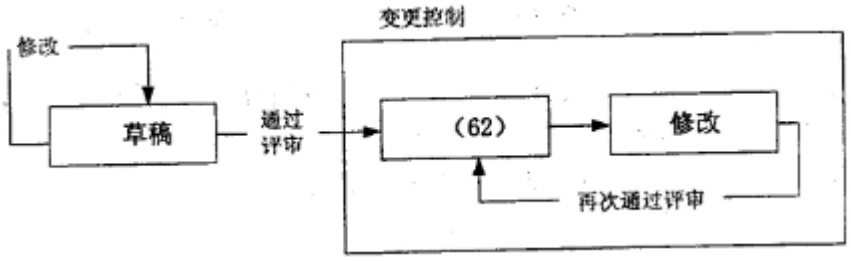

A、发布　　B、正式　　C、基线　　D、基准

10、配置控制与变更包含着几个重要的任务，变更申请，变更评估，通报评估结果，变更实施，变更验证，与确认，变更发布等。其中变更实施的主要负责人一般是（63）。

A、CCB　　B、项目经理　　C、配置管理员　　D、QA

11、关于配置管理，不正确的是（14）。

A、配置管理计划制定时需了解组织结构环境和组织单元之间的联系

B、配置标识包含识别配置项，并为其建立基线等内容

C、配置状态报告应着重反映当前基线配置项的状态

D、功能配置审计是审计配置项的完整性，验证所交付的配置项是否存在

12、关于配置库的描述，不正确的是（62）。

A、开发库用于保存开发人员当前正在开发的配置项

B、受控库包含当前的基线及对基线的变更

C、产品库包含已发布使用的各种基线

D、开发库是开发人员的个人工作区，由配置管理员控制

13、关于配置管理的描述，不正确的是（60）。

A、配置项通过评审后，其状态变为“正式”

B、配置项第一次成为“正式”文件时，版本号为0.1

C、所有配置项都应该按照相关规定统一编号

D、一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线

14、关于配置审计的描述，不正确的是（61）。

A、配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性

B、功能配置审计需验证配置项的开发已圆满完成

C、功能配置审计需验证要交付的配置项是否存在

D、物理配置审计需验证配置项是否包含所有必需的项目

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

15、关于配置基线的描述，不正确的是（59）。

A、基线是为了控制变化而引入的概念

B、基线中的配置项不能再被修改

C、基线通常对应于开发过程中的里程碑

D、新项目可以从基线上拉出独立分支，与原始项目的变更进行隔离

16、以下关于整体变更控制的叙述中，不正确的是（41）。

A、一个未知风险发生影响到项目进度时，需要进行整体变更分析

B、未经批准的变更请求不需要在变更日志中记录

C、变更请求可以口头提出，但要以书面形式记录

D、变更请求在CCB批准后，还可能需要得到客户或发起人的批准

17、以下关于项目整体变更控制过程的叙述中，不正确的是（41）。

A、实施整体变更控制过程的目的是为了降低项目风险

B、实施整体变更控制过程贯穿项目始终，并且应用于项目的各个阶段

C、变更控制委员会对整体变更控制过程负最终责任

D、会议是实施整体变更控制的工具与技术之一

18、以下（）不属于开发文档。

A、可行性研究报告和项目任务书　　B、需求规格说明

C、设计规格说明　　D、培训手册

19、回退步骤通常包括：①通知相关用户系统开始回退；②通知各关联系统进行版本回退；③回退存储过程等数据对象；④配置数据回退；⑤应用程序、接口程序、工作流等版本回退；⑥回退完成通知各周边关联系统；⑦回退后进行相关测试，保证回退系统能够正常运行；⑧通知用户回退完成等，正确的排序是（）。

A、①②③④⑤⑥⑦⑧　　B、③④⑤⑥⑦①②⑧

C、④⑤⑥⑦①②③⑧　　D、⑦①②③④⑤⑥⑧

20、以下（）不属于变更管理的原则。

A、基准管理　　B、变更控制流程化　　C、明确组织分工　　D、删除过程文档

21、以下关于变更的分类，错误的是（）。

A、根据变更性质可分为重要变更和一般变更，通过不同审批权限进行控制。

B、根据行业特点分类，如弱电工程行业的常见分类方法为产品(工作)范围变更、环境变更、设计变更、实施变更和技术标准变更。

C、根据变更的迫切性可分为紧急变更、非紧急变更

D、根据领域划分，变更可以分为范围变更、进度变更、成本变更等。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

22、配置状态报告的内容不包括（）。
A、每个受控配置项的标识和状态。
B、每个变更申请的状态和已批准的修改的实施状态。
C、每个基线的当前和过去版本的状态以及各版本的比较。
D、改进措施

23、应当进行配置审计的场景包括（）。
①实施新的配置库或配置管理数据库之后；②对信息系统实施重大变更前后；③在一项软件发布和安装被导入实际运作环境之前；④灾难恢复之后或事件恢复正常之后；⑤发现未经授权的配置项后；⑥任何其他必要的时候等。
A、①②③④⑤⑥　　B、①②③④　　C、②③④　　D、③④⑤⑥

24、以下说法中，错误的是（）。
A、按配置项的类型分类建库，这种模式适用于通用软件的开发组织。在这样的组织内，往往产品的继承性较强，工具比较统一，对并行开发有一定的需求。
B、按开发任务建立相应的配置库。这种模式适用于专业软件的开发组织。在这样的组织内，使用的开发工具种类繁多，开发模式以线性发展为主，所以没必要把配置项严格分类存储，人为增加目录的复杂性。对于研发性的软件组织来说，采用这种设置策略比较灵活。
C、审批配置库或配置管理数据库的结构性变更是配置管理负责人（配置经理）的职责
D、配置状态报告是配置管理负责人（配置经理）的职责。

25、以下说法中，错误的是（）。
A、变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。
B、变更的提出可以是各种形式，但在评估前应以书面形式提出。
C、配置基准调整后，需要确认资源配置是否及时到位，若涉及人员的调整，则需要更加关注。
D、更实施的过程监控，通常由 CMO 负责基准的监控。

26、2018 年 11 月第 11 题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*
关于软件配置管理的描述，不正确的是（11）。
A、配置控制委员会成员必须是专职人员
B、配置库包括动态库（开发库），受控库（主库）、静态库（产品库）
C、常用的配置管理工具有 SVN、GIT 等
D、配置项的状态分为草稿、正式和修改三种

27、2018 年 11 月第 52 题*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*
在项目配置项与基线的变更控制中，（52）是配置管理员的主要工作。
A、确定受变更影响的关联配置项和有关基线

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、将变更申请的决议通知受此变更影响的每个干系人

C、组织修改配置项，并在相应的文档或程序代码中记录变更信息

D、将变更后的配置项纳入基线，并将变更内容和结果通知相关人

28、2019年5月第12题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（12）验证一个配置项的实际工作性能是否符合他的需求规格说明。

A、功能配置审计　　B、物理配置审计　　C、设计评审　　D、代码审计

29、2019年5月第52题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于配置控制委员会（CCB）的说法，正确的是（52）。

A、CCB负责分配配置库的操作权限

B、CCB负责制定配置管理计划

C、CCB必须是常设机构

D、CCB可以是兼职人员

30、2019年11月第51题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

运维过程中发现待修改问题，程序员首先需将待修改代码从（）中取出放入（），其次检出代码段放入（），修改完成被检入受控库后，才能被其他程序员检出。

A、产品库 开发库 受控库　　B、受控库 开发库 产品库

C、受控库 产品库 开发库　　D、产品库 受控库　　开发库

31、2020年11月第51题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于配置管理的描述，正确的是（51）。

A、某个配置项的版本号为0.91，该配置项的状态为“正式”

B、配置项版本管理的目的是保留配置项的最新版本，删除所有旧的版本，以避免发生版本混淆

C、一个产品只能有一个基线，因此对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序

D、开发库中的信息可能被频繁修改，因此可以由开发人员自行控制

32、2020年11月第52题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

配置管理员的工作职责不包括（52）。

A、基线设立审批　　B、版本管理和配置控制

C、建立和维护配置库　　D、配置状态报告

33、2021年5月第51题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某软件产品集成测试阶段，发现问题需要对源代码进行修改。此时，程序员应将待修改的代码段从（51）检出，放入自己的（51）中进行修改，代码即被锁定。以保证同一段代码只能被一个程序员修改。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、产品库　开发库　　B、受控库　开发库

C、产品库　受控库　　D、受控库　产品库

34、2022 年 5 月第 49 题

在配置控制中，（49）不属于 CCB 评估变更申请的内容。

A、变更实施方案可行性　　B、变更工作量的合理性

C、变更对项目的影响　　D、记录变更信息的准确性

35、2022 年 11 月第 50 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

属于物理配置审计活动的是（50）。

A、验证配置项已达到配置标识中的性能和功能特征

B、验证配置项的开发已圆满完成

C、验证要交付的配置项是否存在

D、验证配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的

36、2022 年 11 月第 51 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在采用基于配置库的变更控制对软件代码进行修改过程中，请将下列活动按照时间先后顺序排列（51）。

①将新基线存入产品库

②从产品库中取出待修改代码

③程序员在开发库中修改代码

④将待修改代码从受控库中检出

A、①②③④　　B、②①④③　　C、②④③①　　D、③①②④

37、2017 年 11 月第 36 题

依据变更的重要性分类，变更一般分为（36），重要变更和一般变更。

A、紧急变更　　B、重大变更　　C、标准变更　　D、特殊变更

38、2018 年 5 月第 36 题

关于变更申请的描述，不正确的是（36）。

A、实施整体变更控制过程贯穿项目始终

B、变更请求可能包括纠正措施、预防措施和缺陷补救

C、变更请求必须由 CCB 来负责审查、评价、批准或否决

D、实施整体变更过程中涉及到的配置管理活动包括配置识别、配置状态、配置核实与审计

39、2018 年 5 月第 52 题

做好变更管理可以使项目的质量、进度、成本管理更加有效。关于变更工作程序的描述，不正确的是（52）。

马老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

①及时、正式的提出变更，且留下书面记录

②变更初审的常见方式为变更申请文档的格式校验

③变更方案论证首先是对变更请求是否可行实现进行论证

④审查过程中，客户根据变更申请及评估方案，决定是否变更项目基准

⑤发出变更通知并组织实施

⑥变更实施的过程监控，配置管理员负责基准的监控

⑦变更效果评估中的首要评估是项目的基准

⑧基准调整后，需要判断项目是否已纳入正轨

A、②③⑤　　B、②④⑥　　C、①②③④　　D、⑤⑥⑦⑧

40、2018 年 11 月第 53 题

A 公司承接了某海外信息系统集成项目，项目进行中，项目经理获悉因天气和汇率原因，预计设备到场的运费比预算高出 30%，接下来他应该首先（53）。

A、项目还没有结束，暂时不做处理

B、给主管领导打电话，汇报情况，寻求解决方案

C、填写项目变更申请，启动变更流程

D、寻找新的承运商，评估变更影响，提交合同变更申请

41、2019 年 5 月第 36 题

项目执行期间，客户提出增加一项功能，但它并没有包括在项目预算之内。不过对于一个几百万美元的项目而言，该项工作涉及的开发工作量较小。作为项目经理应该（36）。

A、拒绝用户请求，原因是该项工作不在项目预算之内

B、同意并免费完成这项工作，帮助维护客户关系

C、同意增加新功能，但是需要客户负担相应的费用

D、评估新功能对项目的影响，提交变更申请

42、2019 年 11 月第 28 题

某公司接了一个小型软件研发的项目，测试过程中，程序员发现某处算法需要进行更改，则（28）。

A、项目经理可决定是否进行变更　　B、研发人员可直接进行更改

C、项目不大，变更只需口头提出即可　　D、变更处理要力求简化，操作无需规范

43、2019 年 11 月第 52 题

关于变更管理的描述，不正确的是（52）。

A、每次变更通过评审后，都应重新确定基准

B、必须采用变更管理工具

C、明确变更工作中评估、评审、执行的职责

D、评估变更的可能影响

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

44、2019年11月第53题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于变更管理工作程序，正确的步骤是（53）。

①变更实施监控与效果评估

②发出变更通知并组织实施

③提出与接受变更申请

④对变更的初审和方案论证

⑤CCB审查

A、31245　　B、43521　　C、34521　　D、45321

45、2020年11月第53题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（53）的目的是确认变更的必要性，确保变更是有价值的。

A、提出变更申请　　B、变更效果评估　　C、变更初审　　D、变更实施

46、2021年5月第52题

变更管理是为了使得（52）与项目实际执行情况相一致，是应对项目变化的一套管理方法。

A、项目资源　　B、项目报告　　C、项目基准　　D、项目目标

47、2021年5月第53题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于变更管理工作程序描述，不正确的是（53）。

A、项目的干系人都可以提出变更申请

B、CCB是执行机构，负责提出变更方案

C、变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准监控

D、涉及项目目标及交付成果的变更，客户意见应放在核心位置

48、2021年11月第52题

项目变更按照变更性质划分为重大变更、重要变更和一般变更，通过不同的（52）来实现。

A、变更处理流程　　B、变更内容　　C、审批权限控制　　D、变更原因处理

49、2021年11月第53题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

变更管理组织机构的工作程序按时间先后顺序，排列正确的是（53）。

①变更效果评估　　②项目工程师提出变更申请

③项目经理审批变更申请　④发出变更通知并组织实施

⑤变更申请文档审核流转　⑥变更方案论证

⑦项目管理委员会审查　　⑧项目经理和监理单位监控实施

A、②⑤③④⑥⑧⑦①　　B、②⑤④③⑦①⑥⑧

C、②③⑤⑦⑥④①⑧　　D、②③⑤⑥⑦④⑧①

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

50、2022 年 5 月第 51 题

关于变更工作程序的描述，正确的是（51）。

A、项目中变更申请应由项目团队成员提出

B、监理单位可监控主要变更成果和变更进度里程碑

C、涉及项目目标和交付成果的变更，应以专家意见为准

D、在变更确认前应将项目实施基准调整情况进行公示

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十六章 高级项目管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第62题

项目集效益管理的主要活动包括（62）。

①效益识别 ②效益分析和规划 ③效益交付 ④效益移交 ⑤效益维持 ⑥效益改进

A、①②③④⑥ B、②③④⑤⑥ C、①②④⑤⑥ D、①②③④⑤

2、2023年5月第63题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在项目组合管理生命周期中，（63）属于启动阶段的活动。

A、确定项目组合组件范围

B、项目组合组件的优先排列顺序

C、为项目组合及其组件定义长期路线图

D、治理机构、发起人和干系人责任的确认

3、2023年5月第64题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于组织级项目管理(OPM)框架的描述，正确的是（64）。

A、OPM框架的关键要素包括OPM方法论、人才管理、知识管理三个方面

B、组织通过建立和整合被认为最有可能提供预期收益的项目组合、项目集和项目方法论的要素来开发和改进OPM方法论

C、人才管理侧重于实现绩效改进、创新、经验教训分享、记录最佳实践、流程整合和组织持续改进的组织目标

D、知识管理应与项目组合经理、项目集经理和项目经理的职业化发展保持一致

4、2023年5月第65题

关于量化项目管理的描述，不正确的是（65）。

A、六西格玛和CMMI模型高成熟度均提供了量化管理的方法和实践

B、组织建立的过程性能基线是通过历史数据刻画组织当前的过程能力，为管理决策提供数据化支持

C、识别模型因子时，如两个因子相关性系数为0.8，代表可同时使用这两个因子建立模型

D、项目级量化目标的定义通常需参考组织级的目标要求、客户或服务对象的管理要求，还需结合项目团队自身过程能力数据。

5、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的OPM流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。OPM流程在组织上是标准化的、可测量的、可控制的，并可由组织进行分析，以监控OPM流程绩效是（）的特点。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、级别 1，初始或临时的 OPM　　B、级别 2，项目层级采用 OPM

C、级别 3，组织定义的 OPM　　D、级别 4，量化管理的 OPM

6、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不属于项目集交付阶段的内容。

A、组件授权与规划　　B、组件监督与整合　　C、组件移交与收尾　　D、组件实施

7、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于项目组合管理生命周期的说法中，错误的是（）。

A、项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化 4 个阶段组成

B、规划阶段制订并评审项目组合管理计划并就主要内容与干系人达成共识。

C、优化阶段通过其各个组件和运营来实施的，包括对项目组合的执行情况，以及各组件的绩效标准进行评审和汇报；对提出的变更基于持续的组织需要来进行评审，组织环境的变更可能迫使组件优先顺序要重新排列或者引入新组件

D、启动阶段的活动包含验证业务和运营战略，识别项目组合组件，为项目组合及其组件定义长期路线图，包括财务目标、绩效标准、沟通、治理、干系人的定义与角色，以及持续管理计划。

8、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）提供治理过程与活动来支持对项目组合及其组件的决策与导向。

A、决策制定职能　　B、监管职能　　C、控制职能　　D、整合职能

9、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

关于项目集生命周期管理的说法中，错误的是（）。

A、为成功向组织交付效益，项目集要分为 3 个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集交付阶段和项目集收尾阶段

B、项目集定义阶段。为达成预期成果构建和批准项目集，制定项目集线路图，制定项目评估和项目集章程。上述内容批准后，则要制订项目集管理计划。

C、项目集收尾阶段为产生项目集管理计划各组件的预期成果而进行的项目集活动。

D、项目集交付阶段包括①组件授权与规划；②组件监督与整合；③组件移交与收尾。

10、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

根据 Person 相关理论，r=0.7,则说明识别因子与目标结果的相关性是（）。

A、强相关　　B、中度相关　　C、弱相关　　D、基本不相关

11、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于 OPM 的说法中，错误的是（）。

A、OPM 方法论都不需要裁剪

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、为了确保与组织背景和环境保持一致，更适用于不同类型项目需求，应允许项目组合、项目集和项目在各自的边界范围内，以最匹配项目特定需求的方式应用 OPM 方法论。

C、可以对 OPM 方法进行裁剪，确定如何应用 OPM 方法，应在项目的规划阶段进行，过程中可以依据变化进行变更调整。

D、裁剪在 OPM 方法论初始建立过程、维护过程和增强过程都可以进行。

12、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

下面（）不属于项目组合风险管理要素中的风险应对的内容？

A、风险趋势　　B、状态与趋势　　C、平衡项目组合　　D、管理投资选择

13、2023 年 11 月第 4 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于项目组合规划阶段的活动。

A、识别项目组合组件

B、识别项目组合及组件间的依赖关条

C、确定衡量成功的项目组合标准

D、项目组合组件的优先排列顺序

14、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

项目组合生命周期由（）4 个阶段组成。

A、规划、执行、监控、收尾

B、规划、执行、监控、改进

C、启动、规划、执行、收尾

D、启动、规划、执行、优化

15、2024 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

OPM 框架的关键要素包括（）。

A、OPM 战略、OPM 方法论、知识管理和人才管理

B、OPM 战略、OPM 方法论、风险管理和人才管理

C、OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和人才管理

D、OPM 治理、OPM 方法论、知识管理和风险管理

16、2024 年 5 月第 1 批

CMMI 的 4 大能力域类别中,（）用于生产和提供优秀解决方案。

A、提高（proving）　　B、管理(Managing)　　C、实现(Enabling)　　D、行动(Doing)

17、2024 年 5 月第 2 批

为实现高效的项目组合价值，需要执行的关键活动不包括（）。

A、测量和报告价值　　B、最大化价值　　C、协商期望的价值　　D、输出正确价值观

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

18、2024 年 5 月第 2 批

项目集发起人的主要职责不包括（）。

A、消除项目集交付的困难和障碍

B、为项目组合经理进行交互，确保提供适当的资源和优先级

C、确保项目集目标与战略愿景保持一致

D、提供资金

19、2024 年 5 月第 2 批

组织开展量化管理工作的前提在于该组织已经（）。

A、定义了组织量化过程性能目标并识别了关键过程

B、建立了组织度量体系及数据收集体系

C、建立了过程性能基线及过程性能模型

D、定义了产品或项目管理的组织级标准目标

20、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

OPM 成熟度模型的说法，错误的是（）。

A、级别 1 是初始或临时的 OPM　　B、级别 3 是组织定义的 OPM

C、级别 2 是项目层级采用的 OPM　　D、级别 4 是持续优化的 OPM

21、2025 年 5 月第 1 批

量化管理时，关于建立过程性能模型的相关描述，不正确的是（）。

A、量化管理使用到的技术通常包括过程性能基线、过程性能模型、控制图、变异分析、回归分析、置信区间或预测区间、敏感度分析、蒙特卡洛模拟和假设检验等

B、对于相关性系数达到强相关(0.8≤|r|≤1)的因子，可纳入建模因子

C、过程性能基线代表组织在一定条件内的能力范围，组织在建立过程性能基线的过程中，需注明该过程性能的前提条件范围

D、当通过多元回归方式建模后，每个因子的值 P 小于 0.05 时，需要另根据回归平方和 R2 作为判定系数

22、2025 年 5 月第 2 批

关于项目组合管理的描述，正确的是（）。

A、项目组合价值管理的主要目标是最大化每个项目的投资回报

B、自认为会受到项目组合的成果影响的个人也可当作项目组合干系人

C、实现价值是指项目组合中各组件所产生的产物达成的绩效

D、项目组合组件层级的干系人主要解决交付策略和分配资源

23、2026 年 5 月第 1 批

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

量化管理使用到的技术包括（ ）。

A、过程性能基线、变异分析、置信区间、假设检验

B、专家判断、备选方案分析、会议

C、头脑风暴、德尔菲、访谈

D、文件分析、SWOT、提示清单

24、2026 年 5 月第 2 批

（）不属于项目组合风险管理的活动。

A、测量项目组合投资回报的最大化　　B、判断风险优先级和相互依赖关系

C、结合风险评估结果管理投资选择　　D、评估项目组合置信水平或可信水平

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于项目集管理的说法中，错误的是（）。

A、项目集发起人和收益人是负责承诺将组织的资源应用于项目集，并致力于使项目集取得成功的人。

B、项目集指导委员会应使项目集得到适当治理，由该委员会负责定义和实施适当的治理实践。项目集指导委员会通常由个人或集体认可的、具备组织洞察力和决策权的高层管理者组成，这对于制定项目集目标、战略和运营计划至关重要。

C、项目集经理是由执行组织授权，组建并带领团队实现项目集目标的人员。

D、为成功向组织交付效益，项目集要分为 3 个主要阶段来实施，包括项目集定义阶段、项目集实施阶段和项目集收尾阶段。

2、以下关于项目组合管理的说法中，错误的是（）。

A、项目组合生命周期由启动、规划、执行与优化 4 个阶段组成

B、项目组合治理机构。由一个或多个具有必要权限、知识和经验的人员组成，用来指导和监督项目组合管理活动，评估项目组合绩效，并且对项目组合的投资和优先级做出决策，确保项目组合管理过程可控。适当的治理是履行职责、优化投资、向决策者升级问题和改善沟通的基础和关键。

C、项目组合分析师。负责识别、分析和追踪项目组合组件间的依赖关系是否被解决和管理，对项目组合管理过程的差距，推荐改进方案并帮助实施。项目组合分析师可以与其他角色相结合并进行相应的裁减，以满足组织需求。

D、项目组合与整体战略不匹配，其承载的项目集、项目增加价值会很大

3、项目管理是主动的，组织项目绩效是可预测的。项目团队遵循组织建立的 OPM 流程，这些流程根据项目的复杂性和从业者的能力加以裁剪。是（）级别的特征。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

4、PRINCE2结构包括原则、主题、流程和（）。
A、项目环境　　B、项目过程　　C、项目阶段　　D、项目因素

5、建立组织级的量化管理体系的内容主要包括：定义组织量化过程性能目标、识别关键过程、（）、建立过程性能基线和建立过程性能模型。
A、建立度量体系及数据收集　　B、度量指标确定　　C、计划制定　　D、数据分析

6、项目集经理的典型职责不包括下面哪项（ ）。
A、在项目集管理绩效域内开展工作；
B、项目组合经理进行交互，以确保提供适当的资源和优先级；
C、定义要传达给干系人的关键信息，并确保其保持一致、透明；
D、为项目集团队提供有效和适当的管理决策。

7、下列说法错误的是（ ）。
A、项目组合生命周期由启动、规划、执行3个阶段组成。
B、项目集战略一致性是识别项目集输出和成果，以便与组织的目标和目的保持一致的绩效域；
C、项目组合产能主要涉及4个类别：人力资本、财务成本、资产、智力资本；
D、OPM框架的关键要素包括：OPM治理、OPM方法论、知识管理和人才管理。

8、六西格玛认为业务流程改进遵循5步循环改进法，即DMAIC模式，分别包含（ ）。
A、规划、测量、分析、改进、确认
B、定义、测量、分析、改进、确认
C、定义、度量、记录、改进、评估
D、定义、度量、分析、改进、控制

9、以下（）不属于项目集发起人和收益人的职责。
A、为项目集提供资金，确保项目集目标与战略愿景保持一致
B、使效益实现交付
C、消除项目集管理与交付的困难和障碍
D、为项目集提供治理支持，包括监督、控制、整合和决策职能

10、以下（）不属于项目集指导委员会的职责。
A、批准项目集收尾和终止
B、审查预期效益和效益交付
C、解决并补救上报的项目集问题和风险
D、在项目集管理绩效域内开展工作

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

11、项目集干系人参与是识别和分析干系人需求、管理期望和沟通，以促进干系人认同和支持的绩效域。主要活动包括( )。
①项目集干系人识别②项目集干系人分析③项目集干系人参与规划④项目集干系人参与⑤项目集干系人沟通。
A、①②　　B、①②③　　C、②③　　D、①②③④⑤

12、通过最大化可用的条件、制约因素和资源，使项目组合尽可能高效的过程是组合管理的（）阶段。
A、启动阶段　　B、规划阶段　　C、执行阶段　　D、优化阶段

13、（）包括一组过程与活动，提供整体的治理结构，为项目组合及其组件授予管理权力。
A、决策制定职能　　B、监管职能　　C、控制职能　　D、整合职能

14、以下关于统计过程控制（SPC）的说法中，错误的是（）。
A、统计过程控制（SPC）是指应用统计技术对工作过程中的各个阶段进行分析、监控和评估，建立并保持工作过程处于可接受的并且稳定的水平，从而确保产品与服务符合规格要求的一种管理技术。
B、统计过程控制是一种预防性方法，强调全员参与。
C、统计过程控制理论认为，过程的能力是存在波动性的：一种波动是正常的波动，任何组织或个人执行过程的能力都会有一定的波动性，这是正常的。另一种波动是异常的波动，可能有特殊成因造成了能力的异常波动，这是异常情况，需要识别并管理。
D、统计过程控制强调整个过程，重点在于结果。

15、OPM方法论是针对在特定组织内从事项目管理人员使用的实践、（）、程序和规则所构成的体系。
A、技术　　B、管理　　C、信息　　D、数据

16、下面（）不是项目集收尾阶段的内容？
A、项目集移交和收尾　　B、提前终止
C、将工作移交给另一个项目集　　D、组件移交与收尾

17、2018年5月第60题

（60）是项目集的决策机构，负责为项目集的管理方式提供支持。
A、项目集指导委员会　　B、项目治理委员会
C、项目集变更控制委员会　　D、项目管理办公室

18、2021年5月第59题

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目集管理过程中，项目集经理通过对各组件进行规划和授权、监管和整合以及（59）的方式实现组件层面各子阶段的执行和管理。

A、移交和收尾　　B、构建和治理　　C、准备和计划　　D、转移和控制

19、2017 年 11 月第 51、52 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集、项目三者都要与（51）保持一致，其中，（52）通过设定优先级并提供必要的资源的方式进行项目选择，保证组织内所有项目都经过风险和收益分析。

A、组织管理　　B、组织战略　　C、组织文化　　D、组织投资

A、项目组合　　B、项目集　　C、项目　　D、大项目

20、2019 年 11 月第 57 题

关于项目组合管理的描述，不正确的是（57）。

A、项目组合管理绩效必须结合战略目标进行测量

B、项目组合管理使组织在高速发展和快速变化的环境中维持市场竞争力

C、项目组合管理统筹财务，人力，设备等资源

D、项目集是组织战略计划和项目组合之间联系的桥梁。

21、2020 年 11 月第 60 题

关于项目组合和项目集的描述，不正确的是（60）。

A、项目组合和项目集中都可能包含日常运作业务

B、项目集是项目组合的一部分

C、项目组合中的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外

D、项目组合中的项目集和项目应有依赖关系

22、2022 年 11 月第 60 题

关于项目组合管理的描述，不正确的是（60）。

A、项目组合管理包含运营性质的工作

B、项目组合管理通过管理项目间的依赖关系支持组织战略

C、项目组合管理目标是确保项目组合与组织的目标保持一致

D、项目组合管理是为实现战略目标对多个项目组合进行的集中管理

23、2018 年 5 月第 8 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

办公软件开发公司 A 非常重视软件过程管理，按照 CMMI(能力成熟度模型)逐步进行过程改进，刚刚实现了组织级过程性能、定量项目管理，按照 CMMI（能力成熟度模型），A 公司达到了（8）级别。

A、CMMI2　　B、CMMI3　　C、CMMI4　　D、CMMI5

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

24、2022 年 5 月第 11 题

企业能够将软件管理和工程两方面的过程文档化、标准化，并综合成该组织的标准软件过程。所有项目均使用经批准、剪裁的标准软件过程来开发和维护软件，软件产品的生产在整个软件过程是可见的。由此判断，该企业已经达到了 CMMI（11）级。

A、2　　B、3　　C、4　　D、5

25、2019 年 11 月第 62 题

（62）不可用于量化的项目管理。

A、PERT　　B、网络图　　C、专家判断　　D、挣值分析

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十七章 项目管理科学基础

本章历年考题：

1、2010 年 11 月第 69 题

甲乙丙为三个独立项目，NPV 甲=12 万元，NPV 乙=15 万元，NPV 丙=18 万元，三个项目的初始投资额相同，并且回收期相同，则应优先选择（69）项目进行投资。

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、甲或乙

2、2015 年 11 月第 56 题

某一项目，初始投资为 2000 万元，该项目从投产年开始每年的净收益如下表所示，则该项目的静态投资回收期约为（56）年。

2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
投入 2000 万元	净收益 600 万元	净收益 700 万元	净收益 800 万元	净收益 500 万元

A、2.9　　B、3.9　　C、2.7　　D、3.8

3、2016 年 5 月第 68 题

某项目的利润预期（单元：元）如下表所示，贴现率为 10%，则第三年结束时利润总额的净现值约为（68）元。

	第一年	第二年	第三年
利润预期	11000	12100	13300

A、30000　　B、33000　　C、36000　　D、40444

4、2017 年 11 月第 66、67 题

某企业生产甲、乙两种产品，这两种产品都需要 A、B 两种原材料。生产每一个甲产品需要 3 万个 A 和 6 万个 B，销售收入为 2 万元；生产每一个乙产品需要 5 万个 A 和 2 万个 B，销售收入为 1 万元，该企业每天可用的 A 数量为 15 万个，可用的 B 数量为 24 万个，为了获得最大的销售收入，该企业每天生产的甲产品的数量应为（66）万个，此时该企业每天的销售收入为（67）万元　。

（66）A、2.75　　B、3.75　　C、4.25　　D、5

（67）A、5.8　　B、6.25　　C、8.25　　D、10

5、2018 年 5 月第 57 题

小李作为项目经理需要从以下四个项目方案中选择项目，已知项目周期均为 2 年且期初投资额都是 30,000 元，折现率均为 10%。项目情况如下:

方案 A:第一年现金流为 14,000 元，第二年现金流 19,000 元

方案 B:第一年现金流为 23,000 元，第二年现金流 20,000 元

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

方案 C:第一年现金流为 18,000 元，第二年现金流 24,000 元

方案 D:第一年现金流为 21,000 元，第二年现金流 22,000 元

则小李应该优先选择（57）。

A、方案 A　　B、方案 B　　C、方案 C　　D、方案 D

6、2018 年 5 月第 70 题

某拟建项目财务净现金流量如下表所示，该项目的静态投资回收期是（70）。

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9
现金流量（万元）	-1200	-1000	200	300	500	500	500	500	500

A、5.4　　B、5.6　　C、7.4　　D、7.6

7、2018 年 11 月第 67 题

工程师小张需要完成图中所有区域的巡检工作，图中圆圈代表巡检地点，两点之间的连接线为可行的交通路径，连接线上所标识的数字为两点之间所需的交通费用（单位：元），从地点 1 开始完成巡检（不需要按数字顺序也无需返回起点）所需的最少交通费为（67）元。

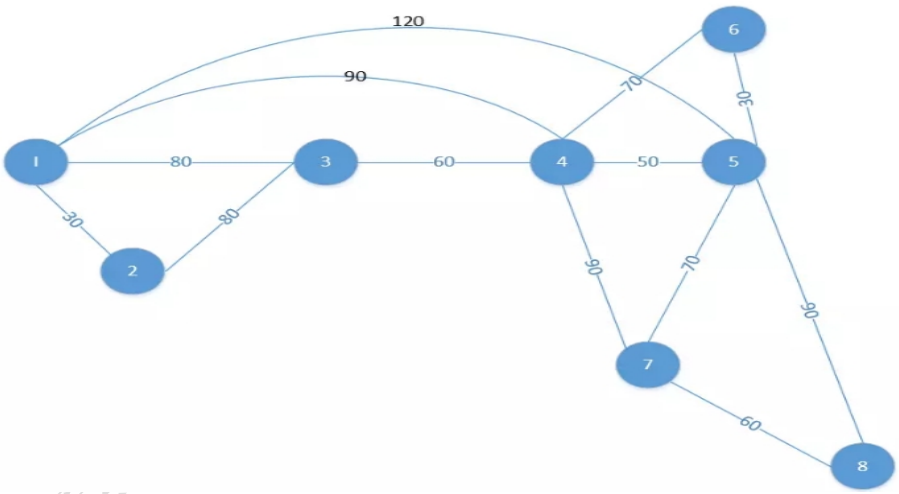

A、390　　B、450　　C、400　　D、470

8、2018 年 11 月第 69 题

某化工企业接到一份 10 吨新材料研发的订单 100 万元，该材料由甲、乙、丙三种原材料构成，其中所含金属 A 不少于 4400 克，金属 B 不少于 4800 克，金属 A 和金属 B 在原材料中的含量及单价如下表所示。经过不断测算和实验，为了获得满足客户要求的这种新材料，该企业最多可获得的利润为（69）万元。

	甲	乙	丙

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

金属 A（克/吨）	400	600	400
金属 B（克/吨）	800	200	400
单位（万元/吨）	7	6	5

A、58　　B、64　　C、42　　D、56

9、2019 年 5 月第 66、67 题

某炼油厂根据计划每季度供应合同单位汽油和煤油各 16 吨。该厂从甲乙两处场地运回原油提炼。一直两处原油成分如下表所示，且甲乙两地采购成本分别为 200 元/吨和 300 元/吨。对于该炼油厂，需要从乙采购（66）吨方能使此次采购的成本最低，最低的采购成本是（67）元。

原油成分	甲	乙
汽油	20%	40%
煤油	50%	20%
其他	30%	40%

（66）A、10　　B、20　　C、30　　D、40

（67）A、12000　　B、13000　　C、14000　　D、15000

10、2019 年 5 月第 68 题

有 8 口海上油井，相互间距离如下表所示（单位：海里）。其中 1 号井离海岸最短长度，为 5 海里，先要从海岸经 1 号井铺设油管将各井连接起来，则铺设输油管道的最短长度（68）海里。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1.3	2.1	0.9	0.7	1.8	2.0	1.5
2		0	0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3			0	2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4				0	0.7	1.6	1.5	0.9
5					0	0.9	1.1	0.8
6						0	0.6	1.0
7							0	0.5
8								0

A、9.1　　B、9.2　　C、10.1　　D、10.2

11、2019 年 5 月第 69、70 题

项目经理制定了项目资产负债表（单位：元），如下表所示。该项目的静态投资回收期为（69）年，动态投资回收期为（70）年（保留一位小数位）。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
折现因子		0.91	0.83	0.75	0.68	0.62

（69）A、2　　B、2.4　　C、2.8　　D、3.

（70）A、3　　B、3.4　　C、3.5　　D、3.6

12、2019 年 11 月第 66、67 题

某电池厂生产甲、乙两种型号产品，（单位：万），这两种产品都需要设备和 A、B 两种原材料，利润与资源限制条件如表所示，为了获得最大利润，该电池厂每天生产的甲产品的数量应为（66）万个，此时该企业每天的利润为（67）万元。

	甲	乙	资源限制条件
设备（台时）	2	3	20
原材料 A（千克）	3	1	15
原材料 B（千克）	0	2	12
利润（万元）	2	4	

（66）A、1　　B、2　　C、3　　D、4

（67）A、20　　B、22　　C、24　　D、26

13、2019 年 11 月第 68 题

下图为某地区的通信线路图，图中节点为 8 个城市，节点间标识的数字为城市间拟铺设通信线路的长度，为了保持 8 个城市通讯连接，则至少铺设（68）千米的线路。

A、1000　　B、1100　　C、1200　　D、1300

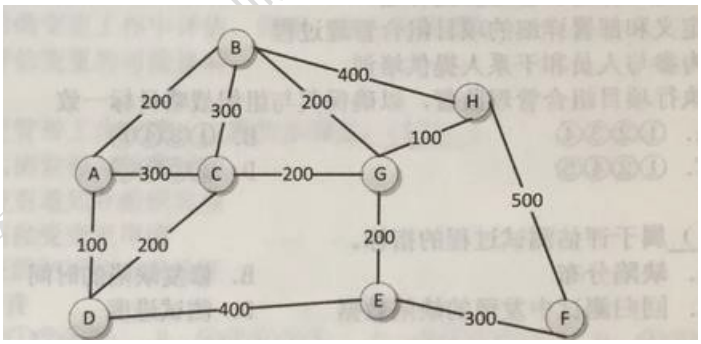

14、2020 年 11 月第 67、68 题

某乳制品加工厂用纯牛奶和酸牛奶两种生产原料，加工生产甲、乙两种乳制品。该厂加工每单位乳制品消耗原料数、现有原料数、每单位乳制品的利润如下表所示。则该公司的最大利润为（67）万元。公司获得最大利润时，生产甲的数量是（68）吨。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

		甲	乙	现有原料（吨）
原料（吨）	纯牛奶	1	2	86
	酸牛奶	5	3	150
利润（万元）		3	4	

（67）A、140　　B、144　　C、175　　D、178

（68）A、5　　B、6　　C、40　　D、50

15、2020 年 11 月第 69 题

有 A、B、C、D 四个临省，同时向甲、乙、丙、丁四个城市运送援助物资，假设规定一个省对口援助一个城市。四省到各城市的运输时间如下表所示。请给出一个合理的方案，使得物资运输总时间最短，则最短物资运输时间为（69）小时。

省　城市	甲	乙	丙	丁
A	17	20	23	26
B	21	25	24	20
C	28	19	18	21
D	21	21	19	19

A、74　　B、75　　C、76　　D、77

16、2021 年 5 月第 67、68 题

某公司计划将 500 万元研发经费投入 3 个研究方向,各方向投入金额和未来能获得的利润如表所示。为获得最大利润，公司在方向 A 应投入（67）万元，B 应投入（68）万元。

投资额（万元)	方向 A	方向 B	方向 C
0	0	0	0
100	300	500	400
200	600	800	700
300	1000	900	900
400	1300	1200	1100
500	1800	1600	1100

A、100　　B、200　　C、300　　D、400

A、100　　B、200　　C、300　　D、400

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

17、2021 年 5 月第 69 题

某公司投资项目，各年成本和收入如下表所示，折现率为 10%.该项目投资回收期为（69）。

成本	初期投资	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
成本（万元）	1500	500	500	500	500
收入（万元）	0	1000	1200	1400	1600

A、2.3　　B、2.7　　C、4.2　　D、5.1

18、2021 年 11 月第 66、67 题

某项目 2016 年投资额 12 万元，2018 年开始取得项目的净收益（产品一原料辅料及公用工程）6 万元/年，2018--2021 年每年还会产生其他成本（包括人员工资、管理成本，制造成本等）1.1 万元/年，增值税 0.35 万元/年，营业税金及附加 0.05 万元/年。则该项目的静态投资回收期为（66）年，截止到 2021 年底该项目的投资收益率是（67）。

A、2.0　　B、2.67　　C、3.25　　D、3.67

A、0.25　　B、0.33　　C、0.35　　D、0.6

19、2021 年 11 月第 68、69 题

已知某公司生产 AB 两种产品，其中生产 1 件 A 产品需要 1 个单位的甲资源，3 个单位的丙资源，生产 1 件 B 产品需要 2 个单位的乙资源和 2 个单位的丙资源，已知现有甲乙丙三种资源 4 个单位、12 个单位和 18 个单位，通过市场预测、可知 A 产品的单位市场利润为 2 元，B 产品的单位市场利润为 5 元，该公司获得最大的市场利润应生产 A 产品（68）件，此时（69）资源仍有剩余。

A、0　　B、2　　C、4　　D、6

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、甲及丙

20、2021 年 11 月第 70 题

分配甲、乙、丙、丁四个人去完成五项任务。每人完成各项任务时间如表所示,由于任务多于人数,故规定其中有一个人可兼完成两项任务,其余三人每人完成一项,为了花费时间最少,（70）应该完成两项任务。

任务	任务 1	任务 2	任务 3	任务 4	任务 5
甲	25	25	31	43	33
乙	38	33	25	20	28
丙	41	27	32	45	32
丁	23	37	35	23	40

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、丁

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

21、2022 年 5 月第 66、67 题

某炼油厂每季度需供应合同单位汽油 15 吨，煤油 12 吨，重油 12 吨，该厂从甲乙两处运回原油提炼，已知两处炼油成分如表所示，从甲处采购原油价格为 2000 元/吨，乙处为 2900 元/吨，为了使成本最低，炼油厂应从甲处购（66）吨，乙处采购（67）吨。

原油成分	甲	乙
汽油	0.15	0.50
煤油	0.20	0.30
重油	0.50	0.15
其他	0.15	0.5

（66）A、15　　B、20　　C、25　　D、30

（67）A、20　　B、25　　C、30　　D、35

22、2022 年 5 月第 68 题

某公司有东部、中部、西部三个生产基地，生产的产品需要运送带甲、乙、丙、丁四个市场，从生产基地到各个市场的单位运价及产量和需求量如表所示，完输任务所需的最小运费为（68）。

	甲	乙	丙	丁	产量
东部	4	12	4	11	16
中部	2	10	3	9	10
西部	8	5	11	6	22
需求量	8	14	12	14	

A、242　　B、244　　C、289　　D、302

23、2022 年 5 月第 69 题

下图是某地的街区网络图（单位：公里），疫情防控期间，一辆消毒车从疾控中心出发，需要消杀所有的街道并返回疾控中心，消杀车完成消杀工作至少行驶（69）公里。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

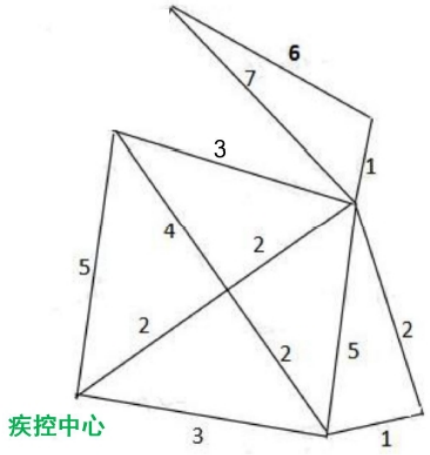

A、43　　B、45　　C、46　　D、48

24、2022 年 5 月第 70 题

某公司投资一个使用寿命为 5 年的项目，第一年年初投入 1000 万元，从第 1 年到第 5 年每年年末都有净现金流量 300 万元。则项目的静态投资回收期为（70）年。

A、2　　B、2.5　　C、3　　D、3.3

25、2022 年 11 月第 66、67 题

某公司承接了一项业务，需研发 2 个新产品 A，4 个新产品 B，需要市场上两种平台资源甲和乙。甲售价 300 万元/台，可支持研发 1 个新产品 A 和 2 个新产品 B。乙售价 200 万元/台，可支持研发 2 个新产品 A 和一个新产品 B。该公司应购买甲、乙各（66）台，可完成业务且花费的成本最低，最低成本为（67）万元。

66、A、2，1　　B、1，2　　C、0，2　　D、2，0

67、A、800　　B、700　　C、600　　D、400

26、2022 年 11 月第 69 题

某公司为经营业务的需要，决定要在现有生产条件不变的情况下，生产一种产品，现可供生产的产品有甲、乙、丙、丁四种类型。由于缺少相关资料背景，对新产品的市场需求只能估计为大、中、小三种状态，在不同的市场需求条件下，新产品的收益值如表所示。如果决策者采用后悔值方法进行决策，该公司生产（69）。

产品/需求	需求量大	需求量中	需求量小
甲	800	320	-250
乙	600	300	-200
丙	300	150	50
丁	400	250	100

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、丁

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

27、2022 年 11 月第 70 题

某项目现金流量如表所示，则项目的静态投资回收期为（70）年。

年末	0	1	2	3	4	5	6
现金流出	900						
现金流入		200	300	400	400	400	400

A、2　　B、2.5　　C、3　　D、3.5

28、2023 年 5 月第 66 题

某项目现金流量如表所示，则项目的动态投资回收期为（66）（折现率按 0.1 计算）。

年序	0	1	2	3	4	5
现金流出	200					
现金流入		60	60	60	60	60

A、4.26　　B、4.37　　C、4.43　　D、5.03

29、2023 年 5 月第 67、68 题

一个项目需要 A 和 B 两种资源，每种资源包含材料 1、材料 2。对于项目来说，这两种材料每日需要量如表所示。请问项目每日使用资源 A 的量为（67），使用资源 B 的量为（68），可使得在满足要求的情况下总费用最少。

	资源 A	资源 B	每日最少需要量（个）
材料 1	10	4	20
材料 2	5	5	15
价格（万元）	6	3	

（67）A、4/3　　B、5/3　　C、2　　D、7/3

（68）A、4/3　　B、5/3　　C、2　　D、7/3

30、2023 年 5 月第 69、70 题

图中 V1 是物流集散地，其他点均为不同的二级转运站，弧上的数字代表两点间的距离（单位公里），则 V1 到二级运转站（69）最远，其最短路径为（70）公里。

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

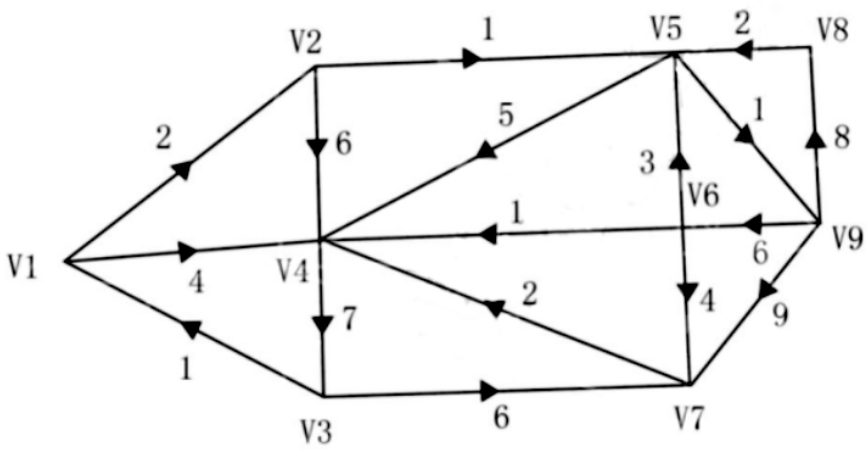

（69）A、V6　　B、V7　　C、V8　　D、V9

（70）A、17　　B、14　　C、13　　D、11

31、2023年11月第4批

甲公司对某投资项目进行评估，投入100万元，10%概率获得利润150万元，55%的概率获得利润200万元，20%的概率获得利润280万元，10%的概率不赔不赚，5%的概率亏300万元。则项目的投资回报率为（）。

A、266　　B、2.66　　C、166　　D、1.66

32、2023年11月第4批

某企业新研发的产品要投入市场，有三种价格方案A、B、C,预估每种价格方案的三种销售状态，根据同类产品的销售经验，算出三种价格方案下三种销售状态的收益值如表所示，该企业根据后悔值决策标准，应选择（）方案。

价格方案	收益值（万元）		
	销路较好	销路一般	销路较差
A方案	34	25	22
B方案	30	30	24
C方案	26	28	26

A、B方案　　B、B方案或C方案　　C、C方案　　D、A方案

33、以下项目中，贴现率是10%，项目的动态投资回收期是（）。（我根据23年11月第1批考点原创的模拟题）

	0	1	2	3	4
现金流出	-200				
现金流入		60	60	60	80

A、2年　　B、3年　　C、4年　　D、3.93

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

34、马军老师投资30万元在大学周围开了一个宾馆，在走上正轨后，正常年份的年息税前利润为27万元，则马军老师投资的本项目的ROI为（）。（我根据23年11月第2批考点原创的模拟题）

A、90%　　B、10%　　C、20%　　D、80%

35、2024年5月第1批

投资100万，年利率10%，按复利法计算，则3年后本利和约为( )万元。

A、133　　B、121　　C、135　　D、130

36、2024年5月第1批

某项目有四个方案均能满足要求。其费用数据如下表所示。在基准折现率为10%情况下，根据费用现值法，最优方案是( )。

方案	总投资(第1年初)	每年运营费用(第1年到第3年)
方案甲	150	40
方案乙	300	5
方案丙	200	15
方案丁	250	10

A、丙　　B、丁　　C、乙　　D、甲

37、2024年5月第1批

两家企业生产同种产品，为抢占市场规模，每家企业都制定了三个市场推销策略，两家企业的市场策略会影响双方的市场规模占有情况，赢得矩阵如下:

	乙企业策略1	乙企业策略2	乙企业策略3
甲企业策略1	-2	-1	3
甲企业策略2	1	0	1
甲企业策略3	3	-1	-3

在这个矩阵中,每个单元格中的数字表示甲企业比乙企业多占的市场规模,负数则表示甲企业比乙企业少占的市场规模。则双方各应采用哪种策略( )。

A、甲企业选择策略2，乙企业选择策略2

B、甲企业选择策略1，乙企业选择策略2

C、甲企业选择策略1，乙企业选择策略3

D、甲企业选择策略3，乙企业选择策略1

38、2024年5月第1批

某公司承接一智能会议信息系统项目，有4个方案可供选择。每个方案都可能会出现三种不同的结果,分别对应获取不同的利润，如下表所示。根据悔值决策法，该公司应选择方案( )。

	最差结果	一般结果	最佳结果
方案甲	-5万	15万	30万

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

方案乙	10 万	60 万	80 万
方案丙	20 万	35 万	45 万
方案丁	-60 万	10 万	50 万

A、丙　　B、丁　　C、甲　　D、乙

39、2024 年 5 月第 1 批

某项目有 4 个硬件的生产任务需要完成，有 4 个硬件厂商可选择，每个厂商只能分配一个任务。下表是各厂商完成各硬件生产所需的时间:

	硬件 1	硬件 2	硬件 3	硬件 4
厂商甲	13	6	8	9
厂商乙	6	11	5	8
厂商丙	7	9	5	8
厂商丁	8	6	7	12

则 4 个硬件生产完成的总时间最短为( )。

A、26　　B、25　　C、28　　D、27

40、2024 年 5 月第 2 批

下面是某小区内部道路图，线上的数字为两点之间的距离，现在需要从 V1 向 V8 运送物资，则最短的距离为（）。

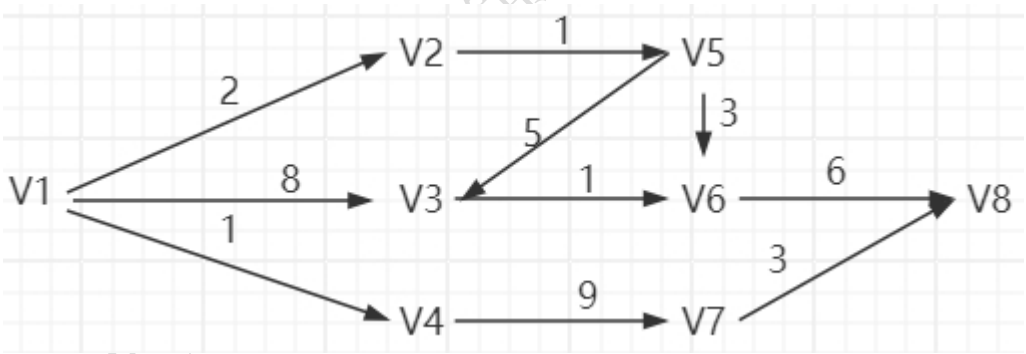

A、12　　B、13　　C、10　　D、15

41、2024 年 5 月第 2 批

某公司进行项目投资，项目初始固定资产投资 20000 万元。随后 5 年的投入分别是 1000 万元、1500 万元、2000 万元、1000 万元和 2000 万元。各年度收益分别是 10000 万元、12000 万元、16000 万元、20000 万元、21000 万元,则该项目的静态投资回收期为（）。

A、2.299　　B、2.083　　C、2.179　　D、2.036

42、2024 年 5 月第 2 批

某企业承接了一项工程，该工作分为Ⅰ、II、III、Ⅳ四项任务，甲、乙、丙、丁四个项目

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

组完成各项任务的时间如表所示，为实现最优配置，第Ⅳ项任务应由 ( ) 来完成。

任务	甲	乙	丙	丁
I	4	30	26	8
II	20	8	28	30
III	18	28	32	26
IV	14	16	22	18

A、甲　　B、乙　　C、丙　　D、丁

43、2024 年 5 月第 2 批

某工厂生产甲乙两种产品，每生产一件甲产品需要 2 吨钢材，1 立方米木材，4 吨水泥;每生产一件乙产品需要 3 吨钢材，4 立方米木材，1 吨水泥。现有 10 吨钢材，10 立方米木材，20 吨水泥。产品销售后，每件甲产品可获利 1 万元，每件乙产品可获利 2 万元，为获得最高的经济利益，该工厂应生产（）件甲产品，获得总利润是（）万元。

65、A、2　　B、4　　C、3　　D、1

66、A、6　　B、2　　C、8　　D、4

44、2025 年 5 月第 1 批

某工厂生产甲、乙两种产品，生产 1 件甲产品需要消耗 A 原料 3 千克、B 原料 2 千克，可获得利润 50 元。生产 1 件乙产品需要消耗 A 原料 1 千克、B 原料 4 千克，可获得利润 30 元。目前工厂有 A 原料 130 千克、B 原料 120 千克。甲产品生产（）件、乙产品生产（）件，能让工厂获得最大利润。

A、25　25　　B、40　10　　C、35　10　　D、30　15

45、2025 年 5 月第 1 批

有四项任务 ABCD，需分配给甲乙丙丁四个人完成，每人只能完成一项任务，各项任务分配给不同人的成本如下表所示(单位:千元)，成本最低的分配方案时,总成本为（）千元。

	A	B	C	D
甲	10	7	13	12
乙	9	10	15	13
丙	12	9	10	12
丁	13	15	9	10

A、37　　B、34　　C、36　　D、40

46、2025 年 5 月第 1 批

如下表，请问总运费最小是（）千元。

	甲	乙	丙	丁	总量
A	6	4	6	9	200
B	3	2	7	6	300

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C	5	7	3	2	400
需求量	150	250	300	200	

A、2550　　B、2750　　C、2650　　D、2850

47、2025 年 5 月第 2 批

某投资项目，初始投入 1000 万元，按单利计算，第 5 年底，连本金带利息可获得 1700 万元，若以相同年利率，按复利计算，则第 5 年底，连本金带利息可获得约为（）万元。

A、1800　　B、2000　　C、1700　　D、1900

48、2025 年 5 月第 2 批

某公司承接一智能会议信息系统项目，有 4 个方案可供选择。每个方案都可能会出现三种不同的结果，分别对应获取不同的利润，如下表所示。获得最差结果，一般结果，最佳结果的概率分别为 0.4，0.5，0.1。使用期望值与标准差决策法，该公司应选择方案（）。

	最差结果	一般结果	最佳结果
方案一	-5 万	20 万	40 万
方案二	0 万	10 万	20 万
方案三	-20 万	-14 万	200 万
方案四	-50 万	30 万	50 万

A、方案四　　B、方案三　　C、方案二　　D、方案一

49、2025 年 5 月第 2 批

某公司为一集团开发 OA 系统，该系统由多个功能模块组成，共涉及三个开发环境 A、B、C。全部模块测试工作由甲、乙、丙、丁 4 个小组共同负责。由于各组技术水平存在差异，各组在规定时间内能完成测试的模块个数不相同。各个开发环境下开发的模块数量、各小组对不同开发环境下开发的模块进行测试所需的单个成本（单位：千元）和每个测试小组的测试的模块数量如下表所示。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	测试甲组	测试乙组	测试丙组	测试丁组	开发模块数（单位：个）
A	10	7	9	8	50
B	15	16	12	13	80
C	7	8	9	6	150
测试模块数（单位：个）	40	50	90	100	

根据上表数据，该公司制定一个测试方案，使得总测试成本最低，则最低测试成本为（）。

A、2300　　B、2280　　C、2270　　D、2290

50、2026 年 5 月第 1 批

某公司投资一项目，各年成本和收入如下表所示，折现率为 10%，该项目动态投资回收期为（　）。

成本	初期投资	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
成本（万元）	1291	100	100	100	100
收入（万元）	0	360	480	540	832.05

A、3.41　　B、3.82　　C、4.05　　D、4.33

51、2026 年 5 月第 1 批

某建材公司有 A1、A2、A3 生产基地生产同一种建材，需要调运到 B1、B2、B3 三个仓储中心。其供应量、需求量和单位产品运价如下所示。在满足各仓储中心需求的前提下，采取总运费最少的调运方案，则最小总运费为（　）。

产地	销地			供应量
	B1	B2	B3	
A1	4	8	3	12
A2	5	2	6	10
A3	7	9	4	8
需求量	11	9	10	

A、98　　B、101　　C、112　　D、132

52、2026 年 5 月第 1 批

某企业承接了一项工程，该工作分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项任务，甲、乙、丙、丁四个项目组完成各项任务的时间如下表所示，为实现最优配置，完成全部四项任务的最少总工时为（　）。

任务	甲	乙	丙	丁
Ⅰ	11	18	24	14
Ⅱ	17	9	21	25
Ⅲ	15	22	28	20

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

Ⅳ	13	15	19	16

A、52　　B、57　　C、59　　D、64

53、2026 年 5 月第 2 批

某企业拟开发新产品，有甲、乙 、丙 、丁四种方案，未来市场需求分为旺盛、正常、疲软三种自然状态，各方案年收益(万元)如下表。应用悔值决策法时，应选择的最优方案是方案（）。

方案	旺盛	正常	疲软
甲	120	70	20
乙	100	90	40
丙	80	60	50
丁	140	50	10

A、乙　　B、丁　　C、丙　　D、甲

54、2026 年 5 月第 2 批

某企业计划 3 年后购置设备，需资金 100000 元。若将手头现金一次性存入银行。银行年利率 5%，按年复利计息，三年后全部取出正好可以购买该设备。该企业当前最少需存入（）本金。

A、86384 元　　B、86491 元　　C、86274 元　　D、86526 元

55、2026 年 5 月第 2 批

某工厂生产 A 和 B 两种产品，所需材料及利润如下表所示，现有甲材料 14kg，乙材料 12kg，可获得的最大利润为（ ）元。

产品	甲材料（kg / 件）	乙材料（kg / 件）	利润（元 / 件）
A	2	1	30
B	1	3	40

A、280　　B、260　　C、240　　D、300

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十八章 组织通用治理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第13题

关于绩效评估的描述，不正确的是（13）。

A、绩效评估要以员工发展为第一目标，全面了解员工的发展潜力

B、绩效评估由人力资源部门负责牵头组织、协调、相关部门予以配合

C、绩效评估是绩效治理整个周期性循环过程中技术性最强的一个环节

D、制定科学合理的评价方法是绩效评估的关键

2、我根据23年11月第2批考点原创的模拟题

（）是开展数字化转型的重要基石。组织可以利用（）的价值支持新的业务模式、改进产品和服务等。

A、数字化产品　　数据技术　　B、数据　　数据

C、数字化人才　　数据技术　　D、新技术　　数据

3、我根据23年11月第3批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下关于绩效评估方法的说法中，错误的是（）。

A、排序法是指根据工作绩效评估的高低对具有相同工作性质的员工进行排序的方法。该方法简便易行，一般适用于工作内容单一或工作内容相同的员工较多时进行绩效评估。

B、硬性分布法是指将绩效评估结果进行分档，评估者根据分档档次和分档比例对被评估者进行分派的方法。这种评估方法成本相对较低，但绩效评估标准模糊，主观性较高。

C、目标管理法是指通过事先设定目标、制订计划对被评估者的工作目标完成情况进行绩效评估的方法。目标管理一般包括目标确定、计划执行、检查调整、完成评价等几个步骤。这种方法也广泛用于对团队和个人的绩效评估。

D、关键事件法指通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度，将组织的战略目标落实为可操作的衡量指标和目标值，对被评估者进行综合考评的方法。

4、2024年5月第1批

组织在数字化转型中，（）是转型成功与否的关键要素，使组织具备长期竞争优势。

A、组织数字营销　　B、数字化产品和服务

C、数字人才队伍　　D、组织数字文化

5、2024年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）通过财务、客户、内部运营、学习与成长4个角度，将组织战略目标逐层分解转化为细化指标，有差异化地针对不同的指标进行不同时间周期的绩效评估，有助于组织战略目标的实现。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、目标管理法　　B、平衡计分卡法　　C、硬性分布法　　D、尺度评价表法

6、2024 年 5 月第 1 批

组织通用治理中，组织在分析和回顾战略实施过程中进行创新和改进的要素包括（）。

①内外部发展环境对战略规划的影响

②在业务增长、发展趋势等方面的预测及其与实际的差异

③提升业务增长和盈利的措施

④竞争优势和发展水平分析及措施

⑤流程规划和知识管理

A、①②③④　　B、①③④⑤　　C、②③④⑤　　D、①②④⑤

7、2024 年 5 月第 2 批

关于组织定位的描述，不正确的是（）。

A、组织定位包括使命、愿景和价值观，不包括产品和服务定位

B、组织使命是组织较长期的业务发展的总方向和总特征

C、组织文化为日常工作提供具体的实践方法

D、组织愿景描述了组织发展的目的和如何达到这个目的的理性认知

8、2024 年 5 月第 2 批

绩效评价结果的应用包含价值评价和绩效改进两层内容，（）不属于价值评价。

A、人事调动　　B、薪酬调整　　C、在职培训　　D、员工奖励

9、2025 年 5 月第 1 批

关于数字化转型 KPI 的描述，不正确的是（）。

A、数字化转型指标应具有独立性，与组织其他业绩评估指标低耦合

B、数字化转型指标要适宜，不宜过多也不宜过少

C、传统的 KPI 一般无法有效衡量数字化转型的绩效

D、KPI 应涵盖组织数字化转型业务发展的各个阶段

10、2025 年 5 月第 1 批

组织在制定的经营业绩计划中，包含的要素内容包括（）。

①能力发展计划　②权重　③绩效计划及评估内容　④目标值设定

A、①②③　　B、①②④　　C、②③④　　D、①③④

11、2025 年 5 月第 1 批

分析组织的内外部环境对于组织战略的制定有着至关重要的作用，常用的组织成功关键因素分析方法有 SWOT 分析法和（）分析。

A、波士顿矩阵　　B、PEST 模型　　C、4F 营销理论　　D、卡诺模型

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

12、2025 年 5 月第 2 批

关于转型升级描述正确的是（）。

A、数字化转型指标应与传统关键绩效指标保持一致，以达到前后的效果对比

B、数字化转型是应用新一代信息技术，激发数据要素创新驱动潜能，提升生存和发展能力，加速业务优化升级和创新转型

C、组织文化是企业的价值导向和行为准则，一般保持稳定不变，组织战略的设计要以组织文化为导向，以促进成功实施

D、数据化转型组织架构及工作机制分为治理层、规划层、实施层、能力层四个层级

13、2025 年 5 月第 2 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

以下绩效评价方法应用正确的是（）。

A、对于高层管理人员可使用“关键事件法”形成最终评估结果

B、对不同工作性质的员工进行排序法绩效评价，便于横向对比

C、对于具有高度创新和临时性人员较多采用尺度评价法

D、平衡计分卡法可将组织战略目标分解为相互平衡的细化指标

14、2025 年 5 月第 2 批

关于 PEST 组织战略分析的描述，不正确的是（）。

A、既考虑了企业自身的内部条件，又考虑了外部环境的影响

B、可以从政策支持、经济态势、技术实现和社会价值等层面制订发展战略

C、使企业更能够适应外部环境的变化

D、用于评估企业所处于宏观环境对其产生的影响

15、2026 年 5 月第 1 批

以下属于制订绩效计划时应遵循的原则的是（ ）。

A、结果优先　　B、价值驱动　　C、风险可控　　D、成本最优

16、2026 年 5 月第 2 批

根据绩效评估的内容，绩效评估一般分为（）。

A、过程主导型、技术主导型、行为主导型

B、过程主导型、品质主导型、事件驱动型

C、效果主导型、技术主导型、事件驱动型

D、效果主导型、品质主导型、行为主导型

17、2026 年 5 月第 2 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

关于数字化转型指标的相关描述，不正确的是（）。

A、组织开展数字化转型时，传统的关键业绩指标无法有效衡量数字化组织的绩效

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、数字化转型指标应独立于业绩指标，用于客观衡量数字化转型过程的绩效

C、数字化转型指标应涵盖组织数字化转型业务发展的各个阶段

D、数字化转型指标不宜过多也不宜过少

本章可以做的另一些题目：

本块题目为我按新教材写的模拟题，大家可以选择性的做。模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、（）是指组织从现有战略基础水平上向更高一级的目标发展的战略。

A、防御性战略　　B、发展性战略　　C、稳定性战略　　D、紧缩性战略

2、绩效计划按时间分类，一般来说不包含（）。

A、年度计划　　B、季度计划　　C、月度计划　　D、周计划

3、绩效评估的内容概括来说主要包括3方面内容，不包含（）。

A、对上一周期内实际完成绩效的进行回顾及评估，并将实际完成结果与设定的衡量标准进行比照评价。

B、为下一绩效周期制定或改进调整绩效标准、绩效目标、绩效内容。

C、确定报酬调整和奖励方案。

D、确定组织绩效考核指标体系，提出考核方法，推动计划确定，跟踪后续管理，收集汇总数据，计算绩效分值。

4、数字化转型组织架构及工作机制的建议可分为4个层次，是规划层、实施层、能力层和（）。

A、资源层　　B、技术层　　C、管理层　　D、决策层

5、以下说法，错误的是（）。

A、组织文化是组织发展过程中凸显的精神特质与内涵，是组织区别于其他组织的关键因素。组织文化是组织最为本质的体现之一，是组织发展的原动力

B、常用的组织成功关键因素分析方法有PEST模型分析和SWOT分析法等。

C、组织的产品和服务战略的类型通常可以分为：技术密集型、成本导向型和目标动态型。

D、组织外部环境分析的基本内容包括产品和服务竞争能力分析

6、常见的组织总体战略类型不包括（）。

A、进取型战略　　B、稳定型战略　　C、发展型战略　　D、紧缩型战略

7、下列说法错误的是（ ）。

A、组织战略是组织发展过程中凸显的精神特质与内涵，是组织区别于其他组织的关键因素；

B、组织环境是存在于组织内外部，影响组织发展的各种因素的总和。

C、组织的产品和服务战略的类型通常可以分为：技术密集型、成本导向型和目标动态型。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

D、良好的组织治理可为组织高质量和可持续发展提供重要支撑。

8、下面不属于组织内部环境分析的是（ ）。
A、技术开发能力分析　　B、生产能力和服务效能分析
C、产品和服务竞争能力分析　　D、资源环境分析

9、（）是在汇集组织每个员工个人心愿的基础上形成的全体员工共同心愿的美好愿景，描述了组织发展的目的和对如何到达那里的理性认知。
A、组织愿景　　B、组织使命　　C、组织文化　　D、组织环境

10、以下（）不属于绩效计划包括的内容。
A、绩效标准　　B、绩效目标　　C、绩效内容　　D、绩效考核

11、（）是指员工根据已经制订好的绩效计划开展工作，组织管理者对员工的工作进行指导、监督和管理，对发现的问题及时协助解决，并根据实际工作进展情况对绩效计划进行调整和完善的一个过程。
A、绩效实施　　B、绩效计划　　C、绩效治理　　D、绩效评估

12、根据绩效评估的内容，其类型一般可分为（）。
①效果主导型　　②品质主导型　　③行为主导型　　④价值主导型
A、①②③　　B、①②　　C、①②③④　　D、①④

13、组织转型升级首先要解决的是（）问题。
A、战略选择　　B、战略实施　　C、战略评估　　D、战略调整

14、常见数字化转型的驱动因素不包括（）。
A、新技术的强势发展　　B、高“交互成本”运作
C、业务运行的透明化　　D、个性化需求的满足

15、组织经营业绩计划主要组成要素不包括（）。
A、绩效计划及评估内容　　B、权重　　C、目标值设定　　D、评估人

16、（）是指评估者通过评估表的形式，把绩效评估的每一项内容进行定量分解，对被评估者的工作绩效进行考评打分，最后将考评分值进行合计得到评估总分的方法。这种方法一般适用于对组织管理人员的绩效评估。
A、品质主导型　　B、硬性分布法　　C、平衡计分卡法　　D、尺度评价表法

17、绩效内容为员工的工作任务指明了方向和范围，明确了员工在绩效考核期间应当完成的工

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

作任务，包括绩效项目和绩效指标两个部分。绩效项目不包括（）。

A、工作业绩　　B、工作能力　　C、工作态度　　D、工作效率

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第二十九章 组织通用管理

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023年5月第14题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

知识管理需要遵循积累原则、共享原则和交流原测。其中（14）是实施知识管理的基础，（14）需要建立有利于知识管理的组织结构和文化气氛。

A、共享原则 交流原则　　B、积累原则 交流原则

C、积累原则 共享原则　　D、交流原则 共享原则

2、我根据23年11月第1批考点原创的模拟题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

以下（）不是隐形知识的特征。

A、非陈述性　　B、个体性　　C、实践性　　D、客观存在性

3、2024年5月第1批

流程管理中，组织战略执行保障体系包含战略控制层、流程执行层、系统支撑层三层。其中，（）是战略执行落地的核心枢纽；预算考核属于（）。

A、流程执行层；系统支撑层　　B、战略控制层；流程执行层

C、战略控制层；系统支撑层　　D、流程执行层；战略控制层

4、2024年5月第1批

某企业管理层采取纠偏措施缩小目标与实际业绩之间的差距。该企业正在执行（）阶段的营销活动。

A、市场营销组织　　B、市场营销执行　　C、市场营销控制　　D、市场营销分析

5、2024年5月第2批

在招聘成本中，（）不属于显性成本。

A、管理层参与面试　　B、增加招聘渠道　　C、发布招聘广告　D、内部推荐奖励金

6、2024年5月第2批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

显性知识的特征不包括（）。

A、非称述性　　B、可共享性　　C、静态存在性　　D、客观存在性

7、2025年5月第1批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

企业将操作手册数字化并上传至OA平台供全员使用，这主要体现了显性知识的（）特征。

A、可共享性　　B、客观存在性　　C、认知元能性　　D、静态存在性

8、2025年5月第1批

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

在流程持续改进中，首先需要进行流程框架体系的优化，其主要目的是（）。

A、解决组织分散的问题　　B、将优化后的流程固化到作业手册中

C、明确问题的边界和逻辑关系　　D、通过流程评价验证优化效果

9、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

市场营销组合的 4P 不包括（）。

A、定价(Price)　　B、政策(Policy)　　C、产品(Product)　　D、促销(Promotion)

10、2025 年 5 月第 1 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

工作内容设计是岗位设计的重点，一般包括 5 个方面，“设计岗位时要求在完成基础任务后，需逐步处理更复杂的技术问题并参与创新项目”反映了（）。

A、工作广度　　B、工作自主性　　C、工作的完整性　　D、工作的深度

11、2025 年 5 月第 2 批

在组织薪酬体系里，直接报酬不包括（）。

A、五险一金　　B、岗位工资　　C、股票期权　　D、绩效工资

12、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于流程效率的指标。

A、投入产出比　　B、分段过程域平均处理时长

C、项目需求满足率　　D、一致性质量成本投入

13、2025 年 5 月第 2 批

组织知识库建设的步骤是（）。

①分析构建目标 ②净化数据与知识去冗 ③知识整序 ④构建知识库框架 ⑤实施和联网 ⑥知识审计与评估

A、①②③④⑤　　B、①④③⑥⑤　　C、①④②③⑤　　D、①②③④⑥

14、2025 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）不属于市场营销的宏观环境。

A、人口环境　　B、政治与社会　　C、竞争者与客户　　D、技术态势

15、2026 年 5 月第 1 批

某员工参加完技能培训后，在实际工作中运用培训学到的新技能开展工作，组织因此给予该员工绩效提升、薪资上调等正向奖励。该现象属于促进培训迁移工作环境特征中的（ ）。

A、任务线索　　B、内部强化　　C、外部强化　　D、直接主管

16、2026 年 5 月第 1 批

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

实施知识管理一般遵循的原则包括（ ）。

A、战略导向、成本优先、集中管控、风险可控

B、领导作用、文化融合、知识创新、知识保护

C、技术优先、全员考核、对外共享、快速迭代

D、业务独立、制度隔离、静态存储、一次性建设

17、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

（）属于市场营销的 4P 理论中的核心内容。

A、渠道(Place)　　B、人员(People)

C、包装(Package)　　D、过程(Process)

18、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在流程管理中，组织流程通常可分为（）。

①战略流程 ②管理流程 ③运行流程 ④支持流程 ⑤改进流程

A、①③④　　B、②③④　　C、③④⑤　　D、①③⑤

19、2026 年 5 月第 2 批

人力资源管理中，（）工作包括如何管理员工的工资和奖金，按照员工的贡献等因素进行收入分配，如何做到奖惩分明，并通过绩效、福利等措施激励员工。

A、招聘　　B、维护　　C、提升　　D、评价

20、2026 年 5 月第 2 批（此题为常规重点考题，建议举一反三）

某公司知识管理过程中，设立专门的知识库，收录所有研发过程中的技术方案、实验数据，失效分析，包括未商业化的技术，防止重复试错。体现了知识管理的（）。

A、积累原则　　B、共享原则　　C、交流原则　　D、评估原则

本章可以做的另一些题目：

本块题目为我按新教材写的模拟题，大家可以选择性的做。模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、工作分析的方法划分为定性和定量两类。定性的工作分析方法主要有工作实践法、直接观察法、面谈法、问卷法和（）。

A、典型事例　　B、职位分析问卷法　　C、管理岗位描述问卷法　　D、功能性工作分析法

2、以下（）不属于人力资源战略。

A、内部劳动力市场战略　　B、高承诺战略　　C、混合战略　　D、成长性战略

3、常见的流程检查方法主要有流程稽查、流程绩效评估、（）和流程审计等。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、流程评估　　B、流程回顾　　C、满意度评估　　D、流程评审

4、根据流程优化需求驱动因素的不同，流程优化需求大致可分为3种，其中流程规划报告属于（）。
A、问题导向　　B、绩效导向　　C、变革导向　　D、战略导向

5、知识管理的原则不包含（）。
A、积累原则　　B、共享原则　　C、交流原则　　D、价值导向原则

6、以下（）不是隐形知识的特点。
A、个体性　　B、情境性　　C、交互性　　D、认知元能性

7、主要的市场营销组合工具称为市场营销的4P，指产品、定价、渠道和（）。
A、促销　　B、支付　　C、环境　　D、政治

8、组织购买有3种类型，其中不包括（）。
A、直接重购　　B、调整重构　　C、新购　　D、限制性购买

9、下面不属于定性的工作分析方法的是（ ）。
A、工作实践法　　B、职位分析问卷法
C、直接观察法　　D、问卷法和典型事例法

10、下列描述不正确的是（）。
A、岗位设计的主要内容包括工作内容设计、工作职责设计和工作关系设计3个方面；
B、人力资源战略分为3种类型：内部劳动力市场战略、高承诺战略和稳定型战略；
C、人力资源需求预测一般有集体预测、回归分析和转换比率等方法。
D、招聘策略包括负责招聘的人员、招聘的来源和招聘方法3个主要方面。

11、下面不属于市场营销的宏观环境的是（）。
A、组织　　B、人口　　C、政治与社会　　D、技术

12、当把人力资源的供给预测和需求预测结果相互比照，有几种可能的结果，分别是（）。
①需求和供给彼此适应　②需求超过供给　③需求小于供给
A、①②　　B、①③　　C、②③　　D、①②③

13、（）指为弥补通货膨胀导致实际薪酬下降的损失，给员工加薪以保持其实际生活水平不下降或少下降，属于薪酬的普调。
A、奖励性调整　　B、生活指数性调整　　C、年资(工龄)性调整　　D、效益型调整

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

14、流程管理价值原则不包含（）。
A、管理大跨度原则　　B、管理多元参与原则
C、管理高频度使用原则　　D、管理高效率原则

15、组织流程通常可分为（）。
①战略流程　　②运行流程　　③支持流程
A、①②　　B、②③　　C、①③　　D、①②③

16、工作分析通常划分为四个阶段：正确的顺序是（）。
①明确工作分析范围②确定工作分析方法③工作信息收集和分析④评价工作分析方法
A、①②③④　　B、①②④③　　C、④③①②　　D、③④①②

17、培训效果可能是（）。
①可能是积极的，使得工作绩效得到提高
②可能是消极的，使得工作绩效恶化
③可能是中性的，即培训对工作绩效没有明显的影响
A、①②　　B、②③　　C、①③　　D、①②③

18、战略执行保障体系中，（）以会议管理、运行分析、预算考核为基础建立组织发展计划，形成以执行和控制为目标。
A、战略控制层　　B、流程执行层　　C、系统支撑层　　D、反馈评价层

19、流程的特点不包括（）。
A、目标性　　B、内在性　　C、整体性　　D、外在性

20、（）对组织当前拥有的知识的数量和质量进行核查，对组织知识的价值进行评估。
A、知识审计　　B、知识转移　　C、知识存储　　D、知识服务

21、按照面试问题的结构化程度，以下（）不是招聘面试的类型。
A、非结构化面试　　B、半结构化面试　　C、结构化面试　　D、萝卜坑面试

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十章 法律法规与标准规范

本章历年考题或根据真题考点写的模拟题：

1、2023 年 5 月第 15 题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，进行数据保护，这是实行的数据（15）保护制度。

A、分类分级　　B、安全审查　　C、风险评估　　D、应急处置

2、2023 年 5 月第 16 题

（16）适用于 PaaS 云计算系统的设计、实现、部署和使用。

A、GB/T 35301《信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)参考架构》

B、GB/T 36327《信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)应用程序管理要求》

C、CB/T 37739《信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)部署要求》

D、GB/T 32399《信息技术 云计算 参考架构》

3、我根据 23 年 11 月第 1 批考点原创的模拟题

（）是信息化法律法规领域的最重要的法律基础。

A、《中华人民共和国民法典》合同编　　B、网络安全法

C、数据安全法　　D、著作权法

4、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

（）标准规定了物联网系统实体间接口的具体功能要求。

A、GB/T35319 物联网系统接口要求

B、GB/T33474 物联网参考体系结构

C、GB/Z33750 物联网标准化工作指南

D、GB/T36478.1 物联网信息交换和共享第 1 部分：总体架构

5、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

以下关于网络安全法的说法中，错误的是（）。

A、网络安全法的制定是为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。适用于在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络，以及网络安全的监督管理。

B、国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。

C、关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行 2 次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

息基础设施安全保护工作的部门。

D、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；

6、我根据 23 年 11 月第 2 批考点原创的模拟题

以下关于数据安全法的说法中，错误的是（）。

A、数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。

B、国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。

C、国家建立数据分类分级保护制度，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。国家数据安全工作协调机制统筹协调有关部门制定重要数据目录，加强对重要数据的保护。

D、数据严禁交易，必须保密

7、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

（）是我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律。

A、中华人民共和国网络安全法　　B、招投标法　　C、数据安全法　　D、民法典

8、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

（）从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定。

A、数据安全法　　B、招投标法　　C、网络安全法　　D、民法典

9、我根据 23 年 11 月第 3 批考点原创的模拟题

以下说法中，错误的是（）。

A、专利法规定，发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

B、发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

C、发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。

D、实用新型指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

10、2024 年 5 月第 1 批

关于数据安全法的描述，不正确的是（）。

A、现行《中华人民共和国数据安全法》于 2021 年 9 月 1 日起正式施行

B、数据安全法延续了网络安全法生效以来的“一轴两翼三级”的监管体系，通过多方共同

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

参与实现各地方、各部门对工作集中收集和产生数据的安全管理

C、数据安全法从数据安全与发展、数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据安全与开放的角度对数据安全保护的义务和相应法律责任进行规定

D、数据安全法是数据安全领域最高位阶的专门法，与网络安全法一起补充了《中华人民共和国国家安全法》框架下的安全治理法律体系

11、2024 年 5 月第 1 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

专利分类中，（）指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;（）指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

A、实用新型、发明　　B、实用新型、外观设计

C、发明、外观设计　　D、发明、实用新型

12、2024 年 5 月第 1 批

国家标准( )为信息技术服务体系的建立提供了范围基础。

A、《信息技术服务从业人员能力评价要求》

B、《信息技术服务服务安全要求》

C、《信息技术服务服务基本要求》

D、《信息技术服务分类与代码》

13、2024 年 5 月第 2 批*（此题为常规重点考题，建议举一反三）*

关于招标投标的描述，不正确的是（）。

A、招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场

B、一个招标项目只能有一个标底,标底必须保密

C、属于同一集团组织成员的投标人可以按照该组织要求协同投标

D、国有资金占控股或主导地位的项目，可以公开招标，也可以邀请招标

14、2024 年 5 月第 2 批

（）标准适用于服务供方和需方确立服务内容和签署合同。

A、GB/T 33850《信息技术服务-质量评价指标体系》

B、GB/T 37696《信息技术服务-从业人员能力评价要求》

C、GB/T 37961《信息技术服务-服务基本要求》

D、GB/T39770《信息技术服务-安全要求》

15、2024 年 5 月第 2 批

关于《中华人民共和国商标法》的描述和内容，不正确的是( )。

A、注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应在期满前 12 个月内按规定办理续展手续

B、注册商标的有效期是是十年，每次续展注册的有效期是五年

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

C、为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以申请驰名商标的保护

D、现行的《中华人民共和国商标法》是 2019 年 4 月修正的

16、2025 年 5 月第 1 批

依据现行的人工智能安全标准，提供 AI 服务的组织需建立用户权益保护机制，明确用户对 AI 生成内容的知情权和选择权。这一规定主要补充了（）中关于规定个人信息处理的知情权的实施细节。

A、《中华人民共和国网络安全法》　　B、《中华人民共和国个人信息保护法》

C、《中华人民共和国未成年人保护法》　　D、《中华人民共和国民法典》

17、2025 年 5 月第 1 批

2024 年，中办、国办印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》,提出“统筹推进政务数据共享”“有序推动公共数据开放”“鼓励探索公共数据授权运营”,下列案例中体现了“有序推动公共数据开放”的是（）。

A、国家数据局建立公共数据资源登记制度，形成全国数据底账

B、北京市交通委向企业开放公共交通数据，推动一体化出行服务

C、无锡市打通低保与水电补贴数据，实现群众“无感”享受补贴

D、深圳市福田区授权运营医疗数据，优化商保快速理赔流程

18、2025 年 5 月第 1 批

为了充分发挥数据要素乘数效应，国家数据局等 17 部门联合发布了《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026 年)》,该计划从提升数据供给水平、优化（）、加强（）三方面强化保障支撑。

A、数据流通环境、数据安全保障　　B、数据治理能力、数据安全保障

C、数据治理能力、数据基础设施建设　　D、数据流通环境、数据基础设施建设

19、2025 年 5 月第 1 批

某物联网平台需在设备数据采集环节遵循“最小必要原则”，仅收集与业务直接相关的用户信息，并实现数据匿名化处理。这一要求的主要依据是（）。

A、GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

B、GB/T37988-2019《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》

C、ISO/EC27017:2015《云服务信息安全控制实践规范》

D、GB/T35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》

20、2025 年 5 月第 2 批

根据 GB/T 22239-2019《信息安全技术 网路安全等级保护基本要求》，某高校对教务管理信息系统定级三级，在对网络进行升级改造时，关于改造方案的设计与实施，做法正确的是（）。

A、为方便各学院技术人员排查网络故障，网络管理员将详细标注设备型号，IP 地址分配

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

等关键信息的网络拓扑图共享至学校内部技术交流群

B、鉴于学校无线网络使用频繁，为提升效率，网络管理部门决定仅对连接有线网络的设备进行身份鉴别，对连接无线网络的设备放宽身份鉴定要求

C、为实现对进出网络信息内容的过滤，部署了一套入侵检测系统（IDS）以实现对应用层 HTTP，FTP 协议命令集的控制

D、考虑到教学活动存在阶段性高峰，网络设备选型时选用了具备一定冗余处理能力的设备，并根据历史流量数据规划了网络各个部分的带宽

21、2025 年 5 月第 2 批

依据 GB/T 44109-2024《信息技术 大数据 数据治理实施指南》，数据治理实施过程框架包括（）过程、执行过程、（）过程和改进过程。

A、规划 评价　　B、战略 监控　　C、规划 监控　　D、战略 评价

22、2025 年 5 月第 2 批

依据 GB 45438-2025《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》，以下人工智能生成合成内容标识活动中，属于隐式标识的是（）。

A、交互场景界面包含“人工智能生成合成”提示文字

B、文本内容使用“AI”提示角标

C、音频内容起始位置添加节奏的提示音

D、文件元数据中添加扩展字段，如“AIGC”

23、2026 年 5 月第 2 批

《工业和信息化领域人工智能安全治理标准体系建设指南(2025)》规范了人工智能网络安全要求，包括网络安全防护、网络安全监测、网络安全管理和网络安全风险评估。“结合人工智能系统全生命周期不同阶段存在的网络安全风险，明确需要的安全应急响应、模型更新安全、漏洞管理等相关安全措施”，属于（）要求。

A、网络安全防护　　B、网络安全风险评估

C、网络安全监测　　D、网络安全管理

24、2026 年 5 月第 2 批

根据 2024 发布的《国家数据标准体系建设指南》，将（）标准分为开发利用、数据主体、数据治理、训练数据集等，并将数据主体标准划分为（）、企业数据和个人数据。

A、融合应用 行业数据　　B、数据技术 行业数据

C、基础通用 公共数据　　D、数据资源 公共数据

25、2026 年 5 月第 2 批

工信部等十部门于 2026 年 3 月底联合印发《人工智能科技伦理审查与服务办法(试行)》，其中第三条明确了:开展人工智能科技活动应将科技伦理要求贯穿全过程，遵循增进人类福社、

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

尊重生命权利、坚持公平公正、合理控制风险、（）、保护隐私安全、（）的人工智能科技伦理原则，遵守我国宪法、法律法规和有关规定。

A、保持稳定发展 确保可控可信　　B、保持公开透明 确保可控可信

C、保持公开透明 确保和谐发展　　D、保持稳定发展 确保和谐发展

本章可以做的另一些题目：

本块题目主要分为 2 部分，按顺序分别是：我按新教材写的模拟题、老教材的历年真题。大家可以选择性的做，如果发现一些题目和新版教材不一致，请以新版教材为准。其中我按新教材写的模拟题应该还是很有含金量的，因为很多同行在抄袭。

1、以下关于《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》的说法中，错误的是（）。

A、招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

B、招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。

C、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。

D、中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人不可以改变中标、成交结果。

2、以下关于《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国商标法》的说法，错误的是（）。

A、授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

B、发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。

C、经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。

D、注册商标的有效期为 15 年，自核准注册之日起计算。

3、以下关于《中华人民共和国数据安全法》的说法中，错误的是（）。

A、中央国家安全领导机构负责国家数据安全工作的决策和议事协调，研究制定、指导实施国家数据安全战略和有关重大方针政策，统筹协调国家数据安全的重大事项和重要工作，建立国家数据安全工作协调机制。

B、国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。

C、国家建立数据安全应急处置机制。发生数据安全事件，有关主管部门应当依法启动应急预案，采取相应的应急处置措施，防止危害扩大，消除安全隐患，并及时向社会发布与公众有关的警示信息。

D、任何数据，同等重要，必须采用统一的保护制度。

91过软老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

4、以下关于《中华人民共和国网络安全法》的说法中，错误的是（）。
A、国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。
B、关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估，并将检测评估情况和改进措施报送相关负责关键信息基础设施安全保护工作的部门。
C、采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于3个月；
D、网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。

5、（）为软件生存周期过程建立了一个公共框架，供软件工业界使用。该标准包括了在含有软件的系统、独立软件产品和软件服务的获取期间以及在软件产品的供应、开发、运行和维护期间需应用的过程、活动和任务。
A、GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》
B、GB/T 22032《系统与软件工程系统生存周期过程》
C、GB/T11457《信息技术软件工程术语》
D、GB/Z 31102《软件工程软件工程知识体系指南》

6、以下关于开标与评标的叙述中，不正确的是（34）。
A、评标委员会的数量为单数，其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的1/2
B、招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日
C、依法必须进行招标的项目，招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D、评标报告应当有评标委员会全体成员签字

7、依据《中华人民共和国政府采购法（2014修订）》，采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序（68）。
1.成立谈判小组　2.谈判　3.确定成交供应商　4.确定邀请参加谈判的供应商名单　5.制定谈判文件
A、12345　　B、15243　　C、15423　　D、14523

8、某集成商准备去投标一个政府网站开发项目，该系统集成商在项目招标阶段的工作依次是（36）。
①建立评标小组②编制投标文件③参与开标过程④研读招标公告⑤提交投标文件
A、①②③④⑤　　B、⑤②④③　　C、④②⑤③　　D、①④⑤②③

9、通过招标过程确定中标人后,实施合同内的合同价款应为(60)。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、招标预算价　　B、中标者的投标价
C、所有投标价的均价　　D、评标委员会综合各方面因素后给出的建议价

10、以下关于项目招标的叙述中，正确的是（35）。
A、资格预审文件或招标文件的发售期不得少于15日
B、投标保证金不得超过招标项目估算价的5%
C、评估委员会的人员数量不得少于5人
D、书面合同具备法律效力，中标通知书不具有法律效力

11、以下关于政府采购的说法，不正确的是（70）。
A、为在中国境外使用而进行采购的，可以不采购本国货物、工程和服务
B、两个以上的自然人、法人或者其他组织也可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购
C、招标后没有供应商或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，可以采用单一来源采购方式采购
D、公开招标应作为政府的采购方式

12、在（34）时，可以不进行招标。
A、需要采用不可替代的专利或者专有技术
B、项目全部或部分使用国有投资或国家融资
C、采购大型关系公共安全的基础设施
D、使用国际组织或外国政府贷款、援助资金

13、关于项目招投标的说法，不正确的是（35）。
A、中标人确定后，招标人应当视情况向中标人发出中标通知书，将中标结果通知所有未中标的投标人
B、依法必须进行招标的项目。招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人
C、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D、投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标

14、关于项目招投标的描述，不正确的是（35）。
A、招标人采用公开招标，应当发布招标公告
B、两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体共同投标
C、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金有效期应长于投标有效期
D、评标委员会名单在中标结果确定前需保密

15、依据《中华人民共和国招投标法》，不正确的是（35）。

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A、投标人少于3个的不得开标
B、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内订立书面合同
C、招标人不可以自行选择招标代理机构
D、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

16、根据2019年修订的《中华人民共和国招投标法实施条例》招标文件要求中标人要提交履约保证金的,履约保证金不得超过中标合同金额的（31）。
A、2%　　B、5%　　C、10%　　D、15%

17、关于项目招投标的描述，不正确的是：（31）。
A、国有资金占主主导地位的项目公开招标
B、需要采用新技术的项目可以不进行招标
C、招标人授意投标人撤换、修改投标文件属于串通投标
D、中标候选人应当不超过3个，并表明顺序

18、关于项目招投标的描述，正确的是（31）。
A、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7天
B、投资保证金不得超过招标项目估算价的1%
C、一个招标项目只能有一个标底
D、中标候选人应当不超过2个并标明排序

19、对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，其中不属于第一阶段招标活动的是（31）。
①投标人提交不带报价的技术建议②招标人提供招标文件③招标人编制招标文件④投标人提交保证金
A、①②　　B、①④　　C、②③　　D、②④

20、招标人采用资格后审办法对招标人进行资格审查的，应当在开标后由（31）按照招标文件规定它的标准和方法对招标人的资格进行审查。
A、评标委员会　　B、资格审查委员会　　C、认证认可发会　　D、招标组的委员会

21、关于中标候选人的描述，不正确的是（30）。
A、中标候选人不超过3个，并标明顺序
B、排名第一的中标候选人放弃中标需重新招标
C、中标候选人公示期不得少于3日
D、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

22、招标过程中，招标人自收到异议之日起（31）日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

标活动。

A、3　　B、5　　C、7　　D、9

23、关于投标的描述，正确的是（58）。

A、投标文件应当对招标文件做出实质性响应

B、投标人应当在开标前将投标文件送达投标地点

C、投标人不得将中标项目的部分工作进行分包

D、一个投标人必须是一个法人

24、2017年11月第29题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（29）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、30　　B、20　　C、15　　D、10

25、2018年5月第29题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于招投标的描述，不正确的是(29)。

A、招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书

B、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件接受人

C、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人

D、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的人员不得少于成员总数的一半

26、2018年11月第15题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

政府采购的主要方式是（15）。

A、公开招标　　B、邀请招标　　C、竞争性谈判　　D、单一来源采购

27、2019年5月第29题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

依法进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件止，最短不得少于（29）天。

A、20　　B、30　　C、15　　D、60

28、2020年11月第54题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于招投标的描述，正确的是（54）。

A、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

B、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于10日

C、在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，招标人可以以书面形式对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改

D、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件的中标人的招标文件订立书面合同

29、2021年5月第19题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

某市政府计划采购一批服务，但是采用公开招标方式的费用占该采购项目总价值的比例过大，该市政府可依法采用（19）方式采购。

A、邀请招标　　B、单一来源　　C、竞争性谈判　　D、询价

30、2021年11月第5题

2021年9月1日起施行的《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第745号）规定，运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对关键信息基础设施（5）网络安全检测和风险评估。

A、每两年至少进行一次　　B、每年至少进行一次

C、每半年至少进行一次　　D、每季度至少进行一次

31、2021年11月第22题（此题为常规重点考题，建议背一反三）

关于项目招投标的描述，不正确的是（22）。

A、任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

B、招标项目，共收到两个投标人的标书，则该招标人需要重新招标

C、标书以邮寄方式递交的，以“邮戳为准”

D、投标价格低于成本不符合中标人条件

32、2022年5月第13题

某公司法人王某花费3000余元从网上购买个人信息计3646条，并将购得的信息分发给员工用以推销业务。当地警方依据（13）规定，对王某予以罚款10万元。

A、著作权法　　B、计算机软件保护条例　　C、网络安全法　　D、民法通则

33、2022年5月第16题

（16）依照《中华人民共和国数据安全法》和有关法律、行政法规的规定，负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。

A、工信部　　B、公安部　　C、国资委　　D、网信

34、2022年5月第18题

依据《政府采购法》，政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过（18）日。

A、60　　B、45　　C、30　　D、15

35、2022 年 5 月第 23 题

招标投标是一种国际惯例，是一种（23）行为。

A、资金流转　　B、项目任务分解　　C、客户关系维护　　D、商品交易

36、2022 年 11 月第 10 题

《中华人民共和国网络安全法》规定，网络运营者应当按照网络安全等级保护制度要求，履行下列安全保护义务（10）。

①制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任。

②采取防范计算机病毒和网络攻击，网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。

③采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月。

④采取数据分类，重要数据备份和加密等措施。

⑤制定、公布网络关键设备和网络安全专用产品目录，并推动安全认证和安全检测结果互认，避免重复认证、检测。

A、1234　　B、1235　　C、1345　　D、2345

37、2022 年 11 月第 15 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在政府采购工作中，不符合政府采购法相关规定的是（15）。

A、采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的情况，可以采用邀请招标方式采购

B、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的情况，可以采用竞争性谈判方式采购

C、采购人、采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年

D、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十五的，可以采用单一来源方式采购

38、2022 年 11 月第 19 题（此题为常规重点考题，建议举一反三）

在依法必须进行招标的项目中。公开招标与投标工作的描述不正确的是（19）。

A、开标前，招标机构需向评标专家介绍即将参与的评标项目内容及招标人和投标人的情况

B、评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的相关专家、招标人与招标机构代表等 5 人以上单位组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于总人数 2/3

C、评标委员会名单在评标结果公示前必须保密

D、投递投标书最好是直接送达或委托代理人送达，以便获得招标机构已收到投标书的回

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

执

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

第三十一章 案例分析真题解析（非计算题、以读为主）

1、本考试自 2005 年开考，截止到现在已经很久很久了，目前官方教材已经是第 4 版了，考虑到教材改版、内容过时、篇幅太多等因素，2016 年以前的案例真题，建议不看了。

2、2017 年 5 月及以后的真题，我尽力补充下第 4 版的答案，如果您发现本文档给的答案与第 4 版教材内容不一致，请按第 4 版学。比如“质量保证”都是现在的“管理质量”；“人力资源管理”都是现在“资源管理”。

3、这些历年真题，不建议大家做，大家以读为主。2 个目的：（1）曾经怎么考过？（2）或多或少的能记住一些关键字，到时候看在考试的时候，能不能或多或少的用几条。

2017 年 5 月试题及答案解析

试题二

本题按第 4 版官方教材来说，都可以学，但是第 4 问需要按最新的教材学。

【说明】

某系统集成公司 A 中标某信息中心 IT 运维平台开发项目，公司 A 任命小李为项目经理。小李在项目启动阶段确定了项目团队和项目组织架构，项目团队分为三个小组：研发组、测试组和产品组。各组成员分别来自研发部、测试部以及产品管理部。

小李制定了项目整体进度计划，将项目分为需求分析、设计、编码、试运行和验收五个阶段。为保证项目质量，小李请有着多年的编码、测试工作经历的测试组组长张工兼任项目的质量保证人员。

在项目启动会上，小李对张工进行了口头授权，并要求张工在项目的重要阶段（如完成需求分析、完成总体设计、完成单元编码和测试等）必须对项目交付物进行质量检查。在检查时，张工可以根据自己的经验提出要求，对于不满足要求的工作，必须立即进行返工。

项目在实施过程中，遇到一些问题，具体如下：

在项目组完成编码与单元测试工作，准备进行系统集成前，张工按照项目经理小李的要求进行了质量检查。在检查过程中，张工凭借多年开发经验，认为某位开发人员负责的一个模块代码存在响应时间长的问题，并对其开具了不符合项报告。但这位开发人员认为自己是严格按照公司编码规范编写的，响应时间长不是自己的问题。经过争吵，张工未能说服该开发人员，同时考虑到该模块对整体项目影响不大，张工没有再追究此事，该代码也没有修改。

在项目上线前，信息中心领导组织技术专家到项目现场进行调研和考察。专家组对已完成的编码进行了审查，发现很多模块不能满足甲方的质量要求。

【问题 1】（10 分）

请指出该项目在质量管理方面可能存在哪些问题？

【问题 2】（8 分）

请指出张工在质量检查中可能存在的问题。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 3】（6 分）

针对上述问题，如果你是项目经理，你会采取哪些措施？

【问题 4】（5 分）

在（1）~（5）中填写恰当内容（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内）。

在质量控制中，可以使用的工具和技术有（1）、（2）、（3）、（4）、（5）。

候选答案：

A、趋势分析 B、试验设计 C、因果图 D、统计抽样 E、帕累托图 F、质量成本 G、成本/效益分析 H、控制图

试题三

本题按第 4 版官方教材来说，问题 1、问题 2、问题 3 可以看看，问题 4 不看，问题 2 需要按最新的学。

【说明】

项目经理小李负责了一个新的项目，该项目的内容是为某市开发一套智慧城市公共综合信息服务平台。项目启动阶段，甲方仔细查看了小李提交的项目实施方案，提出由于该项目的投资方构成复杂，项目需求不清晰，希望项目组能想办法解决这个问题。

小李向公司申请了几名经验丰富的系统分析师，加强需求分析阶段的工作。经过较为充分的需求调研，形成了初步的需求说明书。小李认为需求分析工作较为详细，按照公司常用的软件开发生命周期模型，选择了瀑布模型进行开发。

在编写概要设计和详细设计说明书的过程中，客户方提供了几处需求的修改要求。由于其工作量不大，小李直接安排系统分析师按客户的要求进行了修改。在编码阶段后期，由于客户的投资方发生了变化，新的投资方采用了新的运营模式，导致需求发生较大变化，由于前期甲方已经强调过项目需求特点和要求，小李只能接受客户新的变更要求。在执行变更的过程中，项目组发现新的需求将导致系统架构的更改，经过评估该变更将使项目延期。

【问题 1】（5 分）

请分析该项目在整个过程中存在哪些主要问题？

【问题 2】（7 分）

请说明项目范围（需求）变更控制流程。

【问题 3】（6 分）

请将下面（1）~（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

每项记录在册的变更请求都必须由（1）批准或否决。

变更结束后，形成新的项目基线并纳入到配置库的（2）库中，这时配置管理员应向项目组成员提交一份（3）报告。

（4）、（5）、（6）构成了项目的范围基准。

【问题 4】（3 分）

小李选择瀑布模型作为生命周期模型是否合适？如合适，请说明理由；如不合适，请说明理由，并给出合适的生命周期模型。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2017 年 11 月试题及答案解析

试题一

本题按第 4 版官方教材来说，需要学，但是问题 2、问题 3 需要按最新的学。

【说明】

A 公司承接了一个为某政府客户开发 ERP 软件的项目，任命小张担任项目经理。由于该客户与 A 公司每年有上千万元的项目合作，A 公司管理层对客户非常重视，并一再嘱咐小张要保证项目的客户满意度。为此，小张从各部门抽调了经验丰富的工程师组建了项目团队。

在项目初期，小张制定了变更和配置管理规则：客户需求发生变化时，应首先由工程师对需求变化造成的影响做评估，如果影响不大，工程师可以直接进行修改并更新版本，不需要上报项目经理；当工程师不能判断需求变化对项目的影响时，应上报给项目经理，由项目经理作出评估，并安排相关人员进行修改。

在项目实施过程中，用户针对软件的功能模块提出一些修改需求，工程师针对需求做了评估，发现修改工作量不大，对项目进度没有影响，因此，出于对客户满意度的考虑，工程师直接接受了客户的要求，对软件进行修改。在软件测试联调阶段，测试人员发现部分功能模块与原先设计不符，造成很多接口问题。经调查发现，主要原因是客户针对这些功能模块提出过修改要求，项目经理要求查验，没有发现相关变更文件。

【问题 1】（10 分）

请分析该项目实施过程中存在哪些主要问题。

【问题 2】（10 分）

结合案例，请描述项目变更管理的主要工作程序。

【问题 3】（6 分）

请将下面（1）~（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

根据变更的迫切性，变更可分为（1）和（2），通过不同流程处理。

变更管理过程涉及到角色主要包括项目经理、（3）、（4）、（5）、（6）。

试题三（23 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学，但是问题 2 需要按最新的学。

【说明】

甲公司中标一个城市轨道交通监控系统开发项目，公司领导决定启用新的技术骨干作为项目经理，任命研发部软件开发骨干小王为该项目的项目经理。

小王技术能力强，自己承担了该项目核心模块开发任务，自从项目管理计划发布以后，一直投身于自己的研发任务当中。除了项目阶段验收会之外，没有召开过任何项目例会，只是在项目出现问题时才召开项目临时会议。经过项目团队共同努力，该项目进展到系统测试阶段。

在系统测试前，发现该项目有一个指示灯显示模块开发进度严重滞后，小王立刻会同该模块负责人小李一起熬夜加班赶工，完成了该模块。

小王在项目绩效考核时，认为小李的工作态度不认真，给予较差评价并在项目团队内公布

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

考核结果。小李认为自己连续熬夜加班，任务也已完成，觉得考核结果不公平，两人就此问题发生了严重冲突，小李因此消极怠工，甚至影响到了项目验收。

【问题 1】（11 分）

（1）基于以上案例，请指出小王在项目团队管理和沟通管理过程中的不恰当之处。

（2）针对小李在项目中的问题，请说明小王该如何预防和改进。

【问题 2】（4 分）

结合案例，说明项目经理小王应当重点学习哪些项目团队管理的方法？

【问题 3】（2 分）

结合案例中小王和小李的冲突，请指出他们之间的冲突属于____（从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内）。

A.项目优先级冲突　　B.资源冲突　　C.个人冲突　　D.技术冲突

【问题 4】（6 分）

请简要描述项目冲突管理的方法。

2018 年 5 月试题及答案解析

试题一（27 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学，但是问题 3 可以不学。

【说明】

A 公司承接了某银行大型信息系统建设项目，任命张伟担任项目经理。该项目于 2017 年年初启动，预计 2018 年年底结束。

项目启动初期，张伟任命项目成员李明担任项目的质量管理员，专职负责质量管理，考虑到李明是团队中最资深的工程师，有丰富的实践经验，张伟给予李明充分授权，让他全权负责项目的质量管理。

得到授权后，李明制定了质量管理计划，内容包括每月进行质量抽查、每月进行质量指标分析、每半年进行一次内部审核等工作。

2017 年 7 月份，在向客户进行半年度工作汇报时，客户表示对项目的不满，一是项目进度比预期滞后;二是项目的阶段交付物不能满足合同中的质量要求。

由于质量管理工作由李明全权负责，张伟并不清楚究竟发生了什么问题，因此，他找李明进行了沟通，得到两点反馈:

1、在每月进行质量检查时，李明总能发现些不符合项。每次都口头通知了当事人，但当事人并没有当回事，同样的错误不断重复出现：

2、李明认为质量管理工作太得罪人，自己不想继续负责这项工作。

接着，张伟与项目组其他成员也进行了沟通，也得到两点反馈:

1、李明月度检查工作的颗粒度不一致。针对他熟悉的领域，会检查得很仔细：针对不熟悉的领域，则一带而过:

2、项目组成员普遍认为:在项目重要里程碑节点进行检查即可，没必要每月进行检查。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 1】(6 分)

结合案例，请分析该项目质量管理过程中有哪些做得好的地方?

【问题 2】(10 分)

结合案例，请分析该项目质量管理过程中存在哪些问题?

【问题 3】(6 分)

请简述 ISO 9000 质量管理的原则。

【问题 4】(5 分)

请将下面(1)~(5)处的答案填写在答题纸的对应栏内。

国家标准(GB/T 19000 2008)对质量的定义为:一组(1)满足要求的程度。

质量管理是指确定(2)、目标和职责，并通过质量体系中的质量管理过程来使其实现所有管理职能的全部活动。

在质量管理的技术和工具中，(3)用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支:(4)用于识别造成大多数问题的少数重要原因：(5)可以显示两个变量之间是否有关系，一条斜线上的数据点距离越近，两个变量之间的相关性越密切。

试题三（21 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学，但是问题 2 需要按最新的学。

【说明】

A 公司是一家为快消行业提供 APP 开发解决方案的软件企业。项目经理范工承接了一个开发鲜花配送 APP 的项目，项目需求非常明确， 此前 A 公司承接过一个类似的项目，做得很成功，项目结束后人员已经分派到其他项目组。经过认真考虑反复论证后范工决定采用虚拟团队方式搭建项目组，项目架构师由一位脚踝骨折正在家修养的资深工程师担任，开发团队依据项目模块的技术特点分别选择了西安和南京的两个有经验的项目小组，测试交给了美国旧金山分部的印度籍测试员 Lisa，其他成员均在北京总部的公司内部选拔。项目经理范工编制了人力资源管理计划并下发给每个成员以便他们了解自己的工作任务和进度安排。

项目刚进入设计阶段，开发团队在 APP 的测试部署方式和时间上与 Lisa 发生了争执，南京开发团队没有跟项目经理范工沟通就直接将问题汇报给了当地的执行总经理王总。王总批评了范工，范工虽然觉得非常委屈，但还是立即召集了包括架构师在内的相关人员召开紧急电话会议。会上多方言辞激烈，终于确定了一套开发团队和测试团队都觉得可行的部署方案。

【问题 1】(6 分)

结合案例，请从项目团队管理的角度说明本项目采用虚拟团队形式的利与弊。

【问题 2】(5 分)

请简述项目人力资源管理计划的内容和主要的输入输出。

【问题 3】(2 分)

请将下面(1)~(2)处的答案填写在答题纸的对应栏内。

结合案例，A 公司范工带领的项目团队已经度过了项目团队建设的(1)阶段，正在经历震荡阶段的考验，即将步入(2)阶段。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 4】(8 分)

请简述项目冲突的特点和解决的方法。结合案例，你认为项目经理范工采用了哪种方法?

2018 年 11 月试题及答案解析

试题一

本题按第 4 版官方教材来说，需要学，但是问题 4 需要按最新的学。

【说明】

2018 年 1 月，某系统集成公司中标本市某地铁线路的列车乘客信息系统项目，内容包括地铁公司运营中心节目播放控制软件、地铁列车节目接收软件以及服务器、播放终端等硬件设施的搭建工作。

公司任命小陈为项目经理，并从各部门抽调了经验丰富的工程师组成了项目团队。小陈依据过去多年从事会议场所多媒体播控系统的经验，自己编写了项目范围说明书，并依此创建了 WBS 和 WBS 词典，形成项目范围基准。在项目实施过程中，由于与供应解码设备的厂商发生合同纠纷，项目组不得不重新寻找新的合作厂商，并针对新的解码设备，重新开发接口软件，致使项目工期拖延。客户针对播放控制软件，要求增加断点续传的功能，开发人员认为工作量不大就自行增加了该功能。项目测试时，小陈发现与之前做的项目不同，地铁运行时数据是通过车地无线网络传输，带宽有限，网络丢包现象严重，导致视频节目播放时，经常卡顿，马赛克现象严重，究其原因发现是 WBS 中解决该问题的软件模块没有开发。验收时，客户对项目执行情况很不满意，小陈觉得客户吹毛求疵与客户发生了争执，导致客户向公司高层投诉。

【问题 1】（10 分）

结合案例，请分析该项目在范围管理方面存在哪些问题？

【问题 2】（6 分）

结合案例，请分析该项目在范围管理之外，还存在哪些问题？

【问题 3】（5 分）

分解是一种将项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的技术，请指出要将整个项目分解为工作包，需要开展哪些主要活动？

【问题 4】（4 分）

从候选答案中选择四个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内（所选答案多于四个该题得 0 分）。

规划范围管理过程的输入是（）。

A、需求管理计划　　B、项目章程　　C、项目范围说明书　　D、经验教训知识库

E、项目管理计划　　F、工作绩效数据　　G、人事管理制度

试题三

本题按第 4 版官方教材来说，这个题目不需要学，或者非常简单的看一下就好。

【说明】

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

A 公司准备研发一款手机无线充电器，项目启动时间为 2018 年 1 月，项目整体交付时间为 2018 年 6 月，按照资源配置和专业分工，公司将项目初步拆为 7 个子项目，其中，项目 A-C 负责产品主体研发和生产。项目 E 和 F 关注产品规格和外观设计，项目 D 负责技术攻关，项目 G 关注功能性附件。

2018 年 2 月，核心芯片采购遇到困难，为了不影响整体进度，又单独成立了 H 组负责研究可替代芯片的选型和采购。

同时，公司专门成立了副总经理牵头的协调小组负责管理 8 个启动时间不一，关键节点不一却又内部互有关联的项目。

【问题 1】（9 分）

（1）请简述项目管理、项目集管理和项目组合管理的概念

（2）结合案例，分析该项目适合用哪种方式进行管理，并简述理由

【问题 2】（6 分）

结合案例，从变更、计划、监控三个属性上阐述项目组 A 的项目经理与协同小组职责的差异

【问题 3】（3 分）

请将下面（1）-（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内（从候选答案中选择 1 个正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内）

项目组合治理管理包括：制定项目组合管理计划、（1）、（2）、（3）和执行项目组合监督 5 个子过程

A、定义项目组合　B、分配项目组合资源　C、优化项目组合

D、批准项目组合　E、制定项目组合预算

【问题 4】（5 分）

请判断以下描述是否正确

（1）项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发起组织而言具有非常重要的战略意义（）

（2）项目集目标可以是短期的，也可以是长期的，可以是定性的，也可以是定量可管理的（）

（3）为了获得有效资源，组织应该为每一个项目集提前分配固定的资源池（）

（4）可以根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程（）

（5）项目集管理过程中，增加了绩效域这一新概念，重点关注项目集的战略、构建和治理等方面（）

2019 年 5 月试题及答案解析

试题一

本题按第 4 版官方教材来说，问题 1、问题 2 可以看看，但是问题 1 也需要按最新的学。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【说明】

A 公司中标某金融机构甲方位于北京的数据中心运行维护项目，并签署了运维合同。合同明确了运维对象包括服务器、存储及网络等设备，并约定：核心系统备件四小时到场，非核心系统备件 24 小时到场，80%以上备件需满足上述时效承诺，否则视为违约。

A 公司任命小张担任该项目的项目经理，为了确保满足服务承诺，小张在北京建立了备件库，招聘了专职备件管理员及库房管理员,考虑到备件成本较高，无法将服务器、存储和网络设备的所有备件都进行储备，备件管理员选择了一些价格较低的备件列入《备件采购清单》并经小张批准后交给了采购部。随后，采购部通过网站搜索发现 B 公司能够提供项目所需全部备件且价格较低，于是确定 B 公司作为备件供应商并签署了备件采购合同。

项目实施三个月后，甲方向公司投诉，一是部分核心系统备件未能按时到场，二是部分备件加电异常，虽然补发了备件，但是影响了系统正常运行。

针对备件未能按时到场的问题，小张通过现场工程师了解到：一是部分核心系统备件没有储备；二是部分备件在库存信息中显示有库存，但调取时却找不到。为此需要临时从 B 公司采购，延误了备件到场时间。

针对备件加电异常的问题，小张召集采购部、库房管理员、B 公司召开沟通会议，库房管理员认为 B 公司提供的备件质量存在严重问题,但无法提供相应证据。B 公司则认为,供货没有问题，是库房环境问题导致备件异常，因为 B 公司人员送备件到库房时曾多次发现库房温度、湿度超标。采购部人员观点与库房管理员一致，原因是采购部通过查询政府采购网等多家网站发现，B 公司去年存在多项失信行为记录，大家各执词，会议无法达成共识。

【问题 1】5 分

请说明采购管理的主要步骤。

【问题 2】12 分

结合案例，请指出，该项目采购管理中存在的问题。

【问题 3】3 分

请简述采购货物入库的三个条件。

【问题 4】7 分

请将下面(1)~(7)处的答案填写在答题纸的对应栏内。供应商选择的三大主要因素是供应商的(1)、(2)、和(3)。

经进货验证确定为不合格的产品，应采取的处理包括退货、(4)和(5)。

采购需求通常包括标的物的配置、性能、数量、服务等，其中(6)和(7)最为关键。

试题三

本题按第 4 版官方教材来说，需要学。

【说明】

2018 年 7 月某信息系统公司中标当地司法部门语音转写项目，任命小陈为项目经理。小陈组建了项目组，制定了项目范围说明书，并获得了客户确认。为了激励成员，小陈向公司申请了项目奖金。项目进行过程中，小陈发现人员紧张，请来在读研究生小张协助软件研发工作，并对其进行了培训。项目组成员如下:

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

序号	姓名	职责	备注
1	小陈	项目经理	技术能力强，具有多年研发经验
2	小胡	软件架构设计	多年软件研发工作经验，责任心强，做工积极热情，希望承担更多工作
3	小万	软件工程师	多年软件研发工作经验，单身，需要更多认同感
4	小张	软件工程师	在读研究生，勤工俭学
5	小李	算法工程师	业内专家，收入高，喜欢享受生活
6	小王	界面美工设计	刚毕业大学生，希望从项目中学到知识，并在公司立足

软件开发完成后，小陈找到公司办公室职员小侯帮助进行软件测试。小侯普通话不标准，测试发现语音识别率不高，小李认为原因是程序架构不合理，小胡则认为是算法存在问题，双方争论不休。小陈认为这是正常的工作状态，未作干预。项目组成员间气氛日趋紧张，士气低落。

【问题 1】(6 分)

请结合项目范围管理和人力资源管理知识,总结项目经理在该项目中做的恰当和不恰当的地方。

【问题 2】(10 分)

如果你是项目经理,请分析表中的其他项目成员处于马斯洛需求层次理论的哪一层，并给出相应的激励措施。

【问题 3】(5 分)

请简述团队成员发生冲突后有哪些冲突解决办法。

【问题 4】 (4 分)

在人力资源管理工具中，属于 X 理论的有( )。

A.人们天生反对改革

B.在适当的条件下，人们愿意主动承担责任

C.工作动机就是为了获得经济报酬

D.人生来就是以自我为中心

E.人们能够自我确定目标，自我指挥，自我控制

F.注重满足员工的生理需求和安全需求

G.大多数人具有一定想象力和创造力

2019 年 11 月试题及答案解析

试题一（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，问题 1、问题 3 需要学。问题 2 不需要学。

【说明】

2019 年 3 月，某公司中标当地轨道交通的车载广播系统项目，主要为地铁列车提供车载广

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

播、报警、对讲及电子地图系统。公司任命具有丰富经验的老王担任项目经理。老王从部门抽调人员成立了项目组，安排质量部的老杨负责质量工作。

根据甲方提出的技术要求，结合公司质量管理手册、程序文件和作业文件，老杨编制了《项目质量计划书》、《项目验收规范》等质量文件，组织人员对《项目质量计划书》等文件进行了评审，并对项目组成员进行了质量管理培训。项目实际过程中，按照《项目质量计划书》，老杨组织相关人员定期对项目进行检查并跟踪改进情况。

系统调试过程中，测试人员发现某电路板会导致系统运行出现严重的错误，立刻向项目经理进行汇报。老王找到负责该电路设计的人员，要求其对系统出现的 BUG 进行原因分析，找到问题根源，若需要修改设计，对电路的缺陷设计进行更正，填写设计更改单，并进行评审。

经过分析并评审通过后，相关人员实施更改并升级了电路图版本。经验证，系统运行正常。工程样机生产出来后，根据项目技术条件，对产品进行型式试验和例行试验。在产品进行电磁兼容性试验时，某指标不符合要求，项目人员分析原因后进行了整改，重新试验并顺利通过。

验收前，老杨对照《项目验收规范》对系统功能及性能进行确认，并由质量部门开具了合格证。系统最终上线，经过 1 个月的试运行，客户反馈以下问题。

序号	故障时间	位置	客户反馈问题	故障定位
1	2019.6.13	1 客室	接通司机室没声音	报警器
2	2019.6.16	3 客室	接通客室没声音	报警器
3	2019.6.18	6 客室	呼不通	报警器
4	2019.6.20	5 客室	黑屏	电子地图
5	2019.6.24	5 客室	呼叫灯不亮	报警器
6	2019.6.25	司机室	监听声音小	监听扬声器
7	2019.6.25	2 客室	接通客室没声音	报警器
8	2019.6.27	司机室	监听声音小	监听扬声器
9	2019.6.28	4 客室	接通司机室没声音	报警器
10	2019.7.2	司机室	对讲机无声音	对讲装置
11	2019.7.4	司机室	监听声音小	监听扬声器
12	2019.7.4	2 客室	接通司机室没声音	报警器
13	2019.7.6	1 客室	广播声音小	广播主机
14	2019.7.10	2 客室	黑屏	电子地图
15	2019.7.13	6 客室	呼不通	报警器

项目组针对试运行出现的问题进行了更改。

【问题 1】（8 分）

将案例中实际应用的质量管理措施分类填入答题纸对应表格。

【问题 2】（6 分）

（1）请简述帕累托分析原理

（2）根据试运行期间用户反馈的问题记录，请应用帕累托原理分析造成系统故障的主要原因，并指出解决系统故障的优先级。

【问题 3】（11 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）写出一致性成本和非一致性成本的定义

（2）请分析案例中发生的成本哪些属于一致性成本，哪些属于非一致性成本。

试题三（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学。问题 4 按最新的教材学。

【说明】

A 公司中标某系统集成项目，正式任命王伟担任项目经理。王伟是资深的技术专家，在公司各部门具有较高的声望。

接到任命后，王伟组建了项目团队。除服务器工程师小张是新招募的外，其余项目组成员都是各个团队的老员工，项目中王伟经常身先士卒，亲自参与解决复杂问题，深受团队成员好评。

项目中期，服务器厂商供货比计划延迟了一周。为了保证项目进度，王伟与其他项目经理协商，借调了两名资深人员。随后召开项目会议，动员大家加班赶工。会议上王伟向大家承诺会向公司申请额外项目奖金。大家均同意加班，只有小张以家中有事，朋友聚会等理由拒绝加班。由于小张负责服务器基础平台，他的工作进度会影响整体进度，所以大家纷纷指责小张没有团队意识。

王伟认为好的项目团队中绝对不能出现冲突现象，这次冲突与小张的个人素养有直接关系，为了避免冲突对团队产生不良影响，王伟宣布立即终止会议并请小张留下来单独谈话。

在沟通中，王伟批评小张缺乏团队合作意识。小张表示他对加班费、项目奖金等不在意，而且他技术经验丰富，很容易找到份收入不错的工作。他不加班的原因是最近家人、朋友等各种圈子应酬太多。王伟表明如果因为小张的原因导致项目工期延误，会影响小张在团队中的个人声誉，同时更会影响整个项目团队在客户和公司内部的声誉，小张虽不情愿，但最终选择了加班。

【问题 1】（8 分）

管理者的权力来源有 5 种，请指出这 5 种权力在王伟身上的具体表现，请将（1）-（4）处的答案及具体表现填写在答题纸的对应表格中。

【问题 2】（6 分）

结合马斯洛需求理论，指出案例中小张已经满足的需求层次，并指出其具体表现。如果要想有效激励小张，应该在哪些层次上采取措施。

【问题 3】（8 分）

（1）结合本案例，请指出王伟针对冲突的认识和做法有哪些不妥？

（2）解决冲突的方式有哪些？王伟最终采用了哪种冲突解决方式？

【问题 4】（3 分）

请结合案例中项目团队的人员构成，请指出该项目采用了哪些组建团队的方法。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2020 年 11 月试题及答案解析

试题一（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学。问题 2 按最新的教材学。

【说明】

某集成公司和某地区的燃气公司签订了系统升级合同，将原有的终端抄表系统升级改造，实现远程自动抄表且提供 APP 终端应用服务。

公司指定系统的项目经理张工来负责该项目，目前张工已经升任新产品研发部经理，张工调派了原项目团队的核心骨干刘工和李工分别负责新项目的需求调研和开发工作。

刘工和李工带领团队根据以往经验完成了需求调研和范围说明书。但由于该项目甲方负责人负责多个项目，时间紧张，导致需求评审会无法召开。张工考虑到双方已经有合作基础，李工和刘工对原系统非常熟悉，为了不影响进度，张工让项目组采用敏捷开发模式，直接进入了设计和编码阶段。

在客户验收测试时，甲方负责人提出 APP 的 UI 设计不符合公司风格、不兼容新燃气表的数据接口、数据传输加密算法不符合要求等多项问题，要求必须全部实现这些需求后才能验收。此时张工把公司新产品研发部正在研发的新产品给甲方负责人展示，双方口头约定可以采用新产品部分功能实现未完善的需求。经过增加人员和加班赶工，延期 1 个月完成。项目上线后用户又发现了若干问题。

【问题 1】（8 分）

结合案例，请从项目范围管理的角度指出该项目实施过程中存在的问题。

【问题 2】（6 分）

请写出范围说明书的内容和作用。

【问题 3】（6 分）

结合案例，请阐述张工在需求变更过程中需要完成的具体工作内容。

【问题 4】（5 分）

请将下面①~⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内。

在每个项目任务的分解单元中都存在可交付成果和①，标志着某个可交付成果或阶段的正式完成。

创建②是将项目的可交付成果和项目工作分解为较小的、更易管理的组件的过程，其主要作用是对所要交付的内容提供一个结构化的视图。其最底层的可交付成果或项目工作组成部分称为③。

项目干系人提出变更申请后，一般由④或⑤进行初审。

试题三（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，问题 1、问题 4 需要学。问题 2、问题 3 可以算了。

【说明】

A 公司是提供 SaaS 平台服务业务的公司，小张作为研发流程优化经理，他抽查了核心产品

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

的配置管理和测试过程，情况如下：项目组共 10 人，产品经理小马兼任项目经理和配置管理员，还有 7 名开发工程师和 2 名测试工程师，采用敏捷开发的方法，2 周为一个迭代周期，目前刚刚完成一个 3.01 版本的上线。

小张要求看一下配置管理库，小马回复：“我正忙着，让测试工程师王工给你看吧，我们 10 个人都有管理员权限”。小张看到配置库分为了开发库和产品库，产品库包括上线的 3 个大版本的完整代码和文档资料，而且与实际运行版本有偏差。小版本只能在开发库中找到代码，但没有相关文档，而且因为新需求迭代太快，有些很细微的修改，开发人员随手进行了修改，文档和代码存在一些偏差。

小张策划对产品做一次3.01版本的系统测试，以便更好的解决研发流程和系统本身的问题。

【问题 1】（5 分）

结合本案例，从配置管理的角度指出项目实施过程存在的问题。

【问题 2】（10 分）

结合本案例，请帮助测试工程师从测试目的、测试对象、测试过程、测试用例设计依据、测试技术 6 个方面设计核心产品 3.01 版本的系统测试方案。

【问题 3】（6 分）

如果系统测试中需要采用黑盒测试、白盒测试和灰盒测试，请阐述三种测试的含义和用途。

【问题 4】（4 分）

从候选答案中选择正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内。

配置项的状态通常可分为三种，配置项初建时其状态为（1）。配置项通过评审后，其状态变为（2）。此后若更改配置项，则其状态变为（3）。当配置项修改完毕并重新通过评审时，其状态又变为（4）。

A、送审稿　B、草稿　C、报批稿　D、征求意见　E、修改　F、正式

2021 年 5 月试题及答案解析

试题一（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学。问题 3 需要按最新的内容学。

【说明】

2020 年某公司承接某地方法院的智慧法院信息系统项目，实现法院庭审流程信息化，项目要求引入智能语音技术，将庭审现场人员的语音实时转换成文字，既可在屏幕上输出显示，又可实时编辑，提高庭审记录的效率。

公司没有智慧法院的相关项目经验，选择刚毕业两年的小王担任项目经理，由于项目时间较紧，小王主要围绕工作分解、人员分工、项目进度和预算，独自制定了项目管理计划，考虑到公司从未有过智能语音识别方面的相关开发经验，小王特意从某高校请来人工智能实验室的李教授，为项目组人员培训智能语音相关理论知识和常用算法，经过培训，对语音识别技术有了初步的了解，但还不具备自我研发能力，因此项目组决定将该功能外包。

项目实施过程中，甲方希望能在软件中增加一简单功能，小王认为增加功能并不复杂，直

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

接让软件开发人员进行了修改，由于项目本身时间周期较短，又受疫情影响，时间更加紧迫，为了不耽误进度，小王要求项目组采取997 工作模式，项目中后期，有核心人员提出离职。

项目收尾时，小王发现交付的软件存在部分功能与设计文档不一致。

【问题1】（10分）

结合案例，从风险识别的角度，指出该项目存在的问题。

【问题2】（6分）

对于语音识别模块，假设项目组根据过去经验得到如下表信息:(单位:万元);

序号	方式	成功率	花费成本	成功获益	失败赔偿
1	自研	60%	80	100	50
2	外包	90%	45	100	60

请应用决策树分析技术，分别计算自研和外包的期望货币价值，并判断项目组选择外包方式是否正确。

【问题3】（5分）

请描述项目整体管理包括哪几个过程?分别属于哪个项目管理过程组?（将答案补充填写在答题纸的对应表格内）

【问题4】（4分）

请将下面（1)~(2）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

风险按()性可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险，为了预防原材料价格波动，提前储备了一批原材料，结果原材料价格出现了下跌。该风险属于（）。

试题三（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学。

【说明】

某省交通运输厅信息中心对省内高速公路部分路段的监控系统进行升级改造，该项目是省重点项目,涉及5 个系统集成商、1 个软件供应商、3 个运维服务厂商以及10 个路段管理单位。项目工期仅为两个月，沟通管理的好坏决定了项目的成败。

小张作为项目经理，在项目建设全过程中建立了项目领导小组的周例会制度，制定了详细的沟通计划，并根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人，形成了干系人登记册，根据沟通需求不同，设置不同的沟通方式，细化了相应的沟通管理策略（见下表），并完善了沟通管理计划。项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送，使项目如期完工并得到省交通运输厅的好评。

项目阶段	沟通管理策略
需求分析与设计	通过集成商、软件商与路桥管理单位面对面的沟通，尽快获取了系统建设的详细需求和设备的具体选型，项目需求和设备方案赢得了路桥管理单位的签字认可
集成	集成商、软件商、路桥管理单位、省厅信息中心等需要密切配合，每一个变更都需要得到路桥管理单位确认，并通知省厅信息中心
测试	系统集成商、软件供应商、设备维护服务商都需要参与，路桥管理单

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

	位、省厅信息中心进行验收测试

【问题1】(8 分)

（1）结合案例，请计算该项目的沟通渠道总数。

（2）请指出项目经理的如下活动对应的管理过程（从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内)。

活动	所属过程
建立了项目领导小组的周例会制度	
根据项目发展阶段，识别了不同阶段的关键干系人	
项目执行中周报告采用邮件方式发布，出现的问题采用短信的方式定制发送	

A、规划沟通　B、管理沟通　C、控制沟通　D、识别干系人　E、规划干系人管理　F、管理干系人

【问题2】(6 分)

(1)结合案例中的以下干系人,请分别写出干系人影响/作用方格对应的项目阶段(将正确答案填入答题纸对应栏内)。

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

序号	干系人影响/作用方格	项目阶段
（1）		
（2）		
（3）		

①省交通运输厅信息中心　②系统集成商　③ 软件供应商　④运维服务商　⑤路段管理单位

【问题3】(6 分)

在试运行阶段，项目经理分析的干系人的参与程度见下表。此时，项目经理是否需要干预?如何干预?注:C表示当前参与程度，D 表示所需参与程度。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
省交通运输厅信息中心					CD
系统集成商				CD	
软件供应商				CD	
A运维服务厂商	C			D	
B路桥管理单			C		D

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

位					

【问题4】(5 分)

从候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸对应栏内。

工作绩效报告是(1）的输入，工作绩效数据是(2）的输入,问题日志是(3）的输入，制定干系人管理计划活动属于（4）过程，分析绩效与干系人进行沟通，提出变更请求属于（5)过程。

A、管理沟通　　B、控制沟通　　C、识别干系人　　D、管理干系人　E、规划干系人管理　　F、控制干系人参与

2021 年 11 月试题及答案解析

试题一（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，需要学。问题 3 需要按最新的教材学。

【说明】

某集团公司希望对总部现有信息系统进行升级改造，升级后的系统能收集整合子公司各类数据，实现总部对全集团人力资源、采购、销售信息的掌握、分析及预测。

小王担任项目经理，项目交付期为60天，小王研究了总部提出的需求后，认为项目核心在于各子公司数据收集以及数据可视化及分析预测功能。各子公司数据收集可以以总部现有系统中的数据格式模板为基础，为各子公司建立数据上传接口。针对数据的分析预测功能，由于牵涉到人工智能等相关算法，目前项目组还不具备相关方面的知识储备，因此项目组对该模块功能直接外包。小王将数据收集与可视化工作进行了WBS分解，WBS的部分内容如下：

工作编号	工作任务	工期	负责人
….	…..	….	…..
2	系统设计	20 天	王工
3	程序编制	30 天	任工
….	…..	….	….
3.2.1	人力资源模块编码	25 天	孙工
3.2.2	采购模块编码	20 天	赵工
3.2.3	销售模块编码	20 天	赵工
….	….	…..	…..
4	系统测试与验收	5 天	张工、李工
….	…..	…..	…..

此外，虽然总部没有推出修改界面，但小王认为旧版的软件界面不够美观，让软件研发团队重新设计并更改了软件界面。

试运行阶段，总部人员试用后，认为已经熟悉旧版的操作模式，对新版界面的布局极其不适应；各子公司数据报送人员，认为数据上报的字段内容与自己公司的业务并不相关，填写困难。总部和各子公司的试用人员大部分认为新系统不是很好用。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题1】（12分）

（1）请结合案例，简要分析该项目经理在WBS分解中存在的问题。

（2）写出WBS分解时，需要注意的事项。

【问题2】（8分）

请结合案例，除WBS分解的问题外，项目在范围管理中还存在哪些问题。

【问题3】（3分）

请描述项目范围说明书的内容

【问题4】（2分）

请将下面的（1）-（4）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

项目范围是否完成要以（1）来衡量，包括（2）、（3）、（4）

试题三（25分）

本题按第4版官方教材来说，需要学。

【说明】

某公司中标医院的信息管理系统。公司指派小王担任项目经理，并组建相应的项目团队。由于人手有限，小王让负责项目质量工作的小杨同时担当配置管理员。小杨编写并发布了质量管理计划和配置管理计划。

小杨利用配置管理软件对项目进行配置管理，为了项目管理方便，小杨给小王开放所有的配置权限，当有项目组成员提出配置变更需求时，小杨直接决定是否批准变更请求。小杨为项目创建了三个文件夹，分别作为存放开发、受控、产品文件的目录，对经过认定的文档或经过测试的代码等能够形成配置基线的文件，存放到受控库中，并对其编号。项目研发过程中，某软件人员打算对某段代码作一个简单修改，他从配置库检出待修改的代码段，修改完成并经测试没问题后，检入配置库，小杨认为代码改动不大，依然使用之前的版本号，并删除了旧的代码。公司在质量审计过程中，发现项目管理方面的诸多问题。

【问题1】（10分）

请结合案例，简要分析该项目在配置管理方面存在的问题。

【问题2】（8分）

请结合案例，描述在软件升级过程中的配置库变更控制流程。

【问题3】（5分）

请简述质量审计的目标。

【问题4】（2分）

在候选答案中选择正确选项，将该选项的编号填入答题纸内。

通常来说，质量管理人员不应具备（）的权限。

A、产品库代码的 Check 权限　　B、产品库文档的 Check 权限

C、受控库代码的 Check 权限　　D、受控库文档的 Check 权限

马在老师，购课后台91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2022年5月试题及答案解析

试题一（25分）

本题按第4版官方教材来说，需要学。问题3、问题4需要按新教材学。

【说明】

A公司承接了某地方政府的智慧社区云平台的基础设施建设项目，客户方对安全性和系统性能要求较高，为了实现自身业务由硬件设备提供向软件开发转型。A公司承诺免费提供一个智慧社区APP小程序，并将其写入项目合同中，合同期为6个月。项目经理小邱负责APP的开发，项目周期4个月，计划2019年12月上线。因合同中没有对APP给出明确的功能和性能要求，小邱首先借鉴其他项目的开发经验和成果确定了APP的主要便民服务功能，之后开发团队通过走访社区居民和在社区网发放调查问卷，搜集相关的需求。最终确定了APP的功能需求，编制了详细的功能需求说明书，并将业务目标、项目目标、范围、设计、开发、高层级需求、详细需求均纳入到需求跟踪矩阵中。

2019年7月项目组与客户共同召开了范围确认会，讨论了项目的文档交付物清单，各阶段里程碑及详细的工作进度和人员分工图表，形成会议纪要并双方签字。后期，项目组审核了范围说明书，提交了项目代码和相关设计文档。2019年12月完成功能测试。在项目验收评审会上，与会外部专家认为该项目涉及个人隐私信息，建议第三方测评机构对该APP进行全面的测试。经第三方测评机构测试，发现多项严重的个人信息安全保护问题。经分析，漏洞修复比较困难，全面整改需要投入较大的工作量，但预算已超支，经与公司领导和客户反复协商，不得不提出项目变更。

【问题1】（10分）

（1）结合案例，请分析在7月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏?请指出遗漏的内容。

（2）请阐述范围确认和质量控制的不同点，完成以下表格。

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	
检查的时间点	
执行人员	
详略程度	

【问题2】（5分）

请将下面（1）~（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

在上述案例中，收集需求阶段项目团队采用了（1）、（2）和（3）的工具和技术，在需求跟踪矩阵设计过程中缺少对（4）和（5）的策划。

【问题3】（4分）

请指出项目变更的决策机构，并简述其成员和职责。

【问题4】（6分）

请阐述项目变更应开展哪些工作?

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

试题三（25 分）

本题按第 4 版官方教材来说，问题 1、问题 2、问题 4 需要学。问题 3 不需要学。

【说明】

A公司承接某市机关事业单位养老保险信息系统，项目覆盖各市、区、县的机关事业单位在编人员的养老保险信息，实现数据集中统一管理。公司成立了项目组，并任命小王担任项目经理。项目组对项目进行调研后，成立了风险管理小组，编写了项目管理计划和风险管理计划，明确项目风险管理流程如下图所示：

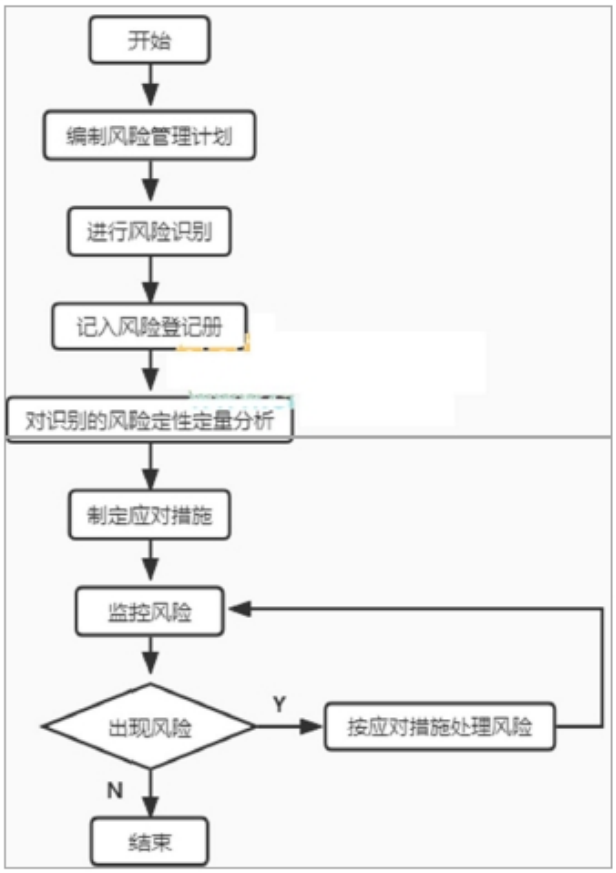

项目组对风险登记册的各风险制定了相应措施，部分措施如下所示：

风险类别	风险描述	措施
人员风险	人员情绪风险	调离项目组
技术风险	缺少数据库设计和相关技术储备	外包
技术风险	需要新的数据安全管理技术	培训
管理风险	非预期事件造成成本增加的风险	应急储备
管理风险	审批流程繁琐	加强部门沟通，建立协调配合机制

【问题 1】（4 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。

【问题 2】（10 分）

请指出案例中列出的风险措施分别采用的是哪种风险应对策略。

【问题 3】（8 分）

项目组使用的 PKI 技术采用双密钥、双证书机制，请简述双密钥证书的生成过程。

【问题 4】（3 分）

请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

SWOT 技术从项目的每个（1）、劣势、（2）和（3）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面的考虑风险。

2022 年 11 月试题及答案解析

试题一

按最新第 4 版教材：本题需要学。

【说明】

某集团为提升企业服务水平和办公效率，通过招投标选定 A 公司为其开发企业协同办公管理信息系统。A 公司组建了项目团队，任命小张担任项目经理，并将系统中的数据可视化模块外包给某一软件公司。

在制定项目管理计划过程中，小张让负责研发的小陈制定沟通管理计划，作为项目管理计划的子计划。小陈认为编制沟通管理计划是一件重复性的工作，于是参考过去的项目管理计划，简单进行了修改后放入了项目计划文件夹下作为公共信息供大家查阅，完成后的沟通管理计划表如下：

沟通内容	沟通方法	沟通时间	参与人	沟通目的
每周工作列会	谈话	每周五16:00	A公司项目组成员	汇报进度，解决遇到问题
方案评审	会议	阶段性	A公司项目组相关成员	确定方案
项目阶段性总结	电子邮件	里程碑点	A公司主管领导、项目	阶段性汇报
软件开发技能培训	在线课程	临时	A公司软件研发人员	提高软件研发技能
项目交流会	电话	项目启动、结束时	A公司项目组成员、客户外包公司	各方了解项目情况

每次参加客户召集的项目沟通会，小张会根据项目组人员空闲时间临时安排参会人员。参会人员不固定，新的参会人员对之前会议需要确认的内容毫不知情，这种情况时有发生。引起客户强烈不满，沟通不好，效率也不高。

在项目进行中，客户对数据可视化模块要求增加新功能。经变更确认后，小张电话通知外包公司增加。新功能项目验收时发现新功能并未实现。

【问题 1】（6 分）

指出小陈制定的沟通管理计划表当中已列出内容的不合理之处。

【问题 2】（11 分）

在下表中补充沟通管理过程并写出该项目在沟通管理各过程上存在的问题。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

沟通管理过程	存在问题
过程1：规划沟通	
过程2：	
过程3：控制沟通	

【问题 3】（8 分）

（1）请指出常用的沟通方法一般分为几类？

（2）案例中沟通管理计划表中所提到的沟通方法分别属于哪类沟通？

试题三

按最新第 4 版教材：本题需要学。

【说明】

A 公司为提升市场竞争力，计划针对制造业数字化转型的需求，新开发一套数字化软件，实现在工业产品生产和制造过程中数据采集，分析和决策功能。公司让产品部前期对市场需求进行调研。产品部对软件预期能产生的经济效益和社会效益，进行了详细的分析，并针对这两部分，编制了《可行性分析报告》。公司高层领导看了报告后，认为该软件未来会为公司带来巨大的收益，当场拍板决定启动项目，要求产品部补充编制《项目建议书》，并组建项目团队。

小王作为某名校计算机专业刚毕业的研究生，被公司委以重任，担任该项目的项目经理。研发负责人向小王建议为配置管理设置一名专职配置管理员，但小王认为有配置管理工具对代码进行控制，大家只要对程序代码做好版本控制就可以了，考虑到项目组人员紧张，没必要再安排专人负责配置管理工作。

开发过程中，为避免多人同时修改代码导致冲突，研发人员要先将服务器上的代码下载，待编码完成后，使用文本对比工具将代码中修改的部分进行上传整合。

软件研发完成测试通过后，研发人员将最终版本软件和软件使用说明书提供给产品部，产品部人员发现说明书描述和内容与软件不完全一致，于是将问题反馈给小王，小王经检查发现提交的说明书并不是最新的说明书。

【问题 1】（12 分）

请结合案例，分析项目在可行性研究和配置管理中存在哪些问题？

【问题 2】（7 分）

请写出项目建议书的内容。说明项目建议书的作用。

【问题 3】（6 分）

请结合案例说明，项目组在软件研发工作完成后移交给产品部之前，应完成哪些项目结项相关工作。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2023 年 5 月试题及答案解析

试题一(25 分)

【说明】

为实现空气质量的精细化治理，某市规划了智慧环保项目。该项目涉及网格化监测、应急管理、执法系统等多个子系统。作为总集成商，A 公司非常重视，委派李经理任项目经理，对公司内研发部门与项目相关的各产品线研发人员及十余家供应商进行统筹管理。李经理明确了关键时间节点，识别出项目干系人为客户和供应商后，开始了项目建设工作。

项目开始建设 5 个月后，公司高层希望了解项目情况，要求李经理进行阶段性汇报。李经理对各方面工作进展进行汇总，发现三个问题：一是原本该到位的服务器、交换机，采购部门迟迟没有采购到位,部分研发完成的功能无法部署到客户现场与客户进行演示确认;二是 S 公司作为 A 公司的供应商，承担空气质量监测核心算法工作，一直与客户方直接对接，其进度已经不受李经理掌控，且 S 公司作为核心算法国内唯一权威团队，可以确保算法工作按期交付，因此其认为不需要向李经理汇报工作进展;三是公司研发部门负责人因其他项目交付紧迫性更高，从该项目抽调走了 2 名研发人员张工、王工，项目目前研发人员的空缺需要后续补充。

李经理忧心忡忡，向公司汇报完项目进展情况后，公司政策研究院相关领导表示国家在环境执法方面的法律法规本月初已经进行了较大改版,项目相关子系统会有关联;营销副总裁听完项目汇报后表达不满：该项目作为公司的重点项目，希望作为全国性的标杆项目进行展示和推广，但当前各子系统的研发成果基本照搬了公司现有产品，没有任何创新性的体现，不利于公司后期的宣传推广，PMO 提醒李经理依据财务部门推送的数据，公司对部分供应商已经根据进度完成了第二节点款项支付，但当前 A 公司作为总集成商，与客户的第二个合同付款节点还未到，项目的成本支出和收益方面将面临较大的压力。人力资源负责人提醒李经理，项目成员张工和王工的本月绩效评价还未提交，截止日期为 2 天以后。

【问题 1】(12 分)

结合案例，请指出李经理在资源管理和沟通管理方面存在的问题

【问题 2】(5 分)

请将下面（1）--（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。本案例中，项目的组织结构是（1），李经理发现人员空缺时需要再选 2-3 名研发人员进入项目，选择标准包括：经验、（2）、（3）、（4）、（5）、成本、能力和国际因素。

【问题 3】(3 分)

结合案例，请帮助李经理补充他没有识别到的其他干系人。

【问题 4】(5 分)

请写出项目资源管理包含的过程，并描述每个过程的主要作用。

试题三(25 分)

【说明】

数字化城市管理通过信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

部件和事件信息，促进城市人流、物流、信息流、交通流的通畅与协调。

2023 年，某县为提升该县的运营效率，利用已有的海量数据，实现数字化城市管理，启动了数学化城市管理项目，项目建设期 8 年。作为政府重点项目，为扶持当地民营企业，将项目建设工作交给 A 公司牵头负责。

A 公司过去一直做银行信息管理系统，为了完成好项目，他们仔细研究了数字化城市管理的相关文档，参考了其他城市的数字化城市管理建设项目，发现城市管理的建设要牵涉到多个政府部门。调研中还发现，尽管目前县政府已经汇集了来自各部门关于城市运营的海量数据，但没有统一的数据标准，导致出现数据不规范、难以融合、利用率不高等问题。尤其是交通数据，来源于多个系统，各系统建设时间先后不一、标准不同、数据多而散乱、数据多源异构现象明显，导致海量交通数据一直未得到有效利用。因此，为了满足不同系统间的数据整合和共享需求，A 公司打算建立统一的数据元标准，指导与规范城市数字化建设。

【问题 1】(10 分)

结合案例，请分析项目存在的问题和风险。

【问题 2】(5 分)

什么是数据元？制定数据元标准，应遵循哪些过程？

【问题 3】(5 分)

请将下面（1）--（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

国家十四五规划中，数字产业化发展重点包括：云计算、大数据、（1）、（2）、（3）、（4）和（5）。

【问题 4】(5 分)

结合案例，判断下列说法的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“X”）

（1）根据模型应用目的不同，可以将数据模型划分为概念模型、实体模型和物理模型三类。（）

（2）概念模型把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构，这种信息结构不依赖于具体的计算机系统，也不对应某个 DBMS。（）

（3）物理模型的基本元素包括表、字段、视图、存储过程、触发器等。（）

（4）A 公司在项目过程中要重点关注数据的采集过程。（）

（5）数据元和元数据是一个概念的不同说法，二者可以等同。（）

2023 年 11 月考试第 1 批

由于机考，没真题流传，只有部分回忆的内容

【试题一】

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：采购、合同相关内容。

【问题 1】

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

在采购管理方面做的有哪些不足的？

【问题 2】

设立子合同需要满足什么条件？

【问题 3】

如果有外包的部分，需要满足什么条件才能分包？

【试题二】

计算题：

是非常经典的挣值管理，题目很简单给出甘特图，求关键路径、工期、延长后的关键路径长度、成本超支，没有要求画图

【试题三】

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：干系人、沟通、干系人绩效域相关内容。

【问题 1】

背景中的项目经理在干系人管理与沟通管理有什么不足?

【问题 2】

管理干系人参与、监督干系人参与的定义与作用?

【问题 3】

背景中的项目经理做了哪些工作是符合干系人管理的?

【问题 4】

促进干系人参与的步骤?

2023 年 11 月考试第 2 批

由于机考，没真题流传，只有部分回忆的内容

【试题一】

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：干系人、沟通相关。

【问题 1】

从干系人和沟通来说明上边那段话里有什么问题

【问题 2】

干系人登记册的内容

【问题 3】

五个判断题

【试题二】

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

计算题：题目给了一个双代号时标网络图

【问题 1】

这个叫什么图，总工时和关键路径是什么?

【问题 2】

需要多少人

【问题 3】

求 BAC

【问题 4】

求 CV 和 SV

【问题 5】

求当前的情况，需要采取什么措施。缩短工期的办法

【试题三】

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：合同、采购相关内容。

【问题 1】

项目交付为什么失败了

【问题 2】

问一般什么情况下选择使用工料合同，这个项目为什么选择了工料合同

【问题 3】

想要使项目顺利交付，应该怎么做?

【问题 4】

是一个多选题，三个选项哪些活动属于采购管理的哪个过程，还需进行什么采购活动完善公司采购制度。

2023 年 11 月考试第 3 批

由于机考，没真题流传，只有部分回忆的内容

【试题一】

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：采购、合同。

【问题 1】

招标采购用的方法：低价，基于质量和成本

【问题 2】

合同分类，总承包合同，分包合同

【试题二】

计算题：目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，考察的内容为：工期，最短路

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

径、挣值计算。

【试题三】

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：质量、交付绩效域。

【问题 1】

质量管理过程的问题和改进

【问题 2】

交付节奏、开发方法、默写开发方法和生命周期绩效域的目标和要点

2023 年 11 月考试第 4 批

由于机考，没真题流传，只有部分回忆的内容

【试题一】

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：干系人管理、干系人绩效域

【问题 1】

制定一个干系人参与计划

【问题 2】

出现问题原因

【问题 3】

管理干系人参与的工具和技术

【问题 4】

干系人绩效域指标

【试题二】

计算题：

【问题 1】

关键路径、工期、BAC

【问题 2】

AC、EV、PV、CV、SV,进展情况

【问题 3】

如果 10%就代表正常，是否需要纠正

【问题 4】

三点估算求完工概率计算

【试题三】

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

目前无背景文字部分，根据马军老师学员的回忆，案例分析考察的内容为：风险、整合领域。

【问题1】

风险管理存在问题

【问题2】

风险应对策略、定量风险分析的工具与技术

【问题3】

项目整合管理过程的目标是哪五个?

2024年考试第1批

【试题一】

某金融机构信息化建设项目共100多个，质量管理部门仅有5名质量工程师，为提升交付质量，质量管理部决定引入外部力量协助开展质量管理工作，组建多层级质量管理体系，并委任部门具有丰富质量管理经验的张工负责此项工作。

考虑到组织信息化项目的体量，张工通过招标方式引入第三方QA团队共20人，负责项目级QA工作，并根据项目重要程度，为每个项目配备QA人员负责项目的质量。质量管理部5名质量工程师则担任组织级QA，对项目级QA进行监督检查，期望以此来保证项目级QA工作的客观性和有效性。张工建立了标准的质量检查单，要求各项目QA根据标准的检查单制定项目级的质量保证工作计划及检查单，并按照计划和检查单执行的质量管理方式，同时要求组织级QA对项目级QA进行检查。

新的质量制度执行三个月后，项目经理纷纷向张工反馈：项目具有各方面的特殊性，项目质量检查单并不完全适用，有些检查项目在项目工作中并不涉及，而上级审计机构及客户要求的部分特定交付成果却不在检查单中，难以起到质量审计的作用。同时，组织管理层要求质量管理部出具质量工作阶段报告，张工发现当前并没有明确的度量指标能够对各项目团队质量情况进行评价，对各项目级QA的工作也无法客观评价。组织级QA向张工反馈：项目级QA工作不积极，不主动向组织级QA提交工作报告，由于项目数量较多，难以检查到项目级QA的每个工作细节,组织级QA只能根据经验随机挑选一部分认为重要的环节进行检查,检查结果并不客观。

【问题1】

结合案例，请从质量管理和沟通管理角度，指出存在的问题。

【问题2】

项目质量管理包括(1)、(2)、(3)三个主要过程。依据质量数据采集、数据分析和数据表现出具质量报告属于(4)过程的工作。

【问题3】

结合案例，请填写合适的沟通方法

（1）质量管理部向高级管理层电子邮件汇报质量工作情况属于(1)

（2）组织级QA从项目管理平台获取项目质量管理工作信息属于(2)

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（3）项目级QA与组织级QA之间的沟通方法适合采用(3)

【问题4】

为了改善当前沟通问题，张工制定了项目级QA和组织级QA的沟通计划，计划中明确了汇报步骤上报方式(电子邮件或会议)、上报频率。请补充沟通管理计划中缺少的内容。

【试题三】

某市生态环境部门为提升环境综合治理能力，持续改善空气质量，决定建设智慧环境综合治理信息化平台。该平台包含二十个子系统，包括各方面数据监测采集系统、数据传输平台、数据综合分析平台、环境执法平台和决策支持系统等。A公司作为总集成单位中标了该项目，委任拥有多年环保信息化工作经历的张经理担任项目经理，负责项目统筹管理工作。

智慧环境综合治理平台中的油烟监测子系统包含监测设备和管理软件，实现辖区内餐饮企业的油烟排放数据监测和管理。生态环境部向张经理推荐了与该部门有过合作经历的S公司作为油烟监测设备提供商，张经理调研了相关案例后，与S公司签订了设备采购合同。综合治理平台建设基本完成后投入试运行，环境执法部门提出油烟监测系统中数据误报，监测数据的精准度也未能达到执法管理要求，要求A公司予以解决。同时，根据上级环境监测机构要求，要求张经理提高系统中油烟监测的频率，并增加基于监测数据的分析和报警功能。张经理考虑后，因为工作量不大，便联系S公司修改设备监测频率，同时通知本公司软件研发团队开发新功能。不久，S公司回复其提供的监测设备不支持批量修改监测频率,只能逐个更换控制单元，工作量大且更换成本高，A公司和 S公司发生了纠纷，均不愿意承担变更引发的成本，同时，张经理发现软件研发团队对于新功能研发的工作量也远超预期，而且由于增加了新功能还引发了新的缺陷，项目面临成本超支的风险。

【问题1】

结合案例，请指出张经理在采购管理和变更管理方面存在的不足?

【问题2】

请写出执行变更管理的工作程序。

【问题3】

请写出成本控制的目标?

【问题4】

结合案例，判断下列说法的正误(填写在对应栏内，正确的填写“、”，错误的填写“”)

(1)识别潜在卖方属于实施采购过程的活动( )

(2)索赔管理属于控制采购过程的工具和技术( )

(3)规划采购管理活动的最后成果是签订的合同()

(4)在控制采购过程中，合同管理的一个重要方面就是管理各个供应商之间的沟通( )

(5)控制采购的质量，包括采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素( )

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2024 年考试第 2 批

【试题一】

某海关拟建设电子订单人工智能平台，采用光学字符识别技术（ORC），将多语种报关单、身份证件等文件转为电子文档，以提高报关效率。

项目由小张任项目经理，小张初步分析项目需求后，与发起人共同制定了项目章程，章程内容包括：项目目的、项目目标（60 天内提高报关效率）、项目描述、项目边界定义、项目退出标准，拟申请的财务资源、关键用户名单，项目审批要求，项目经理签名、发起人和批准人签名，项目章程获得批准，小张组建了项目团队。

电子订单人工智能平台的建设主要包括六个工作模块，内容和特点如下：

（1）平台硬件交付：包括人工智能服务器、网络、高拍仪等的采购、搭建、测试等，需求明确、建设方法成熟、要求训练数据到位前交付。

（2）数据采集和标注：要求数据小组一次性交付 50 万张报关单及身份证件图片及标注结果。

（3）OCR 模型调试：要求数据小组多次调试并交付模型，精度不断提高，直到实现业务部门认可的效果和性能。

（4）OCR 算法开发：创新程度高，团队没有同类项目开发经验，3 天就需要更新一次，确保开发方向正确。

（5）前端界面开发：需要展示界面风格，操作步骤多次向业务部门进行演示，尝试用各种选项澄清范围和需求，在最后完成可接受的全部功能。

（6）平台操作测试：平台边研发边上线，完成一个功能模块就需要向相关人员提供一次操作或维护培训，在最后一次培训结束后才算完成全部工作。

项目验收时，海关技术的负责人、业务部门代表首次受邀参与项目，在验收评审会中指出了诸多问题，包括平台关键功能不完整、项目计划不合理、算法精度差、识别速度慢等，表示不认可交付成果。

【问题 1】

结合项目案例，请指出项目章程的内容存在哪些缺陷。

【问题 2】

结合项目案例，请帮助小张为六个工作模块选择最适合的开发方法

A、预测型方法　　B、迭代型方法　　C、增量型方法　　D、敏捷型方法

（1）平台硬件交付（）

（2）数据采集和标注（）

（3）OCR 模型调试（）

（4）OCR 算法开发（）

（5）前端界面开发（）

（6）平台操作测试（）

【问题 3】

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

（1）结合项目案例，请指出小张应让相关干系人参与哪些项目工作，以避免验收阶段出现的问题。

（2）有效执行干系人绩效域可以实现哪些预期目标？

【问题 4】

请判断下列说法的正误：

（1）变更请求必须经过变更控制委员会（CCB）的审批（）

（2）CCB 应负责提出合理、可执行的变更方案（）

（3）CCB 由项目主要干系人共同组成，包括用户单位的决策人员（）

（4）批准的变更请求不应导致正式受控的项目管理计划被颠覆（）

（5）CCB 是项目的所有者权益代表（）

（6）CCB 是作业机构，不是决策机构（）

【试题三】

某市计划建设人工智能计算中心，作为新质生产力的重要抓手，向区域内进行智能化转型的企业提供人工智能算力。该建设项目主要进行硬件设备采购、平台软件采购，网络建设、软件开发等工作，投资额较大。

项目建设主管部门的申请报告被批准后，建设单位对技术可行性、经济可行性、运行环境可行性进行了细致的研究和分析。但是，可行性研究报告未通过主管部门审批，原因是缺少社会效益可行性分析。

建设单位修改报告后再次提交，由于项目金额较大，主管部门聘请具有相关资质的 A 设计院进一步评估项目可行性，A 设计院评估了项目可行性研究报告、项目关键建设条件和工程的协议文件。A 设计院缺少熟悉人工智能领域的技术专家，设计院总工分析了评估依据，认为可研报告内容比较丰富，项目关键建设条件和工程协议文件比较全面，在可研报告上签署了同意，并将其发布为评估报告。

项目立项后，建设单位项目经理老陈为明确项目边界，实施了如下项目范围管理过程，规定项目输出相应文档。

过程	输出文档
规划范围管理	范围管理计划、（1）
收集需求	需求文件、（2）
定义范围	项目文件（更新）、（3）
创建 WBS	项目文件（更新）、（4）
确认范围	验收的可交付成果、变更请求、项目文件（更新）、（5）
控制范围	变更请求、项目管理计划（更新）、项目文件（更新）、（6）

项目经理老陈分解项目工作，形成的完整 WBS 如图所示：

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

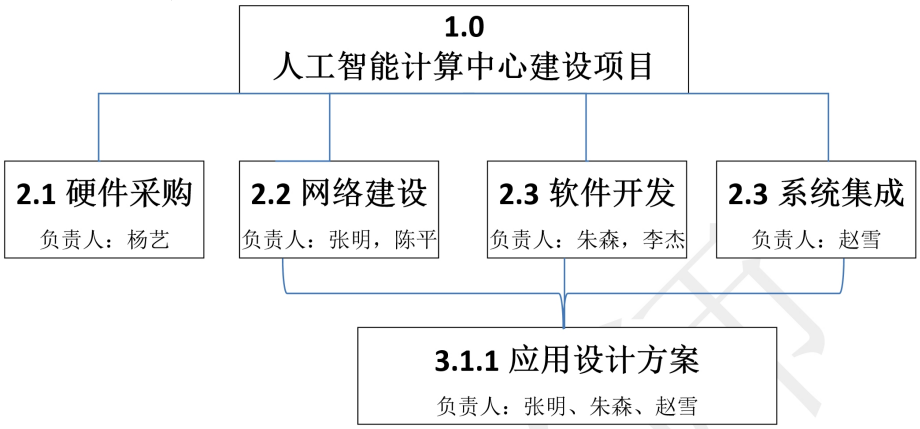

【问题 1】

结合项目案例，请指出可行性研究中，社会效益可行性分析应包括哪些方面的内容。

【问题 2】

结合案例，依据项目评估工作程序，请指出 A 设计院评估过程存在的问题。

【问题 3】

请补充项目范围管理各过程输出中缺失的文档。

【问题 4】

请指出老陈编制的 WBS 不妥之处。

2025 年考试第 1 批

【试题二】

某公司计划开发一套智能物流系统，通过 AI 进行物流路径规划、库存管理和无人配送，以提高物流效率，降低运营成本，预计开发周期为 12 个月。项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排了相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。

项目启动阶段，小王组织人员，制定项目管理计划，包括范围管理计划，成本管理计划，进度管理计划，质量管理计划，采购管理计划等。此外，为了评估激励水平，小王通过与团队成员的沟通和调研，综合考虑团队成员对项目成功的奖励期望（如额外休假等）和对项目成功的信心，分析得出团队成员对项目成功的目标绩效平均评分为 7.5 分（满分 10 分），对项目成功的整体期望值是 65%。

项目执行阶段，质量经理强调全员参与质量管理，并定期组织质量改进会议，使项目团队能够及时发现并解决潜在问题，优化工作流程。开发人员每完成一个功能模块，会先进行单元测试。全部模块完成后，再进行集成测试。通过这些测试，开发团队可以确保交付的模块满足客户的功能需求，为最终验收做好准备。开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

在项目测试阶段，测试团队发现了一些重复出现的缺陷，小王组织团队进行根本原因分析，通过分析发现，这些缺陷的根源在于需求文档的不清晰和开发团队对需求理解的不一致。针对这一问题，项目组采取了改进措施，从而有效减少了类似缺陷的出现，另外测试时小王还发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行改进。

【问题 1】（7 分）

结合案例：

（1）请根据期望理论计算团队的激励水平

（2）给出具体的提高本项目团队激励水平的措施。

【问题 2】（10 分）

结合案例，请将该项目在质量管理各过程中执行的活动进行归类，完成下表。

质量管理过程	活动
规划质量管理	活动 1:……
管理质量	活动 2:……
控制质量	活动 3:……

【问题 3】（3 分）

结合案例，请简述项目经理在管理沟通过程的如下活动中，分别采用了哪项人际关系与团队技能？

（1）项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。

（2）开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。

（3）测试时，小王发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行更改。

【问题 4】（5 分）

判断正误：

（1）沟通技术的选择应适合项目参与者，且应在合适的时候安排适当培训活动。

（2）项目资源管理是为了降低项目成本，而对项目所需的资源所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等的活动。

（3）随着项目进展项目团队成员将逐渐减少。

（4）项目资源是指完成项目所需的实物资源，包括设备、材料、设施和基础设施。

（5）提高项目团队的情商或情绪能力可提高团队效率，还可以降低团队成员离职率。

【试题三】

某科技公司承接了一个创新型供应链金融项目，旨在开发一套整合区块链技术的“端到端数字化解改方案”。项目经理开展了如下范围管理和风险管理相关活动：

活动 1：通过召开跨部门沟通会，识别出应收账款登记、核心供应商自动结算、跨境支付模块，供应商评级算法等 13 项核心需求；

活动 2：明确了项目一期必须交付的智能合约融资 MVP（最小可行产品），其中含应收账

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

款登记、核心供应商自动结算功能，其他功能放入第二期；

活动 3：项目组通过访谈讨论，列出了项目面临的智能合约安全漏洞、数据合规争议和跨境支付模块技术难度高 3 个主要风险；

活动 4：开展了风险发生概率与影响程度分析；

活动 5：通过风险登记册标注了优先级

活动 6：针对识别出的 3 个主要风险分别制定了代码审计、预留解决争议的储备金和购买跨境支付服务应对方案。

【问题 1】（10 分）

（1）请给出项目经理开展的 6 个活动分别属于范围管理和风险管理的哪个过程？

（2）针对活动 3，给出该过程可采用的数据分析方法。

【问题 2】（7 分）

活动 5 结束后，请以表格方式设计并完成该项目的风险登记册（写出风险登记册主要内容）。

【问题 3】（5 分）

（1）定义范围过程的主要输出成果是（）。

（2）该成果详细描述了哪些内容?

【问题 4】（3 分）

针对活动 6 制定的三个应对措施，依次分别属于哪种风险应对措施。

2025 年考试第 2 批

【试题一】

A 公司中标某大型医疗集团的智慧信息化建设项目，小张作为项目经理，负责该项目建设工作。在项目启动后的某次项目例会上，医疗集团领导希望 A 公司可以运用大模型 AI 等新技术，在一个月内实现运营数据的分析。

小张认为，该部分功能相比总合同而言占比不大，又考虑在一个月内可以完成上线，且该领导对项目验收有话语权。小张认为，满足该领导需求，但介于目前公司缺乏大数据领域的技术开发人员，小张建议公司外包并推荐最近比较火的 B 公司签订合同后，B 公司驻场工作两周后出现了问题：

1、B 产品稳定性差，数据丢失和获取重复的问题解决，需要依赖驻场开发工程师，工作效率低下。

2、B 公司未做过有关医疗项目，知识薄弱对需求理解不深入，未在预定时间内梳理出需求跟踪矩阵。

3、B 公司融资受阻，工资延发，驻场工作纪律差，项目经理无法推进计划离职，上线延迟风险高。

小张责令 B 公司的整改措施：

1、B 产品重新执行测试，已发现问题测试通过后再重新向客户提交。

2、B 公司的医疗专家与用户核实需求，描述完成需求跟踪矩阵。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

3、签订补充协议，针对当前问题给出赔偿方案。

【问题 1】

从范围管理与风险管理角度帮助小张给出改进措施。

【问题 2】

从风险管理角度写出，小张三个措施分别属于哪种风险应对措施?

【问题 3】

需求跟踪矩阵的作用是什么？

【问题 4】

合同争议的解决方式依次为（）、（）、（）、（）。

【试题三】

公司 A 承接了一个大型信息系统研发项目，项目涉及公司内部研发、测试、运维、市场等多个部门的协同。项目团队采用敏捷开发模式进行软件研发，项目经理小李负责该项目的全面管理。

在项目初期迭代测试过程中，发现部分功能模块的实际运行效果与设计预期偏差显著。经调查发现部分开发人员对新技术框架理解不足，在编码过程中也未遵循公司定制的详细编码规范，导致代码可读性与可维护性差。此外，在代码审查环节，审查流程没有明确的量化标准，审查人员仅凭经验简单浏览代码，且审查时间被其他紧急任务压缩，未能有效识别出潜在的代码漏洞与性能瓶颈问题。

随着项目进展，客户需求逐渐清晰，需求变更逐渐增多，但部分变更请求直接与部分项目成员口头沟通，导致需求变更信息在传递过程中出现了偏差与遗漏，项目团队成员对变更内容理解不一致，造成部分已完成的工作需要返工。在项目团队内部，由于跨部门协作流程不完善，不同部门成员之间缺乏有效的信息共享机制。有时研发部门完成的功能模块更新未能及时通知测试部门，导致测试计划延误。

在资源管理方面，项目团队中的核心技术人员大多身兼数职，不仅参与本项目，还承担着公司其他重要项目的技术支持工作。由于任务分配不合理，导致在本项目中的关键技术节点上，人力投入不足。

【问题 1】（10 分）

针对质量管理中出现的问题，详细阐述项目经理小李应采取的改进措施。

【问题 2】(6 分)

基于沟通管理中出现的问题:

（1）请帮小李确认需要沟通的对象有哪些?

（2）针对（1）给出的沟通对象，请参考表格中的示例，针对不同通对象，补充完成相应的沟通措施(重点写出沟通方式及频率两方面)。

序号	沟通对象	沟通措施
1	客户	客户建立正式的动态的需求变更沟通渠道，如专门的需求管理平台
2	客户	.....
3	.....	.....

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

【问题 3】(3 分)

项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由（1）或（2）负责分配，外部资源则通过（3）过程获得。

【问题 4】(6 分)

（1）在质量管理中，质量保证主要关注产品是否符合质量标准，而质量控制主要关注过程是否稳定。（）

（2）在资源管理中，资源日历规定了项目期间确定的团队和实物资源何时可用、可用多久。（）

（3）进度压缩技术是在同时考虑资源可用性和项目时间的情况下，对活动和活动所需资源进行的进度规划。

（4）使用人工检查代码的方法来检查代码的逻辑问题，也属于黑盒测试的范畴。（）

（5）在项目管理中，沟通计划是确保项目团队与客户之间信息传递的关键。（）

（6）在项目管理中，与客户的沟通应主要通过正式的渠道进行，非正式沟通可能会导致信息传递不准确。（）

2026 年考试第 1 批

【试题一】

某大型科技公司承接了“智慧政务云平台”二期建设项目，合同金额 1200 万元，工期 18 个月。项目经理张某负责该项目的整体管理。在项目执行中期，随着人工智能大模型技术的引入，系统架构复杂度显著增加，安全与稳定性面临严峻挑战。

项目组识别出三个主要的安全风险：

风险 1：数据泄露风险，发生概率 50%，预计造成成本损失 40 万元；

风险 2：服务中断风险（如 DDoS 攻击），发生概率 30%，预计造成成本损失 60 万元；

风险 3：核心算法被篡改风险，发生概率 20%，预计造成成本损失 20 万元。

针对上述风险，公司制定了两种应对方案：

方案 A：投入预防成本 15 万元，实施全面的安全加固，可将所有风险的影响成本降低 50%，但风险发生概率保持不变；

方案 B：不投入预防成本（0 万元），但需预留 20 万元应急储备金。项目周期内，除原有 3 项安全风险之外，还有 15%的概率会发生严重联合故障，一旦发生严重联合故障，需要额外支付 20 万元应急费用。

此外，项目团队还需建立安全度量体系，并应对 AI 系统带来的新型情景风险。

【问题 1】(7 分)

请从风险管理的角度，结合本项目背景，提出具体的风险管理方案或措施。

【问题 2】(6 分)

设计 2 个安全类度量的指标，指标定义、计算方式及用途。

【问题 3】(4 分)

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

应对 AI 系统带来的情景问题的处理办法。

【问题 4】(8 分)

请计算：

(1)不采取任何应对方案时，项目面临的 3 个安全风险的总期望成本;

(2)方案 A、方案 B 的 EMV;

(3)判断应优选哪套方案。

【试题二】

某大型科技公司承接了“智慧政务云平台”二期建设项目，合同金额 1200 万元，工期 18 个月。项目经理张某负责该项目的整体管理。在项目执行中期，随着人工智能大模型技术的引入，系统架构复杂度显著增加，安全与稳定性面临严峻挑战。

项目组识别出三个主要的安全风险：

风险 1：数据泄露风险，发生概率 50%，预计造成成本损失 40 万元；

风险 2：服务中断风险（如 DDoS 攻击），发生概率 30%，预计造成成本损失 60 万元；

风险 3：核心算法被篡改风险，发生概率 20%，预计造成成本损失 20 万元。

针对上述风险，公司制定了两种应对方案：

方案 A：投入预防成本 15 万元，实施全面的安全加固，可将所有风险的影响成本降低 50%，但风险发生概率保持不变；

方案 B：不投入预防成本（0 万元），但需预留 20 万元应急储备金。项目周期内，除原有 3 项安全风险之外，还有 15%的概率会发生严重联合故障，一旦发生严重联合故障，需要额外支付 20 万元应急费用。

此外，项目团队还需建立安全度量体系，并应对 AI 系统带来的新型情景风险。

【问题 1】(7 分)

请从风险管理的角度，结合本项目背景，提出具体的风险管理方案或措施。

【问题 2】(6 分)

设计 2 个安全类度量的指标，指标定义、计算方式及用途。

【问题 3】(4 分)

应对 AI 系统带来的情景问题的处理办法。

【问题 4】(8 分)

请计算：

(1)不采取任何应对方案时，项目面临的 3 个安全风险的总期望成本;

(2)方案 A、方案 B 的 EMV;

(3)判断应优选哪套方案。

【试题三】

【由于未获取到原始题目，本案例为马军老师根据学员反馈改编补充】

A 科技公司承接了甲方一项智能体研发项目，项目核心硬件依赖专用主控芯片采购，项目工期 6 个月，采用固定总价合同模式交付，项目由小王担任项目经理。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目启动阶段，公司研发负责人高度重视本次项目，亲自牵头对接项目核心需求，主动协调公司资源，积极与甲方沟通争取项目预付款，全程主动推进项目各项筹备工作，全力保障项目落地，对项目目标高度认可、全力支持项目开展，为项目初期推进提供了充足保障。

项目正式开始采购工作后，小王根据过往项目合作经验快速敲定合作方，最终选定供应商C为本项目芯片独家供货方。签订了固定总价采购合同，合同条款围绕芯片基础性能参数制定，重点标注了设备读写速度相关标准，合同未针对市场原材料涨价设置相关调价约定。

项目实施中期，行业原材料市场出现大范围价格波动，专用主控芯片市场售价持续走高，原有合作模式下供应商C利润空间被大幅压缩，供应商C直接拒绝供货，构成合同违约，项目面临工期滞后的风险。为保障项目连续施工、规避工期延误风险，小王优先选择了供货效率更高的供应商D承接本次芯片供货工作。受市场行情影响，本次全新采购合作的整体价格较初期采购预算上浮15%，确定合作后双方快速敲定合作细节并落地采购事宜，新合同主要沿用原有采购合同的条款。全程以内部口头汇报的方式同步采购调整情况，同步推进项目建设。

项目进度复盘与汇报工作中，小王按周、月输出项目进度及成本报表，对外同步项目整体推进情况。为保证项目整体进度数据平稳可控，上报的成本数据均参照初期预算标准编制，统一按照原定采购预算价格填报，贴合项目初期报备数据，保障项目考核数据稳定性。

供应商D的芯片到货后，项目团队第一时间开展进场验收工作。验收人员依据既定采购合同条款，逐项核对设备参数指标，确认芯片读写速度符合项目设计标准后，快速完成设备签收、入库流程。但在后续整机硬件联调、现场环境适配测试过程中，团队陆续发现新批次芯片与现有设备适配度不佳、长时间运行易出现卡顿闪退等不稳定问题，多方核查后确认是设备兼容适配、运行稳定性不达标导致，各方对验收标准及设备质量认定产生分歧，引发验收争议，对项目整体进度造成较大影响。

【问题1】（13分）

（1）采购管理的过程及每个过程的输出

（2）应对芯片价格上涨风险及更换供应商的过程中，有哪些问题处理不当？

【问题2】（8分）

干系人绩效域执行效果的检查指标包括干系人参与的连续性、（1）、（2）、（3）和干系人相关问题及风险等。

结合案例，在项目启动阶段，A 公司研发负责人在干系人参与度评估矩阵中的参与水平属于（4）型，原因是（5）。

【问题3】（4分）

（1）总价合同是按照项目范围划分的一种合同类型。（ ）

（2）原供应商违约需更换时，应先提交变更请求并获批准后，方可执行替代方案；若情况紧急，可先采取临时补救措施，但必须事后补充变更申请。（ ）

（3）干系人绩效域是为了将反对项目的干系人调整为支持项目的干系人。（ ）

（4）项目干系人参与计划不应因供应商切换等突发事件而随意修改。（ ）

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

2026 年考试第 2 批

【试题一】

A 公司为能快速进入人工智能产业，响应国家“超大规模智算集群、算电协同”的政策号召，与西部某省政府合作准备建立多个数据中心。一期先利用废弃工业厂房，快速改造出一个采用先进液冷技术、拥有 500PFLOPS 的混合智能算力的数据中心，为目标客户提供 AI 大模型训练、科研计算等业务的算力服务。项目总投资约 2 亿元，计划建设周期 8 个月，需赶在年底前投产。省政府要求当地电力公司(负责电力接入审批、电力资源控制和监管)和环保部门(负责能耗指标审批)等相关部门指派专人参与，全力支持该项目。小张被任命为该项目的项目经理，项目组核心成员由公司总部派遣。

小张制定了项目管理计划，包括采购管理计划和沟通管理计划。项目跨地域、跨专业运作，涉及人员过多。公司负责数据中心业务销售的业务团队反映：项目组与省政府沟通过于侧重工程进度，缺少对算力与目标客户业务适配性指导。

项目涉及的大量设备采购、工程实施与本地运维团队需依赖外部供应商与本地合作方。高性能 AI 服务器和基础大语言模型是本项目中投资占比过半的采购核心内容，且头部供应商交货期普遍需要 4 到 6 个月。为满足工期和财务部预算要求，项目组选定供应商后签订了固定总价合同。

【问题 1】（9 分）

（1）按照付款类型划分，除了常用的固定总价合同外，总价合同还有哪几种形式?

（2）结合案例，请分析项目采用的“固定总价合同”可能存在的风险

【问题 2】（7 分）

（1）请写出凸显模型的三个核心维度。

（2）结合案例，请给出在项目建设阶段电力公司、负责销售的业务团队在凸显模型下的三维特征，并说明原因。

【问题 3】

（1）干系人参与度水平可以分为不了解型、（）、（）、（）、（）。

（2）结合案例，针对省政府的干系人期望参与水平（），目标客户干系人期望参与水平（）。

【问题 4】（3 分）结合案例，判断对错。

（1）沟通模型的关键要素有四个：编码、媒介、噪声、 解码。（）

（2）与外部供应商沟通可以采取远程沟通工具，方便快捷。（）

（3）为了解除目标客户的顾虑可以多用推式沟通方法进行知识普及。（）

【试题二】

某商业银行计划搭建企业级大数据平台，实现与现有核心业务系统、信贷管理系统、渠道服务系统、反欺诈系统的集成，核心目标是打破信息孤岛，实现客户数据统一治理、支撑业务数据实时同步，优化信贷风险动态管控及业务决策分析。项目由该行信息技术部牵头，联合业务部门组建项目组。张工被任命为项目经理，项目工期 12 个月，预算 800 万元。

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

项目启动后，张工立刻组织技术架构师、业务分析师、测试工程师等项目组核心成员，编制了项目管理计划，估算了项目成本，明确了各阶段交付物、里程碑节点，经项目组内部确认后便开始执行。项目实施第 3 个月，核心业务系统厂商提出，现有系统接口版本过低，无法直接与大数据平台对接，需升级接口版本，预计工期增加 1 个月、费用增加 50 万元。张工收到变更申请后，因未定义此类变更，所以张工直接批准了变更，并口头通知了项目组部分成员。项目实施第 4 个月，发现项目团队缺少算法工程师，紧急从技术部门调配人员。项目实施第 5 个月，项目经理发现由于前期将主要沟通精力投入业务部门的数据需求调研，却未将银保监会的数据治理新规要求纳入规划，系统缺少监管要求的实时数据追溯功能，立刻对技术方案进行调整。

项目实施过程中，张工要求项目组成员每月汇报进度完成情况。当与计划目标出现偏差时，也只是对当期任务项进行了调整，并通过加派人手赶工方式或增加实物资源方式进行处理。因前期需求调研不充分，大数据平台与信贷管理系统集成的部分数据字段不匹配，出现数据同步延迟、缺失问题，影响了信贷审批效率，业务部门多次提出投诉。项目第 8 个月，行领导检查项目进展时，发现项目进度滞后 2 个月，预算超支 120 万元，且部分集成功能未满足需求，要求张工立即整改。

项目完成后，发现实际发生的成本超出当初规划时估算的成本一倍多，客户反馈系统太慢。

【问题 1】（6 分）

结合案例，指出项目在项目整合管理过程中存在的问题。

【问题 2】（10 分）

结合案例，分析项目在以下绩效域中存在的问题与不足。

绩效域	不足
规划绩效域	（1）
项目工作绩效域	（2）
交付绩效域	（3）

【问题 3】（5 分）

（1）整合管理中项目管理计划的核心作用

（2）制定项目管理计划需要的人际关系与团队技能

【问题 4】填空题（4 分）

（1）当员工感知到自己的绩效被重视与反馈时，会自我提升工作积极性和工作效率，这一现象被称作（ ）效应。

（2）对决策没有帮助的度量指标一般属于（ ）指标。

（3）不确定性包含风险、（ ）和（ ）。

【试题三】

A 公司承接了某城市应急管理局的智慧应急指挥平台建设项目，计划工期 20 个月。项目旨在构建于多模态大语言模型的城市级应急指挥系统，实现自然灾害、公共安全事件、公共卫生事件的 AI 智能预警、智能研判和智能调度。在项目进行过程中，项目团队采取了如下策略：

策略 1：项目经理制定了项目管理计划，包括进度管理计划，成本管理计划，质量管理计

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

划，风险管理计划等。

策略 2：项目团队实时跟踪 AI 技术趋势，关注公众对 AI 应急的认知变化，跟踪掌握中央及地方政策动向。

策略 3：项目经理与项目团队一起分析自然灾害、公共安全事件、公共卫生事件对项目的影响及相互依赖关系。

策略 4：面对数据获取困难问题，项目团队设计了轻量化数据接口原型验证技术方案，同时与大数据局进行谈判争取数据开放。

策略 5：项目初期，项目团队与高校合作开发数字孪生仿真平台，模拟数种极端灾害情景，通过蒙特卡洛量化应急系统失效导致的后果。

策略 6：在数据工程平台建设阶段，因发现历史数据投毒，增加了数据清洗和数据溯源功能，但也导致该阶段的工期延期。

策略 7：在多模态 AI 模型训练阶段，为追赶进度，技术团队采用“简化版模型”临时方案。

策略 8：项目执行过程中，项目经理实时监控 SPI/CPI 指标，并根据 SPI/CPI 指标，对项目进行调整，确保项目能顺利交付。

策略 9：项目经理定期盘点已用储备资金并测算剩余需求，建立审批机制确保储备使用与目标一致。

截至第 12 个月末，项目的执行情况如下：

活动	计划成本	工期	实际完成情况
A	300	2	按计划完成，实际支出 350 万元
B	700	3	按计划完成，实际支出 650 万元
C	2000	4	延期 1 个月完成，实际支出 2200 万元
D	3200	8	完成活动进度的 30%，实际支出 1400 万元
E	1800	2	尚未开始，提前支出 200 万元进行技术预研
F	1000	1	尚未开始

【问题 1】（9 分）

结合案例，补充以下表格

	是否促进不确定性绩效域的预期目标实现	可帮助实现哪些不确定性绩效域的绩效目标
策略 1	否	-
策略 2	（1）	（2）
策略 3	（3）	（4）
策略 4	是	积极识别、分析和应对不确定性
策略 5	（5）	（6）
策略 6	（7）	（8）
策略 7	（9）	（10）
策略 8	（11）	（12）
策略 9	（13）	（14）

【问题 2】（9 分）

91 过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com

请计算第12个月末项目的成本偏差和进度偏差（或成本绩效指数和进度绩效指数，结果保留2位小数），并判断项目绩效情况。

【问题3】填空题（7分）

项目试运行期间，为了应对网络攻击等风险，项目经理依据项目风险管理过程，执行（1）过程，将风险相关信息记录到（2）；再执行（3）过程，评估数据泄露概率和损失影响程度，将所有已识别的优先级列表和结论记录在（4）中；基于分析结果，执行（5）过程，把“确定启用管理储备进行系统重建”策略补充更新至（6）中；全程执行（7）过程，监控残余风险和新出现的风险；事件结束后，更新相关的项目文件。

----91过软考教育学院马军老师预祝大家顺利通过考试!

马军老师，购课店铺91xmgl.taobao.com

91过软考教育学院内部资料，QQ：858301448，版权所有，侵权必究 购课淘宝店铺：91xmgl.taobao.com
